



Številka: 020-11/2023-MKRR-124
Ljubljana, 11. 9. 2023
EVA /
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE <a href="mailto:Gp.gs@gov.si">Gp.gs@gov.si</a>

**ZADEVA: Informacija o izvajanju evropske kohezijske politike v programskih obdobjih 2014–2020 in 2021–2027 po ujmi avgusta 2023 – predlog za obravnavo**

**1. Predlog sklepov vlade:**

Na podlagi drugega odstavka 5. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na..... seji pod točko..... dne.....sprejela naslednji

**S K L E P:**

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o izvajanju evropske kohezijske politike v programskih obdobjih 2014–2020 in 2021–2027 po ujmi avgusta 2023.
2. Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi prerazporeditev pravic porabe v okviru prednostnih osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in nalaga Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, da predloge tehnično uskladi z Evropsko komisijo in jih do 30. 9. 2023 formalno posreduje Evropski komisiji.
3. Vlada Republike Slovenije nalaga vsem ministrstvom, vključenim v izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, da do konca septembra 2023 odpravijo zaostanek pri izplačilih upravičencem ter pospešijo pregled zahtevkov za izplačilo in zaključevanje projektov, z upoštevanjem roka upravičenosti, tj. 31. 12. 2023.
4. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, da Vladi Republike Slovenije mesečno poroča o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ter 2021–2027.
5. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, da v sodelovanju z Ministrstvom za finance najkasneje do konca leta 2023 vzpostavi učinkovit sistem za realno načrtovanje odhodkov državnega proračuna iz naslova evropske kohezijske politike 2021–2027.

Barbara Kolenko Helbl  
generalna sekretarka

**Priloga:**

- Informacija o izvajanju evropske kohezijske politike v programskih obdobjih 2014–2020 in 2021–2027 po ujmi avgusta 2023,
- Priloga MF: Načrtovanje odhodkov in izvrševanja državnega proračuna za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020

**Prejmejo:**

- Ministrstvu za gospodarski, turizem in šport,
- Ministrstvu za finance,
- Ministrstvu za infrastrukturo,
- Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo,

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministrstvu za naravne vire in prostor,</li> <li>- Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,</li> <li>- Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije,</li> <li>- Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje,</li> <li>- Ministrstvu za kulturo,</li> <li>- Ministrstvu za pravosodje,</li> <li>- Ministrstvu za digitalno preobrazbo,</li> <li>- Ministrstvu za javno upravo,</li> <li>- Ministrstvo za solidarno prihodnost,</li> <li>- Službi Vlade RS za zakonodajo.</li> </ul>
<p><b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</b></p>
/
<p><b>3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dr. Aleksander Jevšek, minister, Ministrstvo za regionalni razvoj in kohezijo,</li> <li>- mag. Mojca Aljančič, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kohezijo, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,</li> <li>- Matjaž Dragar, namestnik generalne direktorice Direktorata za kohezijo, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.</li> </ul>
<p><b>3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b></p>
/
<p><b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:</b></p>
/
<p><b>5. Kratek povzetek gradiva:</b></p>
<p>Naravna nesreča je zaradi svoje moči in razsežnosti bistveno vplivala na veliko število projektov, ki so bili sofinancirani iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. V gradivu so predstavljene posledice ujme na izvajanje operacij. Zaradi zamikov pri izvedbi je del načrtovanih sredstev na postavkah evropske kohezijske politike v letu 2023 mogoče prerazporediti v druge namene.</p> <p>Obdobje upravičenih izdatkov v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP 2014-2020) se zaključí 31. 12. 2023. Iz tega razloga je treba nemudoma nasloviti vse spremembe pri izvajanju projektov, ki jih je povzročila ujma, in se primerno odzvati. V gradivu so predstavljeni predlogi za spremembe pravic porabe OP 2014–2020, ki jih je treba izvesti, da se zagotovi 100-odstotna poraba sredstev večletnega obdobja.</p> <p>Načrtovanje porabe sredstev evropske kohezijske politike izhaja iz OP 2014-2020. Njegovo izvajanje se zaključí 31. 12. 2023.</p> <p>Po zadnjih razpoložljivih podatkih (stanje na dan 30. 8. 2023) bo zaradi poplav potrebno načrtovanje in izvedba nekaterih interventnih ukrepov na infrastrukturnih objektih v izvajanju v okvirni vrednosti 18 mio EUR (od tega 15 mio EUR EU dela in 3 mio EUR slovenske udeležbe), in sicer na naslednjih operacijah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice;</li> <li>– Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore;</li> <li>– Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo;</li> <li>– Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo.</li> </ul> <p>Interventni ukrepi na infrastrukturnih objektih v gradnji obsegajo predvsem vzpostavitev prvotnega stanja infrastrukture (stanje pred začetkom poplav) in druga nujna dela za zagotovitev osnovne pretočnosti in upravljanje vodotokov. Izvedba evidentiranih ukrepov se zagotovi z nadgradnjo obstoječih operacij, zaradi česar bo Direkcija Republike Slovenije za vode v vlogi upravičenca pripravila predlog za spremembo zadevnih odločitev o podpori in dodelitev dodatnih sredstev evropske kohezijske politike.</p> <p>Med ukrepi za naslavljanje posledic poplav je predvidena nadgradnja obstoječe operacije Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob</p>

poplavalah na državni, regionalni in lokalni ravni. Ta zajema interventni nakup sredstev in opreme, nujne za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje ter nujne zaščite ljudi in premoženja, in sicer agregatov, potopnih črpalk, razvlažilcev zraka, protipoplavnih vreč v okvirni višini 6,5 mio EUR (od tega 5,5 mio EUR EU dela in 1 mio EUR slovenske udeležbe).

**Zaradi zgoraj navedenega se pri spremembi OP 2014-2020 v okviru prednostne osi 5 za namene nadgradnje obstoječih operacij po ujmah zagotovijo pravice porabe v okvirni višini 20,5 mio EUR (skupaj 24,5 mio EUR: 20,5 mio EUR EU dela in 4 mio EUR slovenske udeležbe).**

Poplavni dogodki bodo imeli tudi pomemben vpliv na doseganje končnih ciljev in kazalnikov prednostne osi 5, še posebej kazalnika CO20 Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami. Tako bo ciljna vrednost tega kazalnika (za leto 2023) ponovno izračunana in dokončno opredeljena na podlagi končnega stanja operacij po izvedenih sanacijah.

Slovenija se po podatkih Evropske komisije na dan 4. 9. 2023 pri uspešnosti porabe razpoložljivih sredstev z doseženimi 93 % uvršča na šesto mesto v primerjavi z drugimi državami članicami EU.

Slovenija je v nasprotju s stalnimi kritikami s strani opozicije in laične javnosti pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike dejansko med najbolj uspešnimi državami članicami Evropske unije. To velja tako za pretekla programska obdobja (Phare, programsko obdobje 2007–2013) kot za iztekajoče se programsko obdobje (2014–2020).

#### **6. Presoja posledic za:**

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li> </ul>	NE

#### **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**

/

#### **I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
<b>SKUPAJ</b>				
<b>OBRAZLOŽITEV:</b>				
<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,</li> <li>- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,</li> <li>- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.</li> </ul>				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir				

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

**7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**

Gradivo nima finančnih posledic.

**8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:**

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

**9. Predstavitev sodelovanja javnosti:**

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

NE

**10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:**

NE

**11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:**

NE

**dr. Aleksander Jevšek**  
minister

## INFORMACIJA O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V PROGRAMSKIH OBDOBJIH 2014–2020 IN 2021–2027 PO UJMI AVGUSTA 2023

### 1. Učinki ujme na izvajanje projektov evropske kohezijske politike


V avgustu 2023 so širše območje Slovenije prizadele obsežne poplave in zemeljski plazovi, ki so povzročili ogromno škodo na infrastrukturnih, gospodarskih in stanovanjskih objektih. Vlada je takoj pristopila k preprečevanju težko popravljivih posledic naravne nesreče za delovanje države in sprejetju rešitev in ukrepov, ki zagotavljajo hitro pomoč gospodinjstvom in gospodarskim subjektom na prizadetih območjih ter začasne ukrepe za razbremenitev dela stroškov opreme, ki jih bodo imele sile za zaščito in reševanje zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov.

Naravna nesreča je zaradi svoje moči in razsežnosti hkrati tudi bistveno vplivala na veliko število projektov, ki so bili sofinancirani iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, saj so deroče vode ob hudih poplavah dobesedno odnesle oziroma uničile do sedaj zgrajeno infrastrukturo, opremo in stroje. Izredne vremenske razmere v Sloveniji so vplivale na dinamiko izvedbe gradbenih del, saj določenih del ni bilo mogoče izvajati, izvajanje nekaterih del pa je bistveno oteženo. Obilno deževje, katastrofalne poplave in neurja so ohromili cestni prevoz, v večjem ali manjšem obsegu poškodovali dostopne poti ter močno otežili dobavo gradbenega materiala in sredstev. Na izvedbo nekaterih projektov posredno vpliva škoda, ki so jo utrpeli podizvajalci posameznih del in storitev, katerih proizvodnja je bila uničena ali prizadeta v ujmi. Poleg tega je zaradi preusmeritve delavcev, delovnih strojev in mehanizacije na poplavna območja za urgentno reševanje ljudi in premoženja ogroženo nadaljevanje projektov ter pravočasno dokončanje del do konca leta 2023, zaradi česar bo prišlo do nedoseganja ciljev v zastavljenih rokih.

Slika 1: Kolesarska povezava Huda Luknja



Slika 2: Kolesarska povezava Celje - Žalec



Slika 3 : Kolesarska povezava Velenje - Mozirje



Slika 4 : Kolesarska povezava Dravograd - Otiški Vrh



Na zgornjih slikah so prikazani projekti kolesarske infrastrukture, ki so sofinancirani s sredstvi EKP in so bili v času poplav močno poškodovani. Pomembno področje projektov, ki so bili prav tako močno prizadeti v času poplav so projekti s področja poplavne varnosti.

Na področju ukrepov energetske sanacije, obnovljivih virov in daljinskega ogrevanja je bilo zaznanih veliko različnih neposredne in posredne vplive preteklih ujm na dinamiko izvajanja projektov. Upravičenci so že zaprosili za podajšanje obdobja upravičenosti do konca leta 2023, da bodo tako lažje izvedli predvidene ukrepe in dosegli zastavljene cilje. Na nekaterih projektih še ni možno dokončno oceniti škode, ki je bila narejena in zato še ni možno dokončno podati ocene ali so projekti izvedljivi do konca leta 2023.

Na področju kolesarskih povezav je bilo skupaj v ujmi prizadetih 19 operacij (oz. 28% od skupno 68 operacij). Skupna vrednost sofinanciranja na teh operacijah znaša 43 mio EUR (34,4 mio EUR EU in 8,6 mio EUR SLO udeležba) dolžina novih vzpostavljenih poškodovanih povezav pa 165 km (kar je slaba polovica vseh načrtovanih novih vzpostavljenih povezav skupni v dolžini 365 km), od tega:

- 3 operacije z manjšimi poškodbami (večinoma gre za poplavljenе trase z nanosi materiala, z mestoma poškodovanimi bankinami ali brežinami)
- 11 jih ima večje poškodbe,
- 5 pa je zelo močno poškodovanih (vrednost sofinanciranja 10,4 mio (EU+SLO) EUR, dolžina novih povezav – 28,8 km):
  - o Kolesarska povezava med Prevaljami in Mežico, odsek Prevalje-Poljana (DRSI),
  - o Kolesarska povezava Kamnik – Godič (Občina Kamnik),
  - o Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti (DRSI),
  - o Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje, odsek Šoštanj-Mozirje (DRSI),
  - o Izgradnja kolesarske povezave Celje-Žalec (DRSI).

Po zadnjih razpoložljivih podatkih (stanje na dan 30. 8. 2023) bo zaradi poplav potrebno načrtovanje in izvedba nekaterih interventnih ukrepov na infrastrukturnih objektih v izvajanju v okvirni vrednosti 18 mio EUR (od tega 15 mio EUR EU dela in 3 mio EUR slovenske udeležbe), in sicer na naslednjih operacijah:

- Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice;
- Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore;
- Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo;
- Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo.

Interventni ukrepi na infrastrukturnih objektih v gradnji obsegajo predvsem vzpostavitev prvotnega stanja infrastrukture (stanje pred začetkom poplav) in druga nujna dela za zagotovitev osnovne pretočnosti in upravljanje vodotokov. Izvedba evidentiranih ukrepov se zagotovi z nadgradnjo obstoječih operacij, zaradi česar bo Direkcija Republike Slovenije za vode v vlogi upravičenca pripravila predlog za spremembo zadevnih odločitev o podpori in dodelitev dodatnih sredstev evropske kohezijske politike.

Med ukrepi za naslavljanje posledic poplav je predvidena nadgradnja obstoječe operacije Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni. Ta zajema interventni nakup sredstev in opreme, nujne za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje ter nujne zaščite ljudi in premoženja, in sicer agregatov, potopnih črpalk, razvlažilcev zraka, protipoplavnih vreč v okvirni višini 6,5 mio EUR (od tega 5,5 mio EUR EU dela in 1 mio EUR slovenske udeležbe).



**Zaradi zgoraj navedenega se pri spremembi OP 2014-2020 v okviru prednostne osi 5 za namene nadgradnje obstoječih operacij po ujmah zagotovijo pravice porabe v okvirni višini 20,5 mio EUR (skupaj 24,5 mio EUR: 20,5 mio EUR EU dela in 4 mio EUR slovenske udeležbe).** Poplavni dogodki bodo imeli tudi pomemben vpliv na doseganje končnih ciljev in kazalnikov prednostne osi 5, še posebej kazalnika CO20 Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami. Tako bo ciljna vrednost tega kazalnika (za leto 2023) ponovno izračunana in dokončno opredeljena na podlagi končnega stanja operacij po izvedenih sanacijah.

Del protipoplavnih ukrepov, ki jih ne bo mogoče izvesti v okviru OP 2014-2020 zaradi poplavnih in drugih preteklih nepredvidenih dogodkov, zlasti epidemije covid-19 in vojne v Ukrajini ter drugih objektivnih težav v zvezi z umeščanjem objektov v prostor, se prenese v programsko obdobje 2021-2027. Zaradi tega bo potrebna sprememba Programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 in opredelitev protipoplavnih ukrepov, ki so nujno potrebni za obvladovanje poplavne ogroženosti v luči podnebnih sprememb. V nabor protipoplavnih ukrepov, ki se načrtujejo v obdobju 2021–2021, se uvrščata naslednji operaciji iz obdobja 2014–2020, in sicer Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujске Drave ter Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. faza.

**Posledice nedavne vodne ujme so ponovno razkrile, da Slovenija potrebuje sistemski pristop k načrtovanju in izvajanju protipoplavnih ukrepov v prihodnosti.** Zaradi zahtevnosti ukrepov bo temu področju treba nameniti več finančnih sredstev in zagotoviti ustrezno število usposobljenih kadrov. Glede na trenutne potrebe je že sedaj jasno, da sredstva evropske kohezijske politike 2021–2027 ne bodo zadoščala za ambiciozno načrtovanje izvajanja protipoplavnih ukrepov na dolgi rok. Zato predlagamo, da se pri izvajanju protipoplavnih ukrepov v obdobju 2021–2027 zagotovijo dodatna sredstva iz nacionalnih ali drugih EU virov (npr.: Sklad za vode, Podnebni sklad, S.O.S. sklad, posojila EIB, itd.).

Preglednica 1: Operacije OP 2014-2020 z navedbo stopenj tveganj za dokončanje po ujmi avgusta 2023

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
MZI	DRR DRSI Kolesarska povezava med Prevaljami in Mežico, odsek Prevalje-Poljana	213.376,00	213.375,99	Objekt je bil predan v uporabo do roka. Most preko Meže, po katerem poteka kolesarska povezava, je porušen. Dve obnovljeni brvi sta porušeni. <u>Najverjetneje je poškodovana tudi trasa kolesarske poti. Natančnejših podatkov še ni, ker območje ni dostopno. Poškodovanega je preveč, da bi lahko glede na postopke izvedli sanacijo še v letu 2023.</u>
MZI	Kolesarska povezava Kamnik-Godič	733.279,49	305.234,92	<u>Kolesarska povezava je poškodovana, škoda je ocenjena na 162.500 EUR (grobi nasip brežin, nasip poti, robniki, ograja, oprema).</u>
MZI	Kolesarska povezava Huda luknja med Velenjem in Mislinjo	3.374.933,60	3.374.933,59	Objekt je v gradnji. Do sedaj je <u>evidentiranih več večjih poškodb</u> (porušitev nasipov z voziščno konstrukcijo, poškodbe bankin in varovalnih ograj, usadi in zdrsni brežin, poškodbe EE in TK vodov). Škoda je ocenjena na 1,5 mio EUR. Operacija se zaradi pomanjkanja sredstev podaljšuje v leto 2024.
MZI	Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje, odsek Šoštanj-Mozirje	2.736.616,80	2.513.873,17	Objekt je v gradnji. Evidentirane so <u>številne večje lokalne poškodbe spodnjega in zgornjega ustroj voziščne konstrukcije, na več mestih so poškodovane bankine, na delu kolesarske poti pa je reka Paka odnesla traso ko je spremenila potek struge.</u> Škoda je ocenjena na 1 mio EUR. Dela so podaljšana v leto 2024 zaradi primanjkljaja lastnih sredstev. V neurjih je bila kolesarska trasa preveč poškodovana, da bi bila sanacija zaključena letos. Obstaja tveganje, da se zaradi nedavnih ujm in potencialnega tveganja s tem povezanega pomanjkanja sredstev dela dodatno zamaknejo.
MZI	Izgradnja kolesarske povezave Celje-Žalec	1.275.208,80	321.017,77	<u>Objekt je v gradnji. Poškodovan je visokovodni nasip reke Savinje, po kateri teče trasa kolesarske povezave, ki je v velikem delu močno poškodovana.</u> Škoda je ocenjena na 0,5 mio EUR. EU sredstva bodo porabljena, a ostala dela ne bodo dokončana do konca leta 2023. Obstaja tveganje, da se zaradi nedavnih ujm in potencialnega tveganja s tem povezanega pomanjkanja resursov dela dodatno zamaknejo.
MZI	DRR: Kolesarska povezava Celje-Laško (etapa I; Celje-Tremerje)	1.824.596,00	1.824.596,00	Operacija je bila zaključena 31. 12. 2020. Objekt je bil predan v uporabo. <u>Uničena sta zgornji in spodnji ustroj na delih kolesarske poti, porušene so varnostne ograje.</u> Sanacija je možna v letošnjem letu.
MZI	DRR: Ureditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik	980.882,79	940.533,54	Na kolesarski poti od Litije do Pogonika sta se v sklopu ujme zgodila dva dogodka, in sicer manjši <u>usad nad cesto in plaz pod cesto.</u> Zaenkrat promet poteka še nemoteno. Obe lokaciji se bosta nekaj časa opazovali, da se zadeve stabilizirajo,

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
				potem pa se bo odločalo o načinu sanacije. Tudi ocena stroškov bo znana naknadno.
MZI	DRR: Kolesarska povezava Železniki-Selca	1.029.389,62	809.463,30	<u>Novozgrajena kolesarska povezava je poškodovana na treh lokacijah.</u> Na eni lokaciji je treba urediti prepust, v dolžini 1000 m je treba urediti bankine, na eni lokaciji je treba na novo asfaltirati del poti. Večina je že bila sanirana.
MZI	DRR: Kolesarska pot Medvode-Pirniče-Vikrče	912.393,44	912.393,44	Kolesarska pot Medvode-Pirniče-Vikrče z brvjo čez reko Savo je bila v sklopu čiščenja in odpravljanja posledic podrobno pregledana. Ugotovljene so bile naslednje poškodbe: - <u>poškodovana je ograja</u> na novozgrajeni brvi; - <u>odneslo je del ceste</u> v dolžini cca 100 m, in sicer na odseku A, ki je dolg 617,0 m, kjer se je uredila talna in vertikalna prometna signalizacija za vodenje kolesarjev. Na tem odseku je predvidena souporaba vozišča z motornim prometom; - <u>števec za promet ob brvi in razsvetljava brvi zaradi poplavljenosti ne delujeta več.</u>
MZI	Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, odseka Dravograd-Otiški Vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje	1.127.772,80	1.127.772,78	Dva odseka, oba sta bila predana v uporabo. Na odseku Ravne-Kotlje ni poškodb. Na odseku Dravograd-Otiški Vrh so evidentirane <u>poškodbe ograje premostitvenega objekta ter del kolesarske poti pred in za objektom.</u> Morebitne poškodbe nosilnih elementov še ni možno oceniti. Popravilo ugotovljenega stanja je možno v 2023. Ocenjena vrednost škode znaša cca. 10.000 EUR
MZI	DRR: Regionalna kolesarska povezava Novo mesto-Straža	1.519.462,66	1.304.951,13	Na nekaj mestih so bankine udrtе in sprane ter vozišča onesnažena z muljem. Na delu, kjer kolesarska pot poteka skozi gozd, je podrtih več dreves.
MZI	DRR: Kolesarska povezava Bled-Bohinjska Bistrica	2.336.163,07	1.483.246,67	<u>Operacija je v teku, zaradi neurij je najprej potrebna sanacija okoliške infrastrukture, šele nato se bo nadaljevalo z deli (kar bi se lahko zamaknilo v pomlad 2024).</u> Poškodovane in porušene so bankine, brežine in nasutja ter spodkopan asfalt. Čaka se potrditev nadzora (22. 8. 2023), nato pa pričetek sanacije, ki bo trajala približno 14 dni, mogoče teden dlje.
MZI	Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 1: Ptuj –	4.120.422,39	3.366.886,53	Rok za zaključek operacije je 30. 9. 2023 (na OU je vloga za podaljšanje do 31. 12. 2023). V dolžini 40 metrov je <u>voda odnesla asfalt na kolesarski stezi</u> v Kidričevem.

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
	Hajdina-Kidričevo-Majšperk			
MZI	DRR: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska	4.433.137,32	3.329.774,79	<p>Operacija je v zaključni fazi izvajanja.</p> <p>Na območju občine Lenart (trasa z oznako 18, objekt v gradnji) je <u>poplavljen nasutje kolesarske steze</u> v dolžini približno 170 m v območju profilov V131-V140. Po umiku vode bo potrebna zamenjava dela nasutja. Ocena škode znaša 5.355,00 EUR, škoda je bila sanirana.</p> <p>Na območju občine Pesnica (trasa z oznako 12, objekt v gradnji) je do sedaj evidentiranih <u>več manjših poškodb, odnos tamponskega materiala voziščne konstrukcije in bankin ter manjši usadi in zdrsi brežin, zablatenje tamponskega materiala voziščne konstrukcije.</u></p> <p><u>Na vseh trasah v gradnji je potrebno čiščenje trase, marsikje bo treba zaradi zablatenja in/ali erozije (odnašanja) zamenjati del tamponskega materiala oziroma dosipavati tamponski material voziščne konstrukcije.</u></p>
MZI	DRR: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas	2.437.106,63	1.919.055,25	<p>Operacija je v zaključni fazi izvajanja.</p> <p>Na območju občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (del trase z oznako 8, objekt izgrajen) se je <u>sprožil plaz</u> v dolžini okoli 15 m. Ob sprožitvi plazu so se na tem delu skupaj s plazenjem premaknili zunanji robniki, med asfaltom kolesarske steze in robnikom je nastala odprtina, rob kolesarske steze pa se je začel ugrezati. Potrebna bo sanacija s kamnito zložbo.</p> <p><u>Na vseh trasah v gradnji je potrebno čiščenje trase, marsikje bo treba zaradi zablatenja in/ali erozije (odnašanja) zamenjati del tamponskega materiala oziroma dosipavati tamponski material voziščne konstrukcije.</u></p>
MZI	DRR: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart-Benedikt	1.085.140,21	607.164,26	<p>Operacija je v zaključni fazi izvajanja.</p> <p>Na območju občine Lenart (trasa z oznako 17, objekt v gradnji) je <u>odneslo del nasutja</u> v dolžini okoli 50 m v območju profilov P134-P137. Ocena škode znaša 900,00 EUR, škoda je sanirana.</p> <p><u>Potrebno bo čiščenje trase, marsikje bo treba zaradi zablatenja in/ali erozije (odnašanja) zamenjati del tamponskega materiala oziroma dosipavati tamponski material voziščne konstrukcije.</u></p>

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
MZI	Izgradnja kolesarske povezave Lendava-Dobrovnik-Kobilje	490.569,31	234.476,96	Gradnja je v teku, vendar so se <u>vsa dela zaradi razmočenosti terena ustavila</u> (za vsaj tri tedne). Težave so z odvodnjavanjem na območju gradnje, saj le-ta poteka med kmetijskimi površinami in je že zaradi tega nastala določena škoda. Načrtujejo, da bo gradnja kljub temu končana v roku.
MZI	Kolesarska povezava Celje-Štore-Šentjur	2.709.807,20	2.256.978,01	Operacija je v teku, dela so podaljšana v leto 2024 predvsem zaradi primanjkljaja lastnih sredstev. Zabeležene so manjše poškodbe zaradi neurij. Zaznani so večji nanosi naplavin, bankine in brežine so mestoma poškodovane. Obstaja tveganje, da se zaradi nedavnih ujm in potencialnega tveganja s tem povezanega pomanjkanja sredstev dela dodatno zamaknejo.
MZI	DRR: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart-Sveta Ana-Trate	1.048.289,60	847.055,64	Operacija je v zaključni fazi izvajanja. Na vseh trasah v gradnji je potrebno čiščenje trase, marsikje bo treba zaradi zablatenja in/ali erozije (odnašanja) zamenjati del tamponskega materiala oziroma dosipavati tamponski material voziščne konstrukcije.
MZI	Rekonstrukcija Cerknica-Bloška polica	2.516.382,00	2.143.026,00	Projekt je bil zaključen. Ob zadnji vodni ujmi so bila po pregledu objekta evidentirana mesta povečane erozije brežine nad novozgrajeno kolesarsko stezo ter delno poškodovane bankine v notranjih krivinah državne ceste. Na območjih poškodovanih brežin se predlaga izvedba biotorkreta z namenom preprečevanja nadaljnje erozije, v območju poškodovanih bankin pa izdelava asfaltnih muld. Ocenjena vrednost del znaša okoli 70.000 EUR.
MZI	Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo	3.969.983,73	3.545.596,14	Operacija je v teku, dela so podaljšana v leto 2024 predvsem zaradi primanjkljaja lastnih sredstev. Obstaja tveganje, da se zaradi nedavnih ujm in potencialnega tveganja s tem povezanega pomanjkanja sredstev dela dodatno zamaknejo.
MZI	Dravska kolesarska povezava v območju Občine Radlje ob Dravi in Občine Podvelka, odsek Vas-Brezno	1.017.287,20	1.017.287,20	Operacija je v teku, dela so podaljšana v leto 2024 predvsem zaradi primanjkljaja lastnih sredstev. Evidentirane poškodbe – zdrsi brežine. Škoda ocenjena na 400.000 EUR. Obstaja tveganje, da se zaradi nedavnih ujm in potencialnega tveganja s tem povezanega pomanjkanja sredstev dela dodatno zamaknejo.
MZI	Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste	11.544.628,85	3.342.222,82	Operacija je v teku, zaradi začetnih zapletov se je zaključek projekta zamaknil v december 2024.

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
MZI	Regionalna kolesarska povezava Trate-Lenart-Ptuj, odsek Ptuj-Destrnik, sklop B Janežovci-Drstelja	305.907,20	285.810,57	Operacija je bila predvidena za podaljšanje predvsem iz vidika zagotovitve zveznosti. Po mnenju OU zveznost ni nujna do zaključka operacije, tako da bi ta morda lahko bila zaključena do konca leta 2023.
MZI	Kolesarska povezava Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec po odsekih Šentjur-Grobelno, Šmarje-Belo-Mestinje-Podplat, Tekačevo-Podplat-Gabernik, Brezovec-Rogatec-Muzej na prostem	4.256.476,80	2.859.461,07	<u>Izvajalec je zapustil gradbišče zaradi saniranja drugih gradbišč kot posledica neurij.</u> Situacija se rešuje. Obstaja tveganje, da ne bodo porabljeni vsa EU sredstva.
MZI	Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča	40.000.000,00	31.389.753,00	Operacija je v teku. Predviden zaključek gradbenih del projekta je konec leta 2023. EU sredstva bodo porabljeni do konca leta 2023. Obstaja možnost, da se bo nadgradnja SV naprav zaključila v začetku 2024.
MDDSZ	Covid19 - Investicija DSO Ajdovščina (Kresnice)	12.000.000,00	7.828.958,37	Na zavodu neposredne škode ni bilo, so se pa dela <u>upočasnila zaradi podizvajalcev</u> , ki so morali odpravljati škodo na svojih domovih. Prizadet je bil izdelovalec stavbnega pohištva. V okviru podaljšane roka bo dela mogoče izvesti.
MDDSZ	Covid19 - Rekonstrukcija DS Lendava	4.044.363,08	2.071.203,06	Objekt v delu, ki je predmet investicije, ni bil neposredno prizadet. V poplavah avgusta 2023 je <u>škodo utrpel podizvajalec</u> , ki izdeluje notranja vrata. Posamezni zaposleni pri izvajalcu in podizvajalcih so bili angažirani pri odpravi posledic poplav, zato je bila intenzivnost na gradbišču manjša. V okviru podaljšane roka do 31. 12. 2023 bo, v kolikor ne bo nadaljnjih podobnih dogodkov, projekt zaključen.
MDDSZ	Covid19 - Preureditev nastanitev Metlika	2.312.876,83	1.606.546,02	Neposredne škode na gradbišču ni bilo, je pa škoda v poplavah 2023 <u>utrpel podizvajalec</u> , ki izdeluje notranja vrata. Že izdelana vrata so bila poplavljeni. V okviru podaljšane roka do 31. 12. 2023 bo, v kolikor ne bo nadaljnjih podobnih dogodkov, projekt zaključen.
MDDSZ	Covid19 - DU Šmarje pri Jelšah - dislocirana enota Rogatec	3.647.126,88	2.080.270,64	Neposredne škode na gradbišču ni bilo, so pa škodo v poplavah 2023 utrpeli podizvajalci (strojne inštalacije, slikopleskar, izvajalec estrihov, prezračevanje, strešna konstrukcija, notranja vrata). V okviru podaljšane roka do 31. 12. 2023 bo, v kolikor ne bo nadaljnjih podobnih dogodkov, projekt zaključen.

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
MDDSZ	Covid19 - Prizidek in rekonstrukcija KDS Črneče	5.539.487,77	2.587.450,95	Zaradi dežja je bila lesena konstrukcija objekta, ki še ni zaprt s stavbnim pohištvom, <u>namočena</u> . Dostop do gradbišča s težko mehanizacijo je otežen, tudi številni zaposleni pri izvajalcu in podizvajalcih so angažirani v okviru odprave posledic poplav bodisi doma bodisi v okviru civilne zaščite. V okviru podaljšane roka do 31. 12. 2023 bo, v kolikor ne bo nadaljnjih podobnih dogodkov, projekt zaključen.
MDDSZ	Covid19 - II.A faza Centra starejših KO-RA	3.529.451,07	2.467.854,81	Zaradi dežja je bila lesena konstrukcija objekta, ki še ni zaprt s stavbnim pohištvom, <u>namočena</u> . Dostop do gradbišča s težko mehanizacijo je otežen, tudi številni zaposleni pri izvajalcu in podizvajalcih so angažirani v okviru odprave posledic poplav bodisi doma bodisi v okviru civilne zaščite. V okviru podaljšane roka do 31. 12. 2023 bo, v kolikor ne bo nadaljnjih podobnih dogodkov, projekt zaključen.
MDDSZ	Covid 19 - Prenova DSO Rakičan	12.000.000,00	8.144.544,48	V neurju julija 2023 je nastala škoda na gradbišču, materialu in na že izvedenih delih, kar pa je izvajalec uspel odpraviti v roku 14-20 dni. V poplavah avgusta 2023 so škodo v proizvodnji utrpeli podizvajalec, ki izdeluje notranja vrata, ter izvajalec estrihov. Zaradi dviga podtalnice za okoli 1,5 m so bili <u>zaliti kletni prostori</u> , <u>poškodovana je bila hidroizolacija</u> . V okviru podaljšane roka do 31. 12. 2023 bo, v kolikor ne bo nadaljnjih podobnih dogodkov, projekt zaključen.
MDDSZ	Covid19 - Rekonstrukcija DVO Velenje	12.000.000,00	7.172.220,07	V poplavah avgusta 2023 je <u>meteorna voda zalila spodnjo etažo objekta</u> , zato je bilo potrebno izsuševanje. V okviru podaljšane roka bo izvedba del mogoča. Kreditna pogodba še vedno ni podpisana.
MDDSZ	Covid19 - Rekonstrukcija DSO Izlake	3.218.681,61	1.824.041,67	Zavod v julijskih in avgustovskih naravnih nesrečah ni utrpel neposredne škode. Je pa zaradi težav pri oddaji javnega naročila (odstop izbranih ponudnikov tik pred podpisom pogodbe, zaradi česar je bilo treba javno naročilo za izvajalca del trikrat ponoviti), zamud izvajalca pri sami izvedbi in slabše kvalitete izvedbe del na projektu prišlo do zaostankov, zaradi katerih projekta ne bo mogoče zaključiti do konca leta 2023. OU je podal pozitivno mnenje k vlogi za podaljšanje roka za doseganje kazalnika do konca julija 2024 (projekt se v letu 2024 financira iz lastnega vira) - doseganje tega roka ni ogroženo.

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
MDP	GOŠO 4 - Celje	1.822.592,00	24.479,49	Operacija je v gradnji in ne bo zaključena do roka. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči čim večje doseganje kazalnikov. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 259.488,51 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 283.968,00 EUR. <b>Visoko tveganje.</b> Operacija bo izvedena v zelo majhnem obsegu. Zaradi opisanega stanja upravičenec ne bo dosegel vseh kazalnikov po pogodbi.
MDP	GOŠO 4 - Šmarje pri Jelšah	2.391.456,00	-	Operacija je v gradnji in ne bo zaključena do roka. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči čim večje doseganje kazalnikov. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 325.728,00 EUR. Predvidena realizacija do 31.12.2023 je 325.728,00 EUR. <b>Visoko tveganje.</b> Operacija bo izvedena v zelo majhnem obsegu. Zaradi opisanega stanja upravičenec ne bo dosegel vseh kazalnikov po pogodbi.
MDP	GOŠO 4 - Laško	1.006.880,00	18.772,64	Operacija je v gradnji in ne bo zaključena do roka. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči čim večje doseganje kazalnikov. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 35.979,36 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 54.752,00 EUR. <b>Visoko tveganje.</b> Operacija bo izvedena v zelo majhnem obsegu. Zaradi opisanega stanja upravičenec ne bo dosegel vseh kazalnikov po pogodbi.
MDP	GOŠO 5 - Gornji Grad	630.528,00	392.207,60	Omrežje je bilo v celoti zgrajeno, zdaj je uničeno zaradi poplav in plazov. Ocenjen obseg poškodbe omrežja se giblje med 80 % in 100 %. <u>Zaradi sanacije po poplavi je potrebno podaljšanje operacije.</u> Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 238.320,00 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 630.527,60 EUR. <b>Visoko tveganje.</b> <b>Treba je najti sredstva za sanacijo omrežja v letu 2024.</b>



Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
MDP	GOŠO 5 - Ljubno	415.948,00	216.580,00	Omrežje je bilo v celoti zgrajeno, zdaj je uničeno zaradi poplav in plazov. Ocenjen obseg poškodbe omrežja se giblje med 80 % in 100 %. <u>Zaradi sanacije po poplavi je potrebno podaljšanje operacije.</u> Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 199.368,00 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 415.948,00 EUR. <b>Visoko tveganje.</b> <b>Treba je najti sredstva za sanacijo omrežja v letu 2024.</b>
MDP	GOŠO 5 - Luče	566.720,00	294.140,00	Omrežje je bilo v celoti zgrajeno, zdaj je uničeno zaradi poplav in plazov. Ocenjen obseg poškodbe omrežja se giblje med 80 % in 100 %. <u>Zaradi sanacije po poplavi je potrebno podaljšanje operacije.</u> Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 272.580,00 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 566.720,00 EUR. <b>Visoko tveganje.</b> <b>Treba je najti sredstva za sanacijo omrežja v letu 2024.</b>
MDP	GOŠO 5 - Mozirje	718.300,00	406.843,59	Omrežje je bilo v celoti zgrajeno, zdaj je <u>zaradi poplav in plazov poškodovano v obsegu od 10 % do 25 %.</u> Zaradi sanacije po poplavi je potrebno podaljšanje operacije. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 311.300,00 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 718.143,59 EUR. <b>Nizko tveganje.</b>
MDP	GOŠO 5 - Rečica ob Savinji	542.872,00	287.320,00	Omrežje je bilo v celoti zgrajeno, <u>zdaj je zaradi poplav in plazov poškodovano v obsegu 50 %.</u> Zaradi sanacije po poplavi je potrebno podaljšanje operacije. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 255.552,00 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 542.872,00 EUR. <b>Nizko tveganje.</b>
MDP	GOŠO 5 - Idrija	1.197.216,00	422.204,69	Omrežje je bilo v celoti zgrajeno, <u>v mesecu juliju ga je prizadel vetrolom. Omrežje bo sanirano do predvidoma konca meseca oktobra.</u> Ocenjen obseg poškodbe omrežja se giblje med 3 % in 5 %. Zaradi sanacije vetroloma je potrebno podaljšanje operacije. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 724.105,50 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 1.146.310,19 EUR.

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
				Nizko tveganje.
MDP	GOŠO 5 - Brežice	1.154.692,00	294.739,37	Omrežje so prizadele poplave zaradi razlitih voda. <u>Ocenjena poškodba omrežja se giblje med 3 % in 5 %.</u> Zaradi sanacije po poplavi je potrebno podaljšanje operacije. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 859.952,63 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 1.154.692,00 EUR. <b>Nizko tveganje.</b>
MDP	GOŠO 5 - Kamnik	708.852,00	363.659,89	Omrežje je v celoti zgrajeno (z izjemo 16 belih lis na VVO). <u>Omrežje je utrpelo poškodbe, najprej zaradi vetroloma, nato zaradi poplave in plazov. Ocenjena poškodba omrežja se giblje med 80 % in 100 %.</u> Zaradi sanacije po vetrolomu in po poplavi je potrebno podaljšanje operacije. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 345.192,11 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 708.852,00 EUR. <b>Visoko tveganje.</b> <b>Treba je najti sredstva za sanacijo omrežja v letu 2024.</b>
MDP	GOŠO 5 - Ivančna Gorica	438.880,00	227.456,34	Operacija je v gradnji, predvideva se, da bo ob odobritvi podaljšanja zaključena. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči dokončanje operacije. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 211.423,66 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 438.880,00 EUR. <b>Srednje tveganje.</b> Operacija naj bi bila izvedena.

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
MDP	GOŠO 5 - Kostanjevica na Krki	141.280,00	93.453,26	Operacija je v gradnji, predvideva se, da ob odobritvi podaljšanja zaključena. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči dokončanje operacije. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 47.826,74 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 141.280,00 EUR. <b>Srednje tveganje.</b> Operacija naj bi bila izvedena.
MDP	GOŠO 5 - Škocjan	107.840,00	60.605,96	Operacija je v gradnji, predvideva se, da bo ob odobritvi podaljšanja zaključena. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči dokončanje operacije. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 38.938,54 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 99.544,62 EUR. <b>Srednje tveganje.</b> Operacija naj bi bila izvedena.
MDP	GOŠO 5 - Brda	243.920,00	152.369,62	Operacija je v gradnji, predvideva se, da bo ob odobritvi podaljšanja zaključena. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči dokončanje operacije. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 91.550,38 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 243.920,00 EUR. <b>Srednje tveganje.</b> Operacija naj bi bila izvedena.
MDP	GOŠO 5 - Šmartno pri Litiji	749.600,00	243.349,90	Operacija je v gradnji in ne bo zaključena v roku. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči čim večje doseganje kazalnikov. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 117.641,68 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 360.991,58 EUR. <b>Visoko tveganje.</b> Operacija bo izvedena v zelo majhnem obsegu. Zaradi opisanega stanja upravičenec ne bo dosegel vseh kazalnikov po pogodbi.

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
MDP	GOŠO 5 - Kanal	412.800,00	-	Operacija je v gradnji in ne bo zaključena v roku. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči čim večje doseganje kazalnikov. Še pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 206.400,00 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 206.400,00 EUR. <b>Visoko tveganje.</b> Operacija bo izvedena v zelo majhnem obsegu. Zaradi opisanega stanja upravičenec ne bo dosegel vseh kazalnikov po pogodbi.
MDP	GOŠO 5 - Zagorje ob Savi	1.101.840,00	381.056,14	Operacija je v gradnji in ne bo zaključena v roku. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči čim večje doseganje kazalnikov. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 345.455,89 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 726.512,03 EUR. <b>Visoko tveganje.</b> Operacija bo izvedena v zelo majhnem obsegu. Zaradi opisanega stanja upravičenec ne bo dosegel vseh kazalnikov po pogodbi.
MDP	GOŠO 5 - Lukovica	302.320,00	-	<b>Visoko tveganje.</b> Operacija bo izvedena v zelo majhnem obsegu. Zaradi opisanega stanja upravičenec ne bo dosegel vseh kazalnikov po pogodbi.
MDP	GOŠO 5 - Moravče	367.040,00	66.651,99	<b>Visoko tveganje.</b> Operacija bo izvedena v zelo majhnem obsegu. Zaradi opisanega stanja upravičenec ne bo dosegel vseh kazalnikov po pogodbi.
MDP	GOŠO 5 - Ribnica	382.484,48	178.483,20	Operacija je v zaključevanju. Oddana je bila prošnja za podaljšanje obdobja porabe javnih sredstev za tri mesece. Razlogi: nadpovprečno deževje, dolgi postopki pri pridobivanju služnosti, težke razmere na trgu, ustavljena dela zaradi zadržanja izplačil ZZI. Po poplavih bo potrebna sanacija omrežja. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči dokončanje operacije. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 204.001,28 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 382.484,48 EUR. <b>Nizko tveganje.</b>

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
MDP	GOŠO 5 - Sodražica	218.112,00	57.139,20	Operacija je v zaključevanju. Oddana je bila prošnja za podaljšanje obdobja porabe javnih sredstev za tri mesece. Razlogi: nadpovprečno deževje, dolgi postopki pri pridobivanju služnosti, težke razmere na trgu, ustavljena dela zaradi zadržanja izplačil ZZI. Po poplavih bo potrebna sanacija omrežja. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči dokončanje operacije. Pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 160.972,80 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 218.112,00 EUR. <b>Nizko tveganje.</b>
MDP	GOŠO 5 - Žiri	470.530,40	122.124,79	Operacija je v zaključevanju. Oddana je bila prošnja za podaljšanje obdobja porabe javnih sredstev za tri mesece. Razlogi: nadpovprečno deževje, dolgi postopki pri pridobivanju služnosti, težke razmere na trgu, ustavljena dela zaradi zadržanja izplačil ZZI. Po poplavih bo potrebna sanacija omrežja. Predvideno je podaljšanje obdobja upravičenosti, da se omogoči dokončanje operacije. Še pričakovani zahtevki za izplačilo v letu 2023 znašajo 348.405,61 EUR. Predvidena realizacija do 31. 12. 2023 je 470.530,40 EUR. <b>Nizko tveganje.</b>
MDP	GOŠO 5 - Cerkno	705.516,48	-	Upravičenec je poslal izjavo o odstopu od pogodbe. Razlogi za neizvedbo so pomanjkanje usposobljenega specifičnega kadra za nizke gradnje in tehnična dela, porast cen energentov in cen gradbenega materiala. <b>Sklop ne bo izveden.</b>
MKRR	Razširitev PC Stara vas	979.564,39	979.564,39	Operacija je bila zaključena 31. 12. 2017. Rok za doseganje kazalnikov je bil z aneksi podaljšan do 31. 12. 2023. <u>Zaradi poplav je ogroženo doseganje kazalnikov rezultata.</u>
MKRR	NPO - DRR PC Otiški vrh	1.186.242,34	1.124.413,26	<u>Poplava je odnesla novozgrajeno infrastrukturo.</u> Finančno občina sama ne bo zmogla sanirati škode, prav tako bo rok, določen za dokončanje del, nemogoče doseči.
MKRR	Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini	116.886,80	48.656,17	Rok za zaključek operacije je 28. 10. 2023 in zaenkrat ni ogrožen. V kolikor se bodo poplavalne razmere v Mežiški dolini poslabšale in vplivale na zaključevanje

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
				operacije, bomo upravičenca pozvali k oddaji vloge za podaljšanje roka za zaključek do 31. 12. 2023.
MKRR	Urbano vrtnarjenje II	32.295,34	32.293,23	V teku je popis škode. V kolikor se bo po popisu škode ugotovilo, da so poplave kakorkoli prizadele ukrep, se bo pristopilo k iskanju rešitev.
MKRR	Učilnica v naravi v Vuzenici	14.955,12	14.443,83	<u>Poplavljeno.</u> Ogrožen rok za dokončanje.
MKRR	Mostovi	160.711,24	81.586,66	<u>Poplavljeno.</u> Ogrožen rok za dokončanje.
MKRR	Ureditev KC Litija	56.000,00		- <u>Prostor, ki so ga urejali, je bil poplavljen.</u> Nedoseganje ciljev do zastavljenega roka.
MKRR	Medgeneracijski center Beltinci	193.353,60		- <u>Poplavljeno.</u> Nedoseganje ciljev do zastavljenega roka.
MOPE	Celovita energetska prenova objektov OŠ in ŠD Mozirje	502.284,90		- Oteženo delo zaradi ujm.
MOPE	Kovine Gorišek d.o.o.	22.400,00		- <u>Poplava, nedokončan novi električni vod</u>
MOPE	Energetska prenova objekta Družbeni dom Prevalje	243.071,60	9.349,59	<u>Zaradi poplav, neurja je bilo onemogočeno delo na objektu.</u>
MOPE	Sončna elektrarna Petrol Green 1	444.848,17		Oteženo delo zaradi ujm.
MOPE	JR JOB 2021 - ES Ruše	1.251.933,63		- Oteženo delo zaradi ujm.
MOPE	Tourne mobil d.o.o.	72.708,00		- Oteženo delo zaradi ujm.
MOPE	JR JOB 2021 - Energetske sanacije objektov MO Kranj – 2. faza - Mestna občina Kranj	1.109.548,10		- Tveganje za nedokončanje operacije v roku zaradi posrednega vpliva ujme.
MOPE	Celovita energetska prenova objektov Mestne občine Slovenj Gradec	1.337.891,78		- Oteženo delo zaradi ujm.
MVZI	Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za	25.788.921,24	15.311.340,59	Deževje, poplave in neurja so onemogočili izvedbo določenih gradbenih del, otežena je dobava gradbenega materiala in sredstev.

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
	biologijo (BTS-NIB)			Z upravičencem smo v tesnih stikih glede priprave predloga za podaljšanje izvajanja operacije do konca leta 2023.
MNVP	Zagotavljanje ustrezne opreme ob poplavah	20.000.000,00	5.100.000,85	Dodatne aktivnosti zaradi vpliva poplav.
MNVP	zaDravo	4.947.862,39	3.771.759,01	Zaključevanje aktivnosti. Vpliv poplav.
MNVP	Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore	17.975.449,40	12.651.080,75	Zamude zaradi vpliva poplav na tem območju.
MNVP	Protipoplavna ureditev Gradaščice	42.046.482,60	16.944.806,95	Zamude zaradi vpliva poplav na tem območju.
MNVP	Poplavna varnost Drave - Ptujška Drava	11.402.118,40	3.342.619,44	Zamude zaradi vpliva poplav na tem območju.
MNVP	Poplavna varnost Drave - Meža z Mislinjo	17.838.052,00	13.847.526,56	Zamude zaradi vpliva poplav na tem območju.
MNVP	Poplavna ogroženost Drave - Dravinja s Polskavo	7.144.898,40	5.041.996,79	Zamude zaradi vpliva poplav na tem območju. Zaradi obilnega deževja je bil pretok Polskave povišan, kar je povzročilo obsežnejše poškodbe na že izvedenih gradbenih delih.
MNVP	Pomurje C - DRR	4.808.198,19	2.253.087,56	Gradnja v izvajanju. Zamude zaradi vpliva poplav na tem območju.
MNVP	Pomurje B - DRR	21.879.699,61	7.828.702,56	Gradnja v izvajanju. Zamude zaradi vpliva poplav na tem območju.
MNVP	Pivka.Kras.Presiha	2.372.416,21	896.188,34	Izvajanje aktivnosti. Vpliv poplav na tem območju se kaže v zamikih pri izvajanju.
MNVP	Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 1.sklop - DRR	2.577.547,93	1.341.857,86	Gradnja v zaključevanju. Vpliv posledic poplav na območju.
MNVP	Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - 2.sklop - DRR	2.967.621,87 €	2.686.691,82 €	Gradnja v zaključevanju. Vpliv poplav na območju Hrastnice.
MNVP	Odvajanje in čiščenje Prevalje - DRR	3.097.708,32 €	3.231.267,84 €	Gradnja v zaključevanju. Zelo velik vpliv poplav, škoda na kanalih in ČN.
MNVP	Odvajanje in čiščenje odpadne vode - Občina Trzič - DRR	2.463.609,17 €	1.722.810,32 €	Gradnja v izvajanju. Zamude zaradi vpliva poplav na tem območju.
MNVP	Odvajanje in čiščenje Občina Zreče - DRR	1.312.712,77 €	36.953,55 €	Gradnja v izvajanju. Vpliv poplav na tem območju.

Posredniški organ	eMA naziv operacije	Finančni načrt - Podpora Unije - (EU del) (eur)	Izplačila iz DP - EU del (eur) (Realizacija)	Opis tveganja za nedokončanje
MNVP	Odvajanje in čiščenje Občina Črna na Koroškem - DRR	1.582.249,21 €	1.582.249,19 €	Gradnja zaključena. Zelo velik vpliv poplav, škoda na kanalih in ČN.
MNVP	Odvajanje in čiščenje Mozirje - DRR	1.816.068,34 €	767.857,19 €	Gradnja zaključena. Zelo velik vpliv poplav.
MNVP	Natura Mura	3.635.920,96 €	2.725.485,70 €	Izvajanje aktivnosti. Vpliv poplav na tem območju se kaže v zamikih pri izvajanju.
MNVP	Mala barja - Marja	1.566.589,05 €	1.333.561,06 €	Vpliv poplav se kaže v zamiku izvedbe aktivnosti.



2. Pravice porabe iz naslova evropske kohezijske politike v višini 49.869.465,06 EUR, ki jih je v veljavnem proračunu Republike Slovenije 2023 možno prerazporediti

Preglednica 2: Pravice porabe iz naslova evropske kohezijske politike v letu 2023 (v EUR)

RESOR	PP - UKREP	REGIJA	VIR	OSTANKI	Pogodbeno vezana	Prosta sredstva
A	B	C	D	E	F	G=E-F
MVI	231159 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU	V	EU	126.150,40		126.150,40
MVI	231161 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU	Z	EU	21.049,60		21.049,60
MVI	231163 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba	V	SLO	31.537,60		31.537,60
MVI	231165 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba	Z	SLO	5.262,40		5.262,40
MVI	231474 - PN10.3-Večja uporaba IKT pri poučevanju in učenju-14-20-V-EU	V	EU	141.100,53		141.100,53
MVI	231475 - PN10.3-Večja uporaba IKT pri poučevanju in učenju-14-20-V-slovenska udeležba	V	SLO	35.275,50		35.275,50
MVI	231476 - PN10.3-Večja uporaba IKT pri poučevanju in učenju-14-20-Z-EU	Z	EU	137.100,56		137.100,56
MVI	231477 - PN10.3-Večja uporaba IKT pri poučevanju in učenju-14-20-Z-slovenska udeležba	Z	SLO	34.275,55		34.275,55
MVI	231497 - PN4.1-Energetska sanacija-EU	SLO	EU	4.325.209,75		4.325.209,75
MVI	231499 - PN4.1-Energetska sanacija-slovenska udeležba	SLO	SLO	763.272,39		263.272,39
MF	TP			122.800,00		122.800,00
MJU	PP 160283 - Učinkovito upravljanje zaposlenih	Z	EU	176.000,00		176.000,00
MJU	PP 160285 - Učinkovito upravljanje zaposlenih	Z	SLO	44.000,00		44.000,00
MJU	PP 160156 - Enotna poslovna točka (EPT)	V	EU	51.480,00		51.480,00
MJU	PP 160157 - Enotna poslovna točka (EPT)	V	SLO	17.160,00		17.160,00
MJU	PP 160158 - Enotna poslovna točka (EPT)	Z	EU	42.952,00		42.952,00
MJU	PP 160159 - Enotna poslovna točka (EPT)	Z	SLO	18.408,00		18.408,00
MJU	PP 160282 - Povezljivost, odprtost in kakovost (POK)	V	EU	33.792,00		33.792,00
MJU	PP 160284 - Povezljivost, odprtost in kakovost (POK)	V	SLO	8.448,00		8.448,00
MJU	PP 160283 - Povezljivost, odprtost in kakovost (POK)	Z	EU	30.208,00		30.208,00
MJU	PP 160285 - Povezljivost, odprtost in kakovost (POK)	Z	SLO	7.552,00		7.552,00
MJU	PP 160164 - TP ESS	V	EU	39.480,00		39.480,00
MJU	PP 160165 - TP ESS	V	SLO	9.870,00		9.870,00
MJU	PP 160166 - TP ESS	Z	EU	16.520,00		16.520,00
MJU	PP 160167 - TP ESS	Z	SLO	4.130,00		4.130,00
MP	Učinkovito pravosodje - MP	V	EU	46.800,00		46.800,00
MP	Učinkovito pravosodje - MP	Z	EU	73.200,00		73.200,00
MP	Učinkovito pravosodje - MP	V	SLO	11.700,00		11.700,00
MP	Učinkovito pravosodje - MP	Z	SLO	18.300,00		18.300,00
MP	Učinkovito pravosodje - Sistemski ukrepi - VRHOVNO SODIŠČE	V	EU	15.600,00		15.600,00
MP	Učinkovito pravosodje - Sistemski ukrepi - VRHOVNO SODIŠČE	Z	EU	24.400,00		24.400,00

RESOR	PP - UKREP	REGIJA	VIR	OSTANKI	Pogodbeno vezana	Prosta sredstva
MP	Učinkovito pravosodje - Sistemski ukrepi - VRHOVNO SODIŠČE	V	SLO	3.900,00		3.900,00
MP	Učinkovito pravosodje - Sistemski ukrepi - VRHOVNO SODIŠČE	Z	SLO	6.100,00		6.100,00
MP	Učinkovito pravosodje - Razvoj kompetenc - VRHOVNO SODIŠČE	V	EU	17.200,00		17.200,00
MP	Učinkovito pravosodje - Razvoj kompetenc - VRHOVNO SODIŠČE	Z	EU	22.800,00		22.800,00
MP	Učinkovito pravosodje - Razvoj kompetenc - VRHOVNO SODIŠČE	V	SLO	4.300,00		4.300,00
MP	Učinkovito pravosodje - Razvoj kompetenc - VRHOVNO SODIŠČE	Z	SLO	5.700,00		5.700,00
MZI	Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo	Z	EU	427.373,41		427.373,41
MZI	Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo	Z	SLO	95.935,85		95.935,85
MZI	Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem	V	EU	0,00		0,00
MZI	Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem	V	SLO	0,00		0,00
MZI	Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti	V	EU	559.500,01		559.500,01
MZI	Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti	V	SLO	139.874,99		139.874,99
MZI	Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti	V	EU	300.999,99		300.999,99
MZI	Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti	V	SLO	75.250,01		75.250,01
MZI	Obvoznica Kidričevo	V	EU	527.355,33		527.355,33
MZI	Obvoznica Kidričevo	V	SLO	131.838,80		131.838,80
MVZI	Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 - PP 231160	V	EU	46.944,80		46.944,80
MVZI	Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 - PP 231164	V	SLO	11.736,20		11.736,20
MVZI	Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 - PP 231162	Z	EU	182.150,85		182.150,85
MVZI	Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 - PP 231166	Z	SLO	45.537,71		45.537,71
MVZI	Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 - PP 231160	V	EU	170.061,60		170.061,60
MVZI	Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 - PP 231164	V	SLO	42.515,40		42.515,40
MVZI	Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 - PP 231162	Z	EU	527.757,60		527.757,60
MVZI	Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 - PP 231166	Z	SLO	131.939,40		131.939,40
MVZI	Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov - PP 231160	V	EU	8.464,18		8.464,18

RESOR	PP - UKREP	REGIJA	VIR	OSTANKI	Pogodbeno vezana	Prosta sredstva
MVZI	Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov - PP 231164	V	SLO	2.116,04		2.116,04
MVZI	Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov - PP 231162	Z	EU	8.460,14		8.460,14
MVZI	Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov - PP 231166	Z	SLO	2.115,04		2.115,04
MVZI	SRIP - PP 231486	V	EU	231.696,06		231.696,06
MVZI	SRIP - PP 231490	V	SLO	57.923,77		57.923,77
MVZI	SRIP - PP 231488	Z	EU	206.127,04		206.127,04
MVZI	SRIP - PP 231482	Z	SLO	51.531,48		51.531,48
MVZI	Nakup raziskovalne opreme NIB - PP 231481	V	EU	48.000,00		48.000,00
MVZI	Nakup raziskovalne opreme NIB - PP 231483	V	SLO	12.000,00		12.000,00
MVZI	Nakup raziskovalne opreme NIB - PP 231482	Z	EU	112.000,00		112.000,00
MVZI	Nakup raziskovalne opreme NIB - PP 231484	Z	SLO	28.000,00		28.000,00
MVZI	Biotehnološko stičišče NIB- 1.faza (sredstva so pogodbeno vezana, v primeru prerazporeditve je treba skleniti Aneks k pogodbi) - PP 160233	V	EU	744.000,00	744.000,00	0,00
MVZI	Biotehnološko stičišče NIB- 1.faza (sredstva so pogodbeno vezana, v primeru prerazporeditve je treba skleniti Aneks k pogodbi) - PP 160235	V	SLO	186.000,00	186.000,00	0,00
MVZI	Biotehnološko stičišče NIB- 1.faza (sredstva so pogodbeno vezana, v primeru prerazporeditve je treba skleniti Aneks k pogodbi) - PP 160234	Z	EU	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00
MVZI	Biotehnološko stičišče NIB- 1.faza (sredstva so pogodbeno vezana, v primeru prerazporeditve je treba skleniti Aneks k pogodbi) - PP 160236	Z	SLO	434.000,00	434.000,00	0,00
MZ	COVID19 - ranljive skupine			70.000,00		70.000,00
MZ	Zdravstvena pismenost (ZaPis)			174.475,88		174.475,88
MZ	MODEL DOLGOTRAJNE OSKRBE V SKUPNOSTI			441.716,00		441.716,00
MZ	CZBO Šentvid pri Stični			2.122.980,00		2.122.980,00
MZ	COVID19 - NIJZ Logistični center			3.308.046,00		3.308.046,00
MZ	E-oskrba na domu			62.937,08		62.937,08
MZ	COVID19 - JR - Razvoj novih organizacijskih oblik obravnave			60.000,00		60.000,00
MGTŠ	React EU - Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP - NRP 2130-21-1407	SLO	EU	170.000,00		170.000,00
MGTŠ	Javni razpis Krepitev blagovnih znamk (showroomi)	V	EU	197.499,00		197.499,00
MGTŠ	Javni razpis Pilotni/demonstracijski projekti - II. Sklop - 2130-19-9007	V	EU	240.000,00		240.000,00
MGTŠ	Javni razpis Pilotni/demonstracijski projekti - II. Sklop - 2130-19-9007	V	SLO	60.000,00		60.000,00
MGTŠ	Javni razpis Pilotni/demonstracijski projekti - II. Sklop - 2130-19-9012	V	EU	120.000,00		120.000,00
MGTŠ	Javni razpis Pilotni/demonstracijski projekti - II. Sklop - 2130-19-9012	V	SLO	30.000,00		30.000,00
MGTŠ	Evidenčni projekt	V	EU	74.864,47		74.864,47
MGTŠ	Evidenčni projekt	V	SLO	66.832,01		66.832,01
MGTŠ	Evidenčni projekt	Z	EU	140.055,65		140.055,65
MGTŠ	Evidenčni projekt	Z	SLO	46.873,56		46.873,56
MGTŠ	Evidenčni projekt	V	EU	60.000,00		60.000,00
MGTŠ	Evidenčni projekt	Z	EU	81.000,00		81.000,00

RESOR	PP - UKREP	REGIJA	VIR	OSTANKI	Pogodbeno vezana	Prosta sredstva
MGTŠ	Evidenčni projekt	V	SLO	15.000,00		15.000,00
MGTŠ	Evidenčni projekt	Z	SLO	20.000,00		20.000,00
MDP	GOŠO 4	V	SLO	1.048.872,00	976.256,00	72.616,00
MDP	GOŠO 4	V	EU	4.195.488,00	3.905.024,00	290.464,00
MDP	GOŠO 4	Z	SLO	72.616,00	72.616,00	0,00
MDP	GOŠO 4	Z	EU	290.464,00	290.464,00	0,00
MDP	GOŠO 5	V	SLO	283.784,66	-2.275,34	286.060,00
MDP	GOŠO 5	V	EU	1.135.138,63	-9.101,37	1.144.240,00
MDP	GOŠO 5	Z	SLO	676.748,08	242.928,96	433.819,12
MDP	GOŠO 5	Z	EU	2.706.992,34	971.715,86	1.735.276,48
MKRR	1541-15-0026 - Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja - 231510	V	SLO	137.500,00		137.500,00
MKRR	1541-15-0026 - Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja - 231511	Z	EU	250.000,00		250.000,00
MKRR	1541-15-0026 - Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja - 231512	V	SLO	62.500,00		62.500,00
MKRR	1541-15-0026 - Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja - 231513	V	EU	4.000,00		4.000,00
MKRR	1541-15-0026 - Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja - 231514	V	SLO	1.000,00		1.000,00
MDDSZ	Operacije Zaposli.me (OP20.00202) na PN 8.1., Učne delavnice (OP20.01576) na PN 9.4. in nerealizirano po zaključenih operacijah iz JR v okviru PN 9.3		EU	1.306.534,22		1.306.534,22
MDDSZ	Operacije Zaposli.me (OP20.00202) na PN 8.1., Učne delavnice (OP20.01576) na PN 9.4. in nerealizirano po zaključenih operacijah iz JR v okviru PN 9.3		SLO	326.633,55		326.633,55
MDDSZ	Covid 19 - Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo (OP20.15.01.008)		EU	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
MKRR	TP CILJ 2			150.000,00		150.000,00
MKRR	TP CILJ 1			120.000,00		120.000,00
MNZ	Energetska sanacija policijske postaje Kranjska Gora	Z	EU	183.443,00		183.443,00
MNZ	Energetska sanacija policijske postaje Kranjska Gora	Z	SLO	32.373,00		32.373,00
MOPE	Obnova objekta Ruardova graščina - celovita energetska sanacija in rekonstrukcija OP20.03590	SLO	EU	106.554,26		106.554,26
MOPE	Obnova objekta Ruardova graščina - celovita energetska sanacija in rekonstrukcija OP20.03590	SLO	SLO	18.803,69		18.803,69
MOPE	Celovita energetska prenova objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem	SLO	EU	592.993,92		592.993,92
MOPE	Celovita energetska prenova objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem	SLO	SLO	104.645,99		104.645,99
MOPE	Postavitev sončnih elektrarn skupne moči 95,869 MW - 6. odpiranje JR SE OVE 2021	SLO	EU	679.107,51		679.107,51
MOPE	Postavitev sončnih elektrarn skupne moči 43,38 MW - 5. odpiranje JR SE OVE 2021	SLO	EU	230.958,68		230.958,68
MOPE	Izgradnja SE IMP PUMPS -2430-22-3339	SLO	EU	22.934,48		22.934,48
MOPE	FEPLASTA, proizvodnja in trgovina, d.o.o. -2430-22-3423	SLO	EU	168.131,70		168.131,70
MOPE	Sončni elektrarni OŠ Preddvor 200 kWp in ČN Tupaliče 64 kWp 2430-22-3444	SLO	EU	30.300,00		30.300,00

RESOR	PP - UKREP	REGIJA	VIR	OSTANKI	Pogodbeno vezana	Prosta sredstva
MOPE	Evidenčni projekt -1541-15-0008	SLO	EU	3.500.000,00		3.500.000,00
MNVP	Usklajevanja*					
<b>SKUPAJ</b>				<b>41.379.037,34</b>	<b>10.901.774,48</b>	<b>29.467.690,58</b>

\* V okviru MNVP podrobna ocena prostih pravic porabe še ni znana, podatki o prostih pravicah porabe za projekte zmanjšanje škodljivega delovanja voda se še usklajujejo med DRSV in MKRR.

Na operacije poplavne zaščite:

- Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice;
- Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore;
- Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo;
- Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo.

Izvajalci delajo z zmanjšano intenzivnostjo tudi zaradi visoke vode, ki je posledica vseh padavin. Prav tako izvajalci trenutno ne dobijo razpoložljivih kapacitet nominiranih podizvajalcev, ker slednji iz ekonomskih razlogov raje pristopijo k sanaciji/odpravljanju škode na drugi kritični infrastrukturi.

**Sredstva, ki ne bodo realizirana, se bodo v okviru že odobrenih projektov na porečjih uporabila za izvedbo interventnih ukrepov.**

### **3. Predlogi prerazporeditev pravic porabe v okviru prednostnih osi OP 2014-2020, ki jih je treba izvesti zaradi ujme**

Hude poplave, ki so Slovenijo prizadele v začetku avgustu 2023, imajo pomemben vpliv na izvajanje potrjenih operacij programskega obdobja 2014–2020. V nadaljevanju so opredeljene prednostne osi, na katerih je bilo zaenkrat zaznanih največ težav pri izvajanju operacij v okviru OP 2014–2020. Preglednica prikazuje prerazporeditve pravic porabe, ki se bodo predlagale v okviru spremembe OP 2014–2020.

#### **PREDNOSTNA OS 1**

V okviru prednostne osi 1 Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva bo zaradi nastalih razmer realizacija nekaterih operacij nižja, kot je bilo načrtovano, nekatere operacije pa ne bodo izvedene do konca obdobja upravičenosti programskega obdobja 2014–2020. Še posebej so izredne razmere vplivale na izvedbo operacije Biotehnoško stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB). Spremenila se je dinamika izvedbe gradbenih del, saj določenih del sploh ni bilo mogoče izvajati, določena dela pa so bistveno otežena.

Obilno deževje, katastrofalne poplave in neurja so ohromili cestni prevoz, v večjem ali manjšem obsegu poškodovali dostopne poti ter močno otežili dobave gradbenega materiala in sredstev. Zaradi navedenih težav obstaja tveganje, da operacija ne bo v celoti izvedena do konca leta 2023, tako da bo prispevek k porabi EU sredstev v okviru prednostne osi nižji. Pri operaciji prispevek Unije znaša več kot 25 mio EUR, zato pomembno prispeva k porabi sredstev prednostne osi. Če zaradi navedenih težav operacija ne bo zaključena v letu 2024, jo bo treba zaključiti v letu 2024 s sredstvi iz drugih virov. Ker je zaradi nastalih razmer proračun RS že tako obremenjen, želimo zmanjšati tveganje za nedoseganje 100-odstotne porabe sredstev OP 14-20, zato predlagamo, da se zaradi zgoraj navedenih razlogov prerazporedi 5 % pravic porabe s prednostne osi 1 Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva –

VZHOD na prednostno os 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast – VZHOD. Na tej prednostni osi je bilo namreč zaradi covid krize v okviru dodatnih pravic porabe potrjenih več operacij kot je na voljo pravic porabe v okviru OP 2014–2020. Predlagani zneski so razvidni iz spodnje preglednice.

## PREDNOSTNA OS 2

V okviru prednostne naložbe 2.1 Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo je bilo od skupno 39 operacij, ki so bile izbrane na dveh javnih razpisih za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije poškodovanih 13 operacij v času poplav. Gre za projekte, pri katerih je bilo omrežje v celoti že zgrajeno, vendar je bilo v velikem obsegu uničeno zaradi poplav in plazov (Gornji Grad, Luče, Ljubno, Rečica ob Savinji ter Kamnik) ali pa so bili projekti prizadeti v manjšem obsegu (Cerklje na Gorenjskem, Idrija, Mozirje, Nazarje, Brežice, Ribnica, Sodražica in Žiri) in bo sanacija prav tako potrebna. V primeru vseh operacij bo potrebno podaljševanje obdobja upravičenosti do konca leta 2023, operacije pa se bodo izvajale še v letu 2024. Tako se bo omogočilo doseganje čim višje vrednosti predvidenih kazalnikov ter izvedba operacij v čim večjem obsegu. Za to sanacijo bo MDP v letu 2023 potreboval 1,2 mio EUR (EU + SLO) za operacije Gornji Grad, Luče, Ljubno, Rečica ob Savinji, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Idrija, Mozirje, Nazarje, Brežice, Ribnica, Sodražica in Žiri. Pri teh operacijah je bilo 1.733 belih lis že zgrajenih, sedaj so te bele lise v celoti uničene oz. poškodovane in jih je potrebno ponovno zgraditi.

Ocenjuje se, da 20 % sredstev, ki so bila razpisana z dvema javnima razpisoma zaradi različnih dejavnikov (poplave, vetrolom, odstopi od pogodb zaradi dolgotrajnih postopkov) ne bo porabljenih, kar predstavlja 8,6 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru spremembe OP 2014–2020 se bo predlagala prerazporeditev pravic porabe iz PO 2 na PO 3.

## PREDNOSTNA OS 4

Zaradi povečanih tveganj zaradi zadnjih vremenskih ujm, ki vplivajo predvsem na zamude pri izvedbi projektov in povzročajo negotovost glede nastanka upravičenih izdatkov na strani upravičencev (občine, podjetja) do 31. 12. 2023 je treba prerazporediti sredstva in s tem zmanjšati tveganja pri porabi sredstev. Na ravni projektov je bil izveden pregled stanj po ujmah za projekte, ki so kljub vplivom ujme načeloma še vedno izvedljivi, vendar pa bo njihova izvedba zamaknjena, kar pomeni, da bo do konca leta 2023 porabljenih manj sredstev, kot je bilo predvideno.

Ker je zaradi nastalih razmer državni proračun že tako obremenjen, želimo zmanjšati tveganje za nedoseganje 100-odstotne porabe sredstev OP 2014–2020, zato predlagamo, da se zaradi zgoraj navedenih razlogov prerazporedi 5 % pravic porabe prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja – Celotna Slovenija na prednostno os 7 Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti – Celotna Slovenija. Na prednostni osi 7 se sredstva tako zagotovijo za projekt nadgradnje železniške infrastrukture na odseku Maribor-Šentilj. Predviden zaključek celotnega projekta je v oktobru 2023, medtem ko je bil promet po novem delu proge sproščen avgusta 2023. Na projektu se od aprila 2023 dalje stroški financirajo izključno iz sredstev državnega proračuna, ker so vsa razpoložljiva EU sredstva že porabljena. Do konca leta 2023 se v okviru projekta lahko dodatno porabi celoten znesek, ki bi se ga prerazporedilo, kar bi pomembno razbremenilo proračunska sredstva države (DRSI) za leto 2023, ki so po nedavnih ujmah nujno potrebna za sanacije škode na državni infrastrukturi (ponovno zagotavljanje cestne povezljivosti do prizadetih območij).

Preglednica 3: Predlagane prerazporeditve pravic porabe

PO	Sklad	Regija	Pravice porabe, 8.0	Predlagana sprememba	Pravice porabe po predlaganih spremembah	Opombe

PO	Sklad	Regija	Pravice porabe, 8.0	Predlagana sprememba	Pravice porabe po predlaganih spremembah	Opombe
1	ESRR	Vzhod	283.678.684	-14.183.934	269.494.749,80	Znižanje pravic porabe za 5 % na PO1 vzhod in prenos na PO3 vzhod
	ESRR	Zahod	214.608.166			
2	ESRR	Vzhod	25.371.237	-5.074.247	20.296.989,60	Znižanje pravic porabe za 20 % na PO2 vzhod in prenos na PO3 vzhod
	ESRR	Zahod	17.617.745	-3.523.549	14.094.196,00	Znižanje pravic porabe za 20 % na PO2 zahod in prenos na PO3 zahod
3	ESRR	Vzhod	263.228.743	19.258.181	282.486.924,00	Znižanje pravic porabe za 5 % na PO1 vzhod in prenos na PO3 vzhod. Znižanje pravic porabe za 20 % na PO2 vzhod in prenos na PO3 vzhod
	ESRR	Zahod	164.157.114	3.523.549	167.680.663,00	Znižanje pravic porabe za 20 % na PO2 zahod in prenos na PO3 zahod
4	KS	Celotna SI	231.615.650	-11.580.783	220.034.867,50	Znižanje pravic porabe za 5 % na PO4 celotna SI in prenos na PO7 celotna SI
	ESRR	Vzhod	62.883.047			
5	ESRR	Zahod	17.932.912			
	KS	Celotna SI	51.725.634			
6	ESRR	Vzhod	28.101.310			
	KS	Celotna SI	284.389.163			
7	ESRR	Vzhod	100.032.755			
	ESRR	Zahod	48.999.997			
8	KS	Celotna SI	256.779.412	11.580.783	268.360.194,81	Znižanje pravic porabe za 5 % na PO4 celotna SI in prenos na PO7 celotna SI
	ESRR	Vzhod	79.935.292			
9	ESS	Vzhod	131.581.121			
	ESS	Zahod	140.966.076			
10	YEI	Vzhod	18.423.072			
	ESS	Vzhod	92.638.770			
	ESS	Zahod	64.984.361			
	ESRR	Vzhod	40.035.380			
11	ESRR	Zahod	32.917.180			
	ESS	Vzhod	120.676.227			
	ESS	Zahod	92.181.016			
12	ESRR	Vzhod	10.014.152			
	ESRR	Zahod	10.009.139			
13	ESS	Vzhod	25.505.282			
	ESS	Zahod	37.368.698			
14	KS	Celotna SI	89.537.036			
15	ESRR	Vzhod	14.112.244			

PO	Sklad	Regija	Pravice porabe, 8.0	Predlagana sprememba	Pravice porabe po predlaganih spremembah	Opombe
	ESRR	Zahod	3.050.266			
	ESS	Vzhod	9.072.157			
14	ESS	Zahod	3.795.887			
<b>SKUPAJ 1 - 14</b>			<b>3.067.924.925</b>			
15	ESRR	Celotna SI	255.741.210			
16	ESS	Celotna SI	13.205.000			
<b>SKUPAJ 15 - 16</b>			<b>268.946.210</b>			
<b>SKUPAJ</b>			<b>3.336.871.135</b>			

#### 4. Pregled zaostankov v informacijskem sistemu e-MA po ministrstvih

Poraba razpoložljivih sredstev je ključnega pomena za uspešno izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

**MKRR predlaga, da posredniški organi odpravijo vse zaostanke do konca septembra 2023 ter pospešijo pregled zahtevkov za izplačilo in zaključevanje projektov, z upoštevanjem roka upravičenosti, tj. 31. 12. 2023.**


#### 5. Stanje porabe sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020

Kot je razvidno iz grafa v nadaljevanju se po podatkih Evropske komisije na dan 4. 9. 2023 Slovenija pri uspešnosti porabe razpoložljivih sredstev z doseženimi 93 % uvršča na šesto mesto. Odstotek porabe, poleg vmesnih plačil, vključuje tudi odstotek prejetih predplačil. Nekatere države članice EU so od Evropske komisije prejele višji odstotek predplačil kot Slovenija, kar pomeni, da se z vidika prejetih neto plačil, skupaj s Češko in Ciprom, **dejansko uvrščamo še višje.**

Slovenija je v nasprotju s stalnimi kritikami s strani opozicije in laične javnosti pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike dejansko med najbolj uspešnimi državami članicami Evropske unije. To velja tako za pretekla programska obdobja (Phare, programsko obdobje 2007–2013) kot za iztekajoče se programsko obdobje (2014–2020).



Graf 1: Pregled prejetih plačil po državah evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020

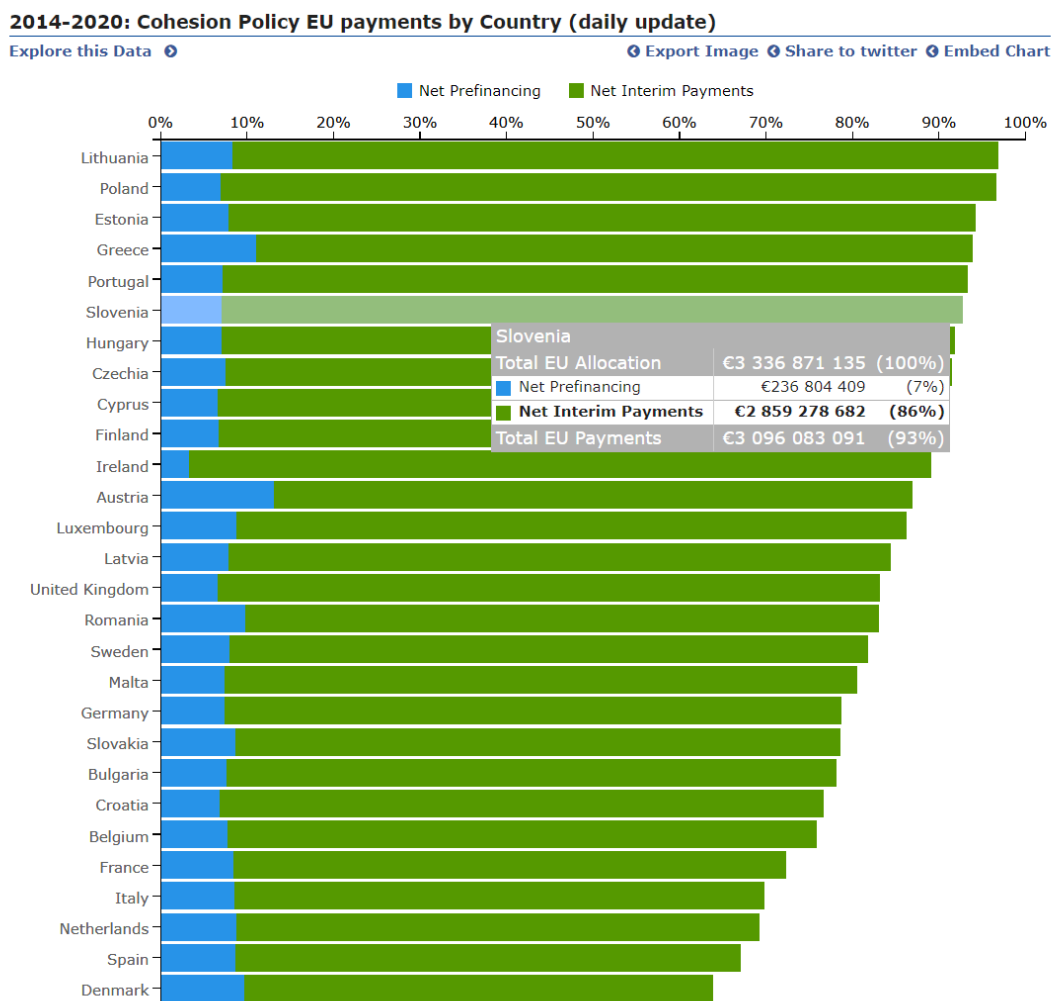

Refresh Date: 04/09/2023

Vir. Evropska komisija, 4. 9. 2023

## NAČRTOVANJE ODHODKOV IN IZVRŠEVANJA DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014-2020 (Priloga MF)

Zakon o javnih financah kakor tudi Zakon o fiskalnem pravilu vladi nalagata, da se proračun države načrtuje ob upoštevanju srednjeročnega fiskalnega cilja in ekonomske realnosti na temelju neodvisnih napovedi makroekonomskih izhodišč, že prevzetih obveznosti in obstoječih zakonskih obveznosti in da ga je potrebno načrtovati na način, da se zagotovi zakonita, gospodarna in učinkovita poraba javnih sredstev ter dosežejo zastavljeni cilji.

S tem namenom vlada pripravi Odlok, s katerim se za najmanj tri prihodnja leta sprejme Okvir za pripravo proračunov sektorja država, medtem ko se proračun sektorja država načrtuje za dve prihodnji leti. Predlog proračuna države, ki ga pripravi Ministrstvo za finance za posamezno leto in ki ga vlada predlaga v sprejetje Državnemu zboru, mora biti usklajen s sprejetim Okvirjem.

Sestavni del proračunskega načrtovanja je tudi načrtovanje sredstev evropske kohezijske politike. Ta sredstva se v državnem proračunu načrtujejo skladno z veljavno ovojnico – Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. Ločeno se načrtujejo EU sredstva, ki jih povrne Evropska komisija od sredstev, ki jih mora država članica zagotoviti sama. Sestavni del Operativnega programa 2014-2020, ki ga je potrdila Evropska komisija, je tudi finančni načrt porabe sredstev po letih v višini 3.336,8 mio EUR.

Z Operativnim programom 2014-2020 se je načrtovalo, da bo Slovenija na letni ravni za sofinanciranje evropskih projektov v povprečju porabila 430 mio EUR. Pri tem evropska uredba, ki ureja področje porabe sredstev EKP, dopušča možnost, da se sredstva, ki so državi članici dodeljena za posamezno leto, porabijo v roku treh let do dodelitve – pravilo N+3.

Ključni dokument za načrtovanje EU sredstev v okviru dvoletnega načrtovanja državnega proračuna predstavlja t.i. Izvedbeni načrt operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 (v nadaljevanju: Izvedbeni načrt). Pripravi ga Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju: MKRR) v sodelovanju z ministrstvi v vlogi posredniških organov, vključenimi v izvajanje evropske kohezijske politike (v nadaljevanju: EKP).

MKRR Izvedbeni načrt pripravi do roka, ki Ministrstvu za finance omogoči realno načrtovanje v okviru limitov proračunskih odhodkov, ki jih določi vlada. Iz tega izhaja, da je osnovni namen priprave Izvedbenega načrta zagotavljanje osnove za realno načrtovanje kohezijskih proračunskih odhodkov. Poleg tega Izvedbeni načrt zagotavlja finančni pregled OP po letih, resorjih, načinu izbora operacije (NIO) in drugih kriterijih.

Izkušnje programskega obdobja 2014-2020 so pokazale da:

- se je Izvedbeni načrt v l. 2016-2023 spremenil tridesetkrat, torej v povprečju 3,75-krat letno,
- načrtovanje porabe sredstev ni realno, kar otežuje proračunsko načrtovanje, na kar opozarja tudi Fiskalni svet,
- se z Izvedbenim načrtom glavnina realizacije načrtuje za zadnja leta programskega obdobja, kar izhaja tudi iz Tabele 1,

- so načrtovana potrebna sredstva v državnem proračunu višja od dejanske realizacije,
- se načrtovana neporabljena sredstva prestavljajo v prihodnja leta, kar pa je možno, skladno z Zakonom o izvrševanju državnega proračuna, izvajati le v okviru razpoložljive finančne ovojnice.


**Tabela 1:** Pregled načrtovanih in sredstev in realizacije v obdobju 2014-2023

Leto	Veljavni proračun	Izvedbeni načrt (INOP)	INOP/VP v %	Izplačila upravičencem	Izplačila/VP v %	Izplačila/INOP v %
2014	1.945.250	0	/	0	/	/
2015	60.678.302	0	/	0	/	/
2016	436.338.382	251.179.699	57,6	116.701.470	26,7	46,5
2017	580.811.829	397.905.388	68,5	213.538.595	36,8	53,7
2018	552.032.170	551.932.782	99,9	300.725.447	54,5	54,5
2019	625.527.619	567.293.567	90,7	344.244.437	55,0	60,7
2020	564.810.356	697.106.677	123,4	452.832.151	80,2	65,0
2021	737.398.804	893.998.531	121,2	570.543.021	77,4	63,8
2022	678.101.732	823.701.701	121,5	538.994.201	79,5	65,4
2023	773.474.532*	765.575.394	98,98	214.192.623	27,7	28,0

\*: v rebalansu državnega proračuna za l. 2023 je bila upoštevana načrtovana vrednost na podlagi INOP ver. 23.1 z dne, 10. 3. 2023.

Vir: MFERAC, APPrA, MKRR, 7. 9. 2023

**Graf 1:** EKP 2014-2020: Načrtovanje in realizacija odhodkov državnega proračuna v obd. 2014-2023

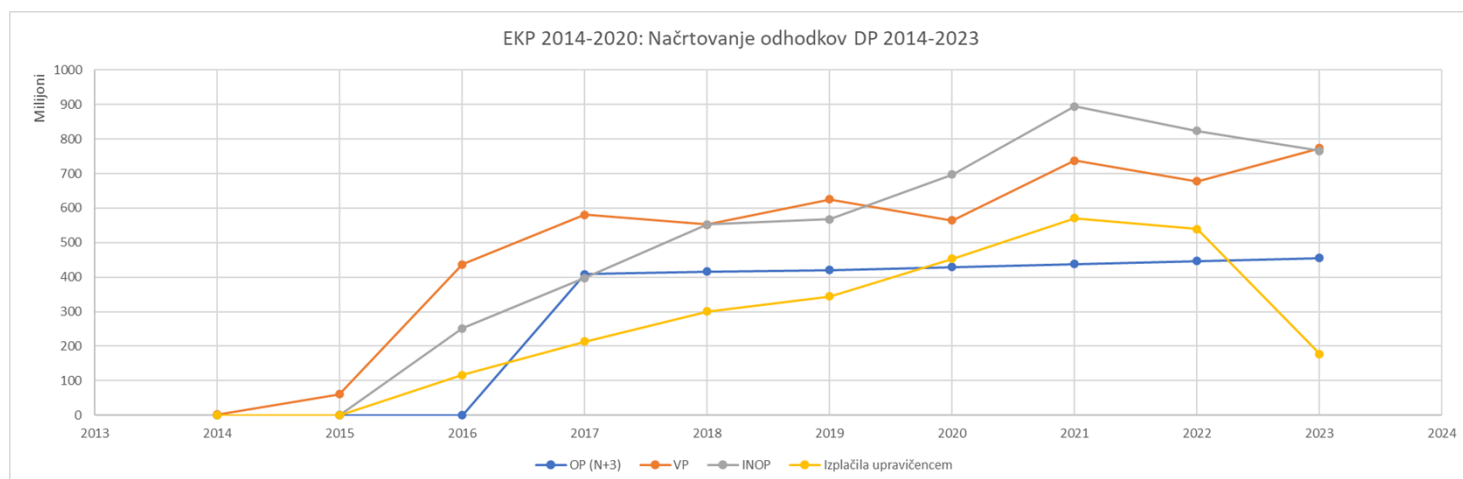

Vir: MFERAC, 7. 9. 2023

Kot izhaja iz Tabele 1, so bila v državnem proračunu za izvajanje EKP 2014-2020 v prvih dveh letih rezervirana sredstva v višini 63 mio EUR, realizacije pa ni bilo.

Sredstva EKP so se začela porabljati v tretjem letu programskega obdobja (I. 2016), ko je takratna Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju: SVRK) pripravila Izvedbeni načrt. Napoved porabe je bila v višini 436 mio EUR. SVRK je za I. 2016 načrtoval porabo v višini 251 mio EUR od česar je bilo za sofinanciranje evropskih projektov ob koncu leta porabljenih 116,7 mio EUR, kar predstavlja 26,7 % veljavnega proračuna oz. 46,5 % Izvedbenega načrta.

Za leto 2017 je SVRK Izvedbeni načrt pripravil maja v višini 398 mio EUR. Realizacija odhodkov je koncem leta dosegla 213,5 mio EUR oz. 53,7 % Izvedbenega načrta, oz. 36,8 % sprejetega proračuna.

Izvajanje EKP 2014-2020 v I. 2018 je bilo ključnega pomena za poročanje Evropski komisiji o doseženih kazalnikih, s katerimi se je sprostila rezerva za uspešnost. V tem letu je bilo proračunsko načrtovanje in načrtovanje Izvedbenega načrta uravnoteženo (552 mio EUR). Realizacija odhodkov je koncem leta dosegla 300, kar predstavlja 54,5 % veljavnega proračuna in Izvedbenega načrta.

Za I. 2019 je SVRK napovedal realizacijo izplačil v višini 625 mio EUR. Konec leta je realizacija znašala 344 mio EUR oz. 55 % veljavnega proračuna.

Leta 2020 smo na Ministrstvu za finance pričeli izdelovati lastne projekcije EU odhodkov. SVRK je napovedal realizacijo izplačil v višini 697 mio EUR, v proračunu pa smo v ta namen zagotovili 564 mio EUR. Konec leta je realizacija znašala 452,8 mio EUR oz. 80,2 % veljavnega proračuna.

Za leto 2021 je SVRK napovedal realizacijo 893,9 mio EUR. Realizacija je znašala 570 mio EUR oz. 64 % prvotne napovedi.

Podobno realizacijo beležimo tudi lani, napovedana so bila izplačila v višini 823 mio EUR, realizacija konec leta je znašala 539 mio EUR oz. 65 % napovedi.

**Leto 2023 je zadnje leto programskega obdobja EKP 2014-2020.** V času priprave rebalansa proračuna sta Ministrstvo za finance in MKRR dogovorila višino potrebnih sredstev za uspešen zaključek programskega obdobja. Tako je vlada za zaključek projektov v državnem proračunu 2023 zagotovila 773 mio EUR in dodatnih 60 mio EUR za I. 2024. MKRR je maja pripravilo novo različico Izvedbenega načrta, v katerem je napoved izplačil za I. 2023 popravil na 749,3 mio EUR, za I. 2024 pa načrtoval izplačila v višini 77,9 mio EUR.


## **STANJE PORABE SREDSTEV EKP NA DAN 10. 8. 2023**

Po podatkih Evropske komisije na dan 10. 8. 2023 se Slovenija, v pogledu črpanja razpoložljivih sredstev, skupaj s Ciprom in z doseženimi 91 %, uvršča na 7. mesto, kar izhaja iz Grafa 2.

Odstotek črpanja, poleg vmesnih plačil, vključuje tudi odstotek prejetih predplačil. Nekatere države članice EU so od Evropske komisije prejele višji odstotek predplačil kot Slovenija, kar pomeni, da se v pogledu prejetih neto plačil, skupaj s Češko in Ciprom, dejansko uvrščamo na 5. mesto.

Vir. Evropska komisija, 10. 8. 2023

2014-2020: Cohesion Policy EU payments by Country (daily update)

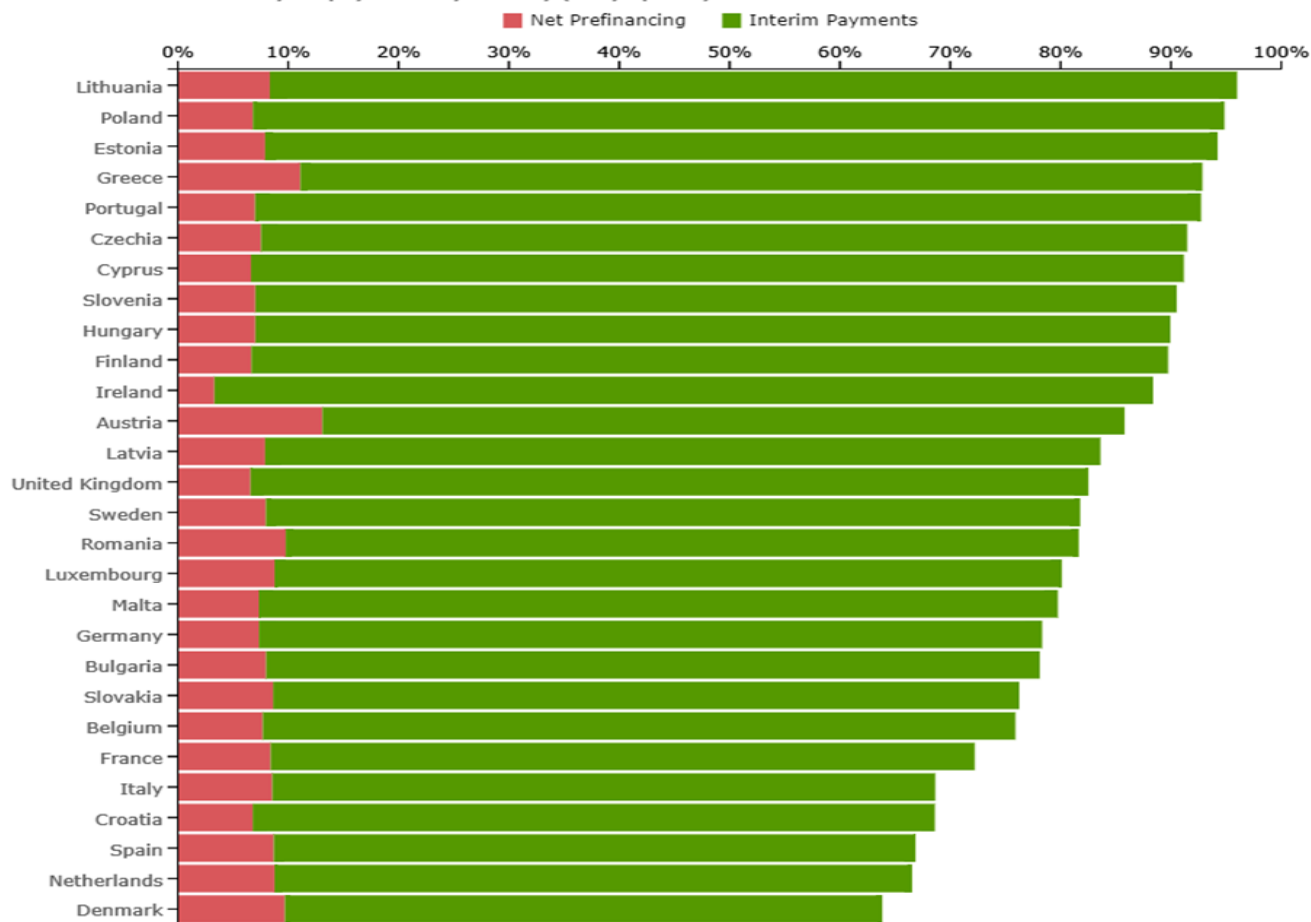

Refresh Date: 10/08/2023

Sloveniji iz naslova EKP 2014-2020 pripadajo sredstva v višini 3.336,8 mio EUR. Ministrstvo za finance je v prvem tednu avgusta letošnjega leta za 10. obračunsko leto (zadnje leto izvajanja) na Evropsko komisijo naslovalo tri zahtevke za vmesno plačilo v skupini višini 81 mio EUR. Tako smo v obdobju od 1. 1. 2014 do 7. 9. 2023 Evropski komisiji potrdili upravičene izdatke v višini 2.912,2 mio EUR, kar predstavlja 87 % finančnega načrta. **Do polnega črpanja je potrebno na Evropsko komisijo najkasneje do 30. 6. 2024 prijaviti še izdatke v višini najmanj 465 mio EUR.**

Ministrstvo za finance tedensko spremlja napredek pri črpanju evropskih sredstev in pri tem ugotavlja, da je tudi v letošnjem letu črpanje počasno in predvideva, da bo glavčina izplačil upravičencem do evropskih sredstev tudi letos potekala v zadnjih dveh mesecih. Stanje izplačil v I. 2023 na dan 7. 9. 2023 znaša 214 mio EUR kar predstavlja le 27,7 % veljavnega proračuna.

**Tabela 2:** : EKP 2014-2020: Pregled realiziranih plačil upravičencem v I. 2023 po ministrstvih glede na veljavni proračun

	<b>Veljavni proračun</b>	<b>Izplačila upravičencem</b>	<b>Izplačila upravičencem v %</b>
Odhodki	773.474.532	214.192.623	27,7
<b>131 - USTAVNO SODIŠČE</b>	77.866	16.597	21,3
<b>16 - MINISTRSTVO ZA FINANCE</b>	775.864	637.146	82,1
<b>163 - MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ</b>	35.254.177	9.199.813	26,1
<b>17 - MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE</b>	183.443	0,00	0
<b>19 - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO</b>	26.096.933	7.923.886	30,4
<b>203 - MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE</b>	4.385.492	1.900.823	43,3
<b>218 - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT</b>	71.841.198	26.402.059	36,8
<b>243 - MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO</b>	115.035.263	41.780.272	36,3
<b>256 - MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR</b>	205.557.179	47.857.404	23,3
<b>257 - MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO</b>	72.137.344	8.220.129	11,4
<b>26 - MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI</b>	78.567.099	38.907.368	49,5
<b>27 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE</b>	87.935.993	18.957.669	21,69
<b>313 - MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO</b>	6.605.068	2.816.573	42,6
<b>315 - MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO</b>	19.979.787	197.453	1,0
<b>334 - MINISTRSTVO ZA KULTURO</b>	6.794.695	4.185.983	61,6
<b>335 - MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE</b>	16.018.493	1.924.502	12,0
<b>336 - MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INOVACIJE</b>	23.428.541	2.347.074	10,0
<b>41 - VRHOVNO SODIŠČE RS</b>	2.800.094	917.873	32,8

Vir: APPrA, 7. 9. 2023

## **PRESEŽNE PRAVICE PORABE V OKVIRU IZVAJANJA EKP 2014-2020**

Vlada je v letu 2017, na predlog SVRK, s sklepom odobrila dodatne pravice porabe v višini 225 mio. Z dodatnimi pravicami porabe se zagotavlja sredstva za projekte, ki izhajajo iz Dogovorov za razvoj regij in v katere so vključena tri ministrstva: MGTŠ, MOPE, MZI.

Poleg navedenega je s 1. januarjem 2022 stopila v veljavo Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v

programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, s katero se zaradi zagotovitve porabe vseh razpoložljivih sredstev operativnega programa določa, da lahko organ upravljanja, ne glede na ostale določbe te uredbe, izda odločitve o podpori prek obsega razpoložljivih sredstev, vendar največ do višine, ki za 15 % presega razpoložljive pravice porabe operativnega programa.

Zgornja višina presežnih pravic porabe tako znaša 500,5 mio EUR, s čimer se ovojnica s 3.336,8 mio EUR zviša na 3.837,3 mio EUR.

Iz poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2023 izhaja, da je MKRR posredniškimi organom v celoti dodelil presežne pravice porabe.

Na dan 10.8.2023 je finančna slika operativnega programa 2014-2020 sledeča:

- Vrednost vseh potrjenih operacij znaša 3.624,0 mio EUR, torej za 287,2 mio EUR več, kot znaša finančni načrt Operativnega programa 2014-2020.
- Vrednost certificiranih izdatkov do EK znaša 2.912,2 mio EUR.
- Ministrstvo za finance je Evropski komisiji že potrdilo presežne upravičene izdatke v višini 324,8 mio EUR.
- Višina do sedaj ugotovljenih nepravilnosti, za katere je potrebno znižati certificirane izdatke do Evropske komisije, znaša 58,7 mio EUR.
