10. 9. 2012

TERMINSKI PLAN priprave DPN (s ŠV in CPVO) za obvoznico TOLMIN

ID	Faza postopka priprave DLN	Trajanje Dni	Načrtovan Začetek	Načrtovan Zaključek	Navezava	Nosilci
1	**POBUDA MINISTRA ZAINTERESIRANEGA RESORJA**	**1 d**	**Tor 25.3.08**	**Tor 25.3.08**		MzP DC
2	**SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**85 d**	**Sre 26.3.08**	**Ned 27.7.08**		
12	**OSNUTEK DPN**	**164 d**	**Pon 28.7.08**	**Sob 21.3.09**		
22	**DOPOLNITEV OSNUTKA DPN**	**535,88 d**	**Tor 30.3.10**	**Tor 8.5.12**		
23	**PRIDOBITEV STROKOVNIH REŠITEV PROSTORSKIH UREDITEV**	**216 d**	**Tor 30.3.10**	**Ned 30.1.11**		
27	**IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA DPN (doDPN)**	**81 d**	**Tor 30.11.10**	**Čet 24.3.11**		
34	**JAVNA RAZGRNITEV in JAVNE OBRAVNAVE**	**138,88 d**	**Pon 17.10.11**	**Tor 8.5.12**		
35	Organizacija javne razgrnitve (JR) in obravnav (JO)	14 pd	Pon 17.10.11	Pon 31.10.11	33KZ-5 d	MOP DP
36	Priprava in uskladitev javnega naznanila JR in JO	10 pd	Pet 21.10.11	Pon 31.10.11	35SS+5 d	MOP DP
37	Izdelava povzetka za javnost	15 pd	Pon 17.10.11	Tor 1.11.11	35SS	investitor
38	Objava javnega naznanila	1 pd	Čet 27.10.11	Pet 28.10.11		MOP DP
39	Posredovanje doDPN občinam za JR in za pripravo njihovega stališča	4 d	Sre 2.11.11	Pon 7.11.11	38;35	MOP DP
40	JR in JO doDPN, strokovnih podlag (SP), variantnih rešitev ter OP	30 pd	Pon 7.11.11	Sre 7.12.11	38KZ+10 pd	MOP DP, investitor
41	Pripombe in predlogi javnosti	30 pd	Pon 7.11.11	Sre 7.12.11	40SS	javnost
42	Pripombe in predlogi občin	30 pd	Pon 7.11.11	Sre 7.12.11	38KZ+7 pd	občine
43	Posredovanje pripomb in predlogov izdelovalcu DPN	20 pd	Tor 22.11.11	Pon 12.12.11	41KZ-15 pd	MOP DP
44	*Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti in občin k DPN, SP ter OP	96 pd	Sre 1.2.12	Pon 7.5.12	40	koordinator, investitorm, pobudnik, izdelovalec
45	Objava stališč do pripomb na spleti in posredovanje občini	1 d	Pon 7.5.12	Tor 8.5.12	44	koordinator
46	**PREDLOG DPN**	**135,13 d**	**Pet 2.3.12**	**Ned 16.9.12**		
47	**IZDELAVA PREDLOGA DPN (pDPN)**	**81,13 d**	**Pet 2.3.12**	**Sob 30.6.12**		
48	Dopolnitev SP po JR	30 pd	Pet 2.3.12	Ned 1.4.12	44SS+30 pd	investitor, izdelovalec
49	Dopolnitev OP zaradi dopolnitev SP po JR	30 pd	Sob 17.3.12	Pon 16.4.12	48KZ-15 pd	iinvestitor, izdelovalec
50	Izdelava predloga DPN (pDPN), zaključek analize smernic	30 pd	Ned 1.4.12	Tor 1.5.12	48KZ-15 pd	investitor, izdelovalec
51	Uskladitev pDPN - vsebinsko	15 pd	Tor 1.5.12	Sre 16.5.12	50	koordinator, pobudnik, investitor
52	Recenzija/pregled pDPN	15 pd	Sre 16.5.12	Čet 31.5.12	51	koordinator, recenzent
53	Dopolnitev po recenziji/pregledu	30 pd	Čet 31.5.12	Sob 30.6.12	52	investitor, izdelovalec
54	**MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA**	**53 d**	**Tor 3.7.12**	**Ned 16.9.12**		
55	Posredovanje vlog NUP/pridobitev mnenj	30 pd	Tor 3.7.12	Čet 2.8.12		koordinator
56	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30 pd	Tor 3.7.12	Čet 2.8.12	55SS	varstvena ministrstva
57	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	30 pd	Tor 3.7.12	Čet 2.8.12	55SS	sCPVO
58	Posredovanje mnenj NUP izdelovalcu DPN	10 d	Tor 24.7.12	Pon 6.8.12	d;57ZZ+3 d	koordinator
59	Priprava usklajenega predloga DPN in uredbe o DPN	45 pd	Čet 2.8.12	Ned 16.9.12	6;58ZZ+5 d	koordinator, investitor, pobudnik, izdelovalec
60	**SPREJEM DPN**	**73 d**	**Pon 17.9.12**	**Čet 3.1.13**		
61	Priprava gradiva za Vlado RS	1 d	Pon 17.9.12	Pon 17.9.12	59	koordinator
62	Uskladitev gradiva - vsebinsko	2 d	Tor 18.9.12	Sre 19.9.12	61	koordinator, investitor
63	Lektoriranje gradiva	14 pd	Pon 17.9.12	Pon 1.10.12	61	lektorska služba
64	Uskladitevz MF	14 pd	Pon 1.10.12	Pon 15.10.12	63	MF
65	Uskladitev gradiva s SVZ	14 pd	Pon 1.10.12	Pon 15.10.12	63	SVZ
66	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	5 d	Tor 16.10.12	Pon 22.10.12	65	koordinator
67	Odbor Vlade za GTR	1 d	Tor 23.10.12	Tor 23.10.12	66	odbor
68	Sprejem Uredbe o DPN	7 pd	Tor 23.10.12	Tor 30.10.12	67	Vlada RS
69	Objava Uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 d	Pet 2.11.12	Sre 21.11.12	68	Vlada RS
70	Pravnomočnost Uredbe o DPN	14 pd	Sre 21.11.12	Sre 5.12.12	69	
71	Izdelava končnih elaboratov DPN	30 pd	Sre 21.11.12	Pet 21.12.12	69	investitor
72	Izdelava povzetka za javnost	5 d	Čet 22.11.12	Sre 28.11.12	69	investitor
73	Posredovanje končnih elaboratov DLN občinam, UE, …	5 d	Pon 24.12.12	Čet 3.1.13	71	koordinator

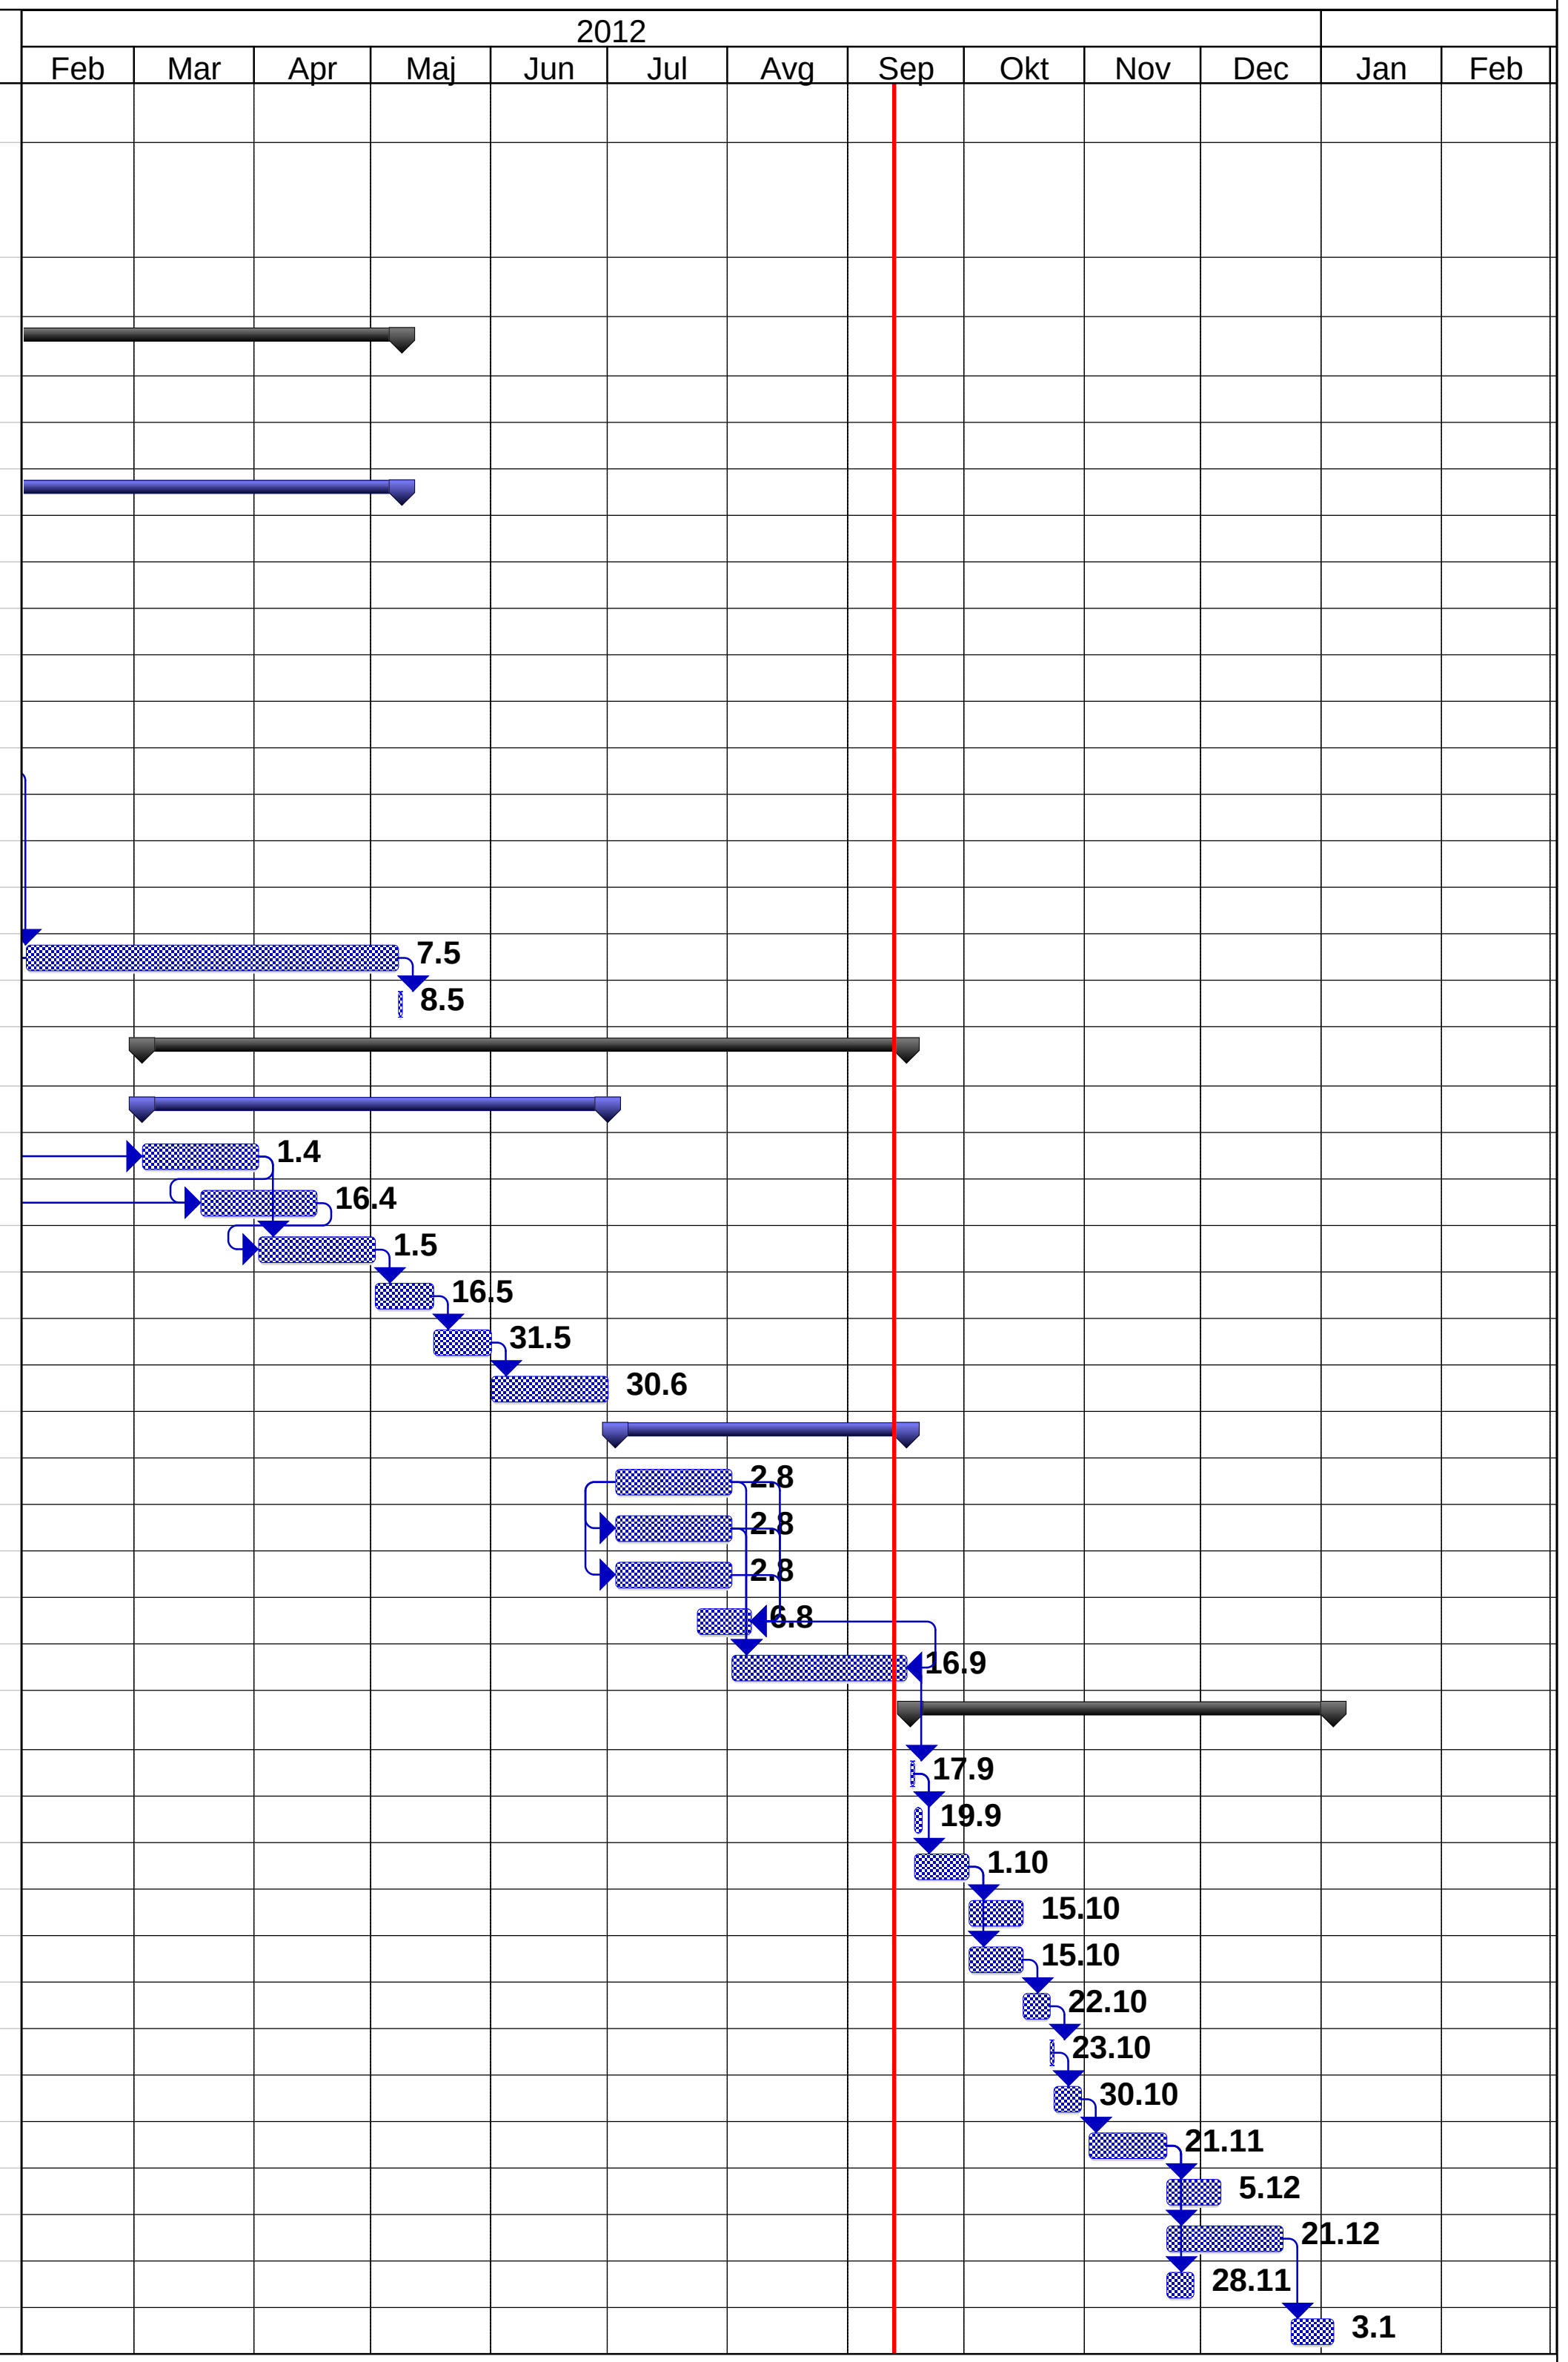

* Stališča bi morala biti zaključena 7. 2. 2012. Zaradi dodatnih preveritev ureditev, ki so predlog javnost iz čas javne razgr**TP DPN, se je priprava stališč zavlekla. V kolikor bodo stališča podana do 12. 3. 2012 bo TP uresničljiv.
ustreznosti HH študije (je že posredovana na ARSO 15. 11. 2011).
