ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
1	**POBUDA**	**851 dnevi**	**Čet 11.2.10**	**Sre 15.5.13**		
2	**SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**185 dnevi**	**Čet 11.2.10**	**Sre 27.10.10**		
14	**PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI, ODLOČBE O CPVO**	**272 dnevi**	**Sre 27.10.10**	**Čet 10.11.11**		
39	**IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE**	**17 dnevi**	**Pet 11.11.11**	**Pon 5.12.11**		
40	Posredovanje osn. sklepa + elaborata analize semernic članom prostorske konference	1 dan	Pet 11.11.11	Pet 11.11.11	38	K
41	Sklic seje prostorske konference	5 dnevi	Pon 14.11.11	Pet 18.11.11	40	K
42	Izvedba seje prostorske konference	1 dan	Pon 21.11.11	Pon 21.11.11	41	K
43	Priprava predloga sklepa o pripravi DPN	10 dnevi	Tor 22.11.11	Pon 5.12.11	42	K
44	**SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN**	**235 dnevi**	**Tor 6.12.11**	**Pon 29.10.12**		
45	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Tor 6.12.11	Pon 19.12.11	43;42	K
46	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Tor 20.12.11	Pon 26.12.11	45	K;IN
47	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	120	Pon 26.12.11	Tor 24.4.12	46	K;MF;P;SVZ
48	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	120 dnevi	Sre 25.4.12	Tor 9.10.12	47	K
49	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Sre 10.10.12	Sre 10.10.12	48	vlada
50	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10	Sre 10.10.12	Sob 20.10.12	49	vlada
51	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3 dnevi	Pon 22.10.12	Sre 24.10.12	50	vlada
52	Objava sklepa na spletni strani MzIP DzP	3 dnevi	Čet 25.10.12	Pon 29.10.12	51	K
53	**SPREJEM UREDBE O (PRENEHANJU VELJAVNOSTI) ZAČASNEM UKREPU - ZUKR (opcija)**	**148 dnevi**	**Sob 20.10.12**	**Sre 15.5.13**		
71	**ŠTUDIJA VARIANT in DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**462 dnevi**	**Ned 30.9.12**	**Tor 8.7.14**		
72	**IZBOR IZDELOVALCA**	**100 dnevi**	**Ned 30.9.12**	**Ned 17.2.13**		
73	Priprava osnutka projektne naloge (geodetske podlage, IdP, DPN in OP)	15	Ned 30.9.12	Pon 15.10.12	74ZK	IN
74	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MzIP	5	Pon 15.10.12	Sob 20.10.12	75ZK	IN;P;K
75	Izbor izdelovalca: javna naročila (DPN, OP in IdP)	100	Sob 20.10.12	Pon 28.1.13	50	IN
76	Izbor izdelovalca: podpis pogodb DPN, OP in IdP	20	Pon 28.1.13	Ned 17.2.13	75	IN
77	**ŠTUDIJA VARIANT**	185 dnevi	Ned 17.2.13	Ned 3.11.13		
78	Izdelava strokovnih podlag za načrtovanje variant (IdP)	120	Ned 17.2.13	Pon 17.6.13	76	
79	Izdelava strokovnih podlag za ŠV/PIZ	33 dnevi	Ned 2.6.13	Sre 17.7.13		
80	Izdelava gradbeno-tehnična elaborata (funkcionalni vidik)	30	Ned 2.6.13	Tor 2.7.13	78ZZ+15	IZ
81	Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidik) vključno z oceno sprejemljivosti v lokalnem okolju	30	Ned 2.6.13	Tor 2.7.13	78ZZ+15	IZ
82	Izdelava okoljskega elaborata (varstveni vidik) - OP brez ocene sprejemljivosti plana	30	Ned 2.6.13	Tor 2.7.13	78ZZ+15	IZ
83	Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik)	30	Pon 17.6.13	Sre 17.7.13	78;80ZZ+15 ;81ZZ+15 ;82ZZ+15	IZ
84	Izdelava ŠV in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	30	Tor 2.7.13	Čet 1.8.13	80;81;82;83ZZ+15	IZ
85	Izdelava okoljskega poročila (OP) - zaključek	20	Sob 14.9.13	Pet 4.10.13	84ZZ+10 dnevi;91ZZ+10	IZ
86	Recenzija (pregled) ŠV/PIZ	14	Čet 1.8.13	Čet 15.8.13	84	K
87	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	10	Čet 15.8.13	Ned 25.8.13	86	IZ
88	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Pet 4.10.13	Ned 3.11.13	85;87	SCPVO
89	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**227 dnevi**	**Ned 25.8.13**	**Tor 8.7.14**		
90	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	0	Ned 25.8.13	Ned 25.8.13	87	IZ
91	Izdelava osnutka DPN	30	Ned 25.8.13	Tor 24.9.13	90	IZ
92	Pregled osnutka DPN	7	Tor 24.9.13	Tor 1.10.13	91	K
93	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Tor 1.10.13	Pet 11.10.13	92	IN;IZ
94	**JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV, OP in oDPN + MNENJE OBČINE**	**66 dnevi**	**Čet 26.9.13**	**Ned 29.12.13**		
95	Organizacija JR in JO	15	Čet 26.9.13	Pet 11.10.13	93ZZ;87ZZ	K;občine
96	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Sre 9.10.13	Pon 14.10.13	95ZZ+3	K;IN
97	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Tor 8.10.13	Pon 14.10.13	95ZZ+3	IZ
98	Objava javnega naznanila	3	Pon 14.10.13	Čet 17.10.13	96;97	K;izbran medij
99	Predstavitev SV/PIZ, PNV, OP in oDPN občini in predstavnikom javnosti	1 potdni	Pon 14.10.13	Tor 15.10.13	96;97	P:K;IN:IZ
100	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	3	Tor 15.10.13	Pet 18.10.13	99	K
101	JR in JO	30	Čet 24.10.13	Sob 23.11.13	98KZ+7	K
102	Pripombe in predlogi javnosti	30	Čet 24.10.13	Sob 23.11.13	98KZ+7	javnost
103	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Čet 24.10.13	Sob 23.11.13	98KZ+7	LNUP
104	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalcu ter Sektorju za PVO	30	Tor 29.10.13	Čet 28.11.13	101ZZ+5 ;102ZZ+5 ;103ZZ+5	K
105	Priprava in uskladitev stališč do pripomb	45	Sre 13.11.13	Sob 28.12.13	104KZ-15	K;P;IN;IZ
106	Podpis in objava stališč do pripomb na spletu ter posredovanje občinam	1 potdni	Sob 28.12.13	Ned 29.12.13	105	K;P
107	**Dopolnitev strokovnih podlag in ŠV/PIZ s PNV**	**32 dnevi**	**Sob 28.12.13**	**Tor 11.2.14**		**IZ**
108	Dopolnitev strokovnih podlag	30	Sob 28.12.13	Pon 27.1.14	105	IZ
109	Dopolnitev ŠV/PIZ	15	Pon 27.1.14	Tor 11.2.14	108ZZ+15	IZ
110	Potrditev ŠV/PIZ na Komisiji za potrjevanje investicijske dokumentacije	60	Tor 11.2.14	Sob 12.4.14	109	P
111	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**24 dnevi**	**Pon 27.1.14**	**Pet 28.2.14**		
112	Dopolnitev strokovnih podlag	0	Pon 27.1.14	Pon 27.1.14	108	IZ
113	Izdelava predloga DPN	15	Pon 27.1.14	Tor 11.2.14	112	IZ
114	Pregled predloga DPN	7	Tor 11.2.14	Tor 18.2.14	113	K
115	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	10	Tor 18.2.14	Pet 28.2.14	114	IZ
116	Preveritev / dopolnitev OP	30	Pon 27.1.14	Sre 26.2.14	113ZZ+15 ;109ZZ+15	
117	**PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV**	**46 dnevi**	**Pet 28.2.14**	**Pon 5.5.14**		
118	Posredovanje vseh vlog	3	Pet 28.2.14	Pon 3.3.14	115;116;109	K
119	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pon 3.3.14	Sre 2.4.14	118	DNUP
120	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pon 3.3.14	Sre 2.4.14	118	DNUP
121	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	45 dnevi	Tor 4.3.14	Pon 5.5.14	118	SCPVO
122	Posredovanje mnenj NUP investitorju	30	Sob 8.3.14	Pon 7.4.14	119ZZ+5 ;120ZZ+5	K
123	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	15	Pon 7.4.14	Tor 22.4.14	122	K;IZ;DNUP;IN;P
124	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Sob 12.4.14	Tor 22.4.14	123ZZ	IZ;K
125	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**58 dnevi**	**Čet 17.4.14**	**Tor 8.7.14**		
126	Priprava gradiva za vlado	10	Čet 17.4.14	Ned 27.4.14	124ZZ+5	K
127	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Ned 27.4.14	Sre 30.4.14	126	K;IN
128	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Tor 22.4.14	Tor 6.5.14	124	lektorji
129	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Tor 6.5.14	Tor 20.5.14	127;128;110	P;K;MF;SVZ
130	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Tor 20.5.14	Pet 30.5.14	129	K
131	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Pet 30.5.14	Sob 31.5.14	130	vlada
132	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Sob 31.5.14	Tor 10.6.14	131	vlada
133	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Tor 10.6.14	Tor 24.6.14	132	vlada
134	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Tor 24.6.14	Tor 8.7.14	133	
135	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3	Tor 10.6.14	Pet 13.6.14	132	vlada;K
136	Izdelava povzetka za javnost	5	Tor 10.6.14	Ned 15.6.14	132	IZ
137	Izdelava končnih elaboratov DPN	20	Tor 10.6.14	Pon 30.6.14	132;133KZ-14 dnevi;135ZZ+7	IZ
138	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5	Pon 30.6.14	Sob 5.7.14	137	K



Ureditev izvennivojskega prehoda RAKEK

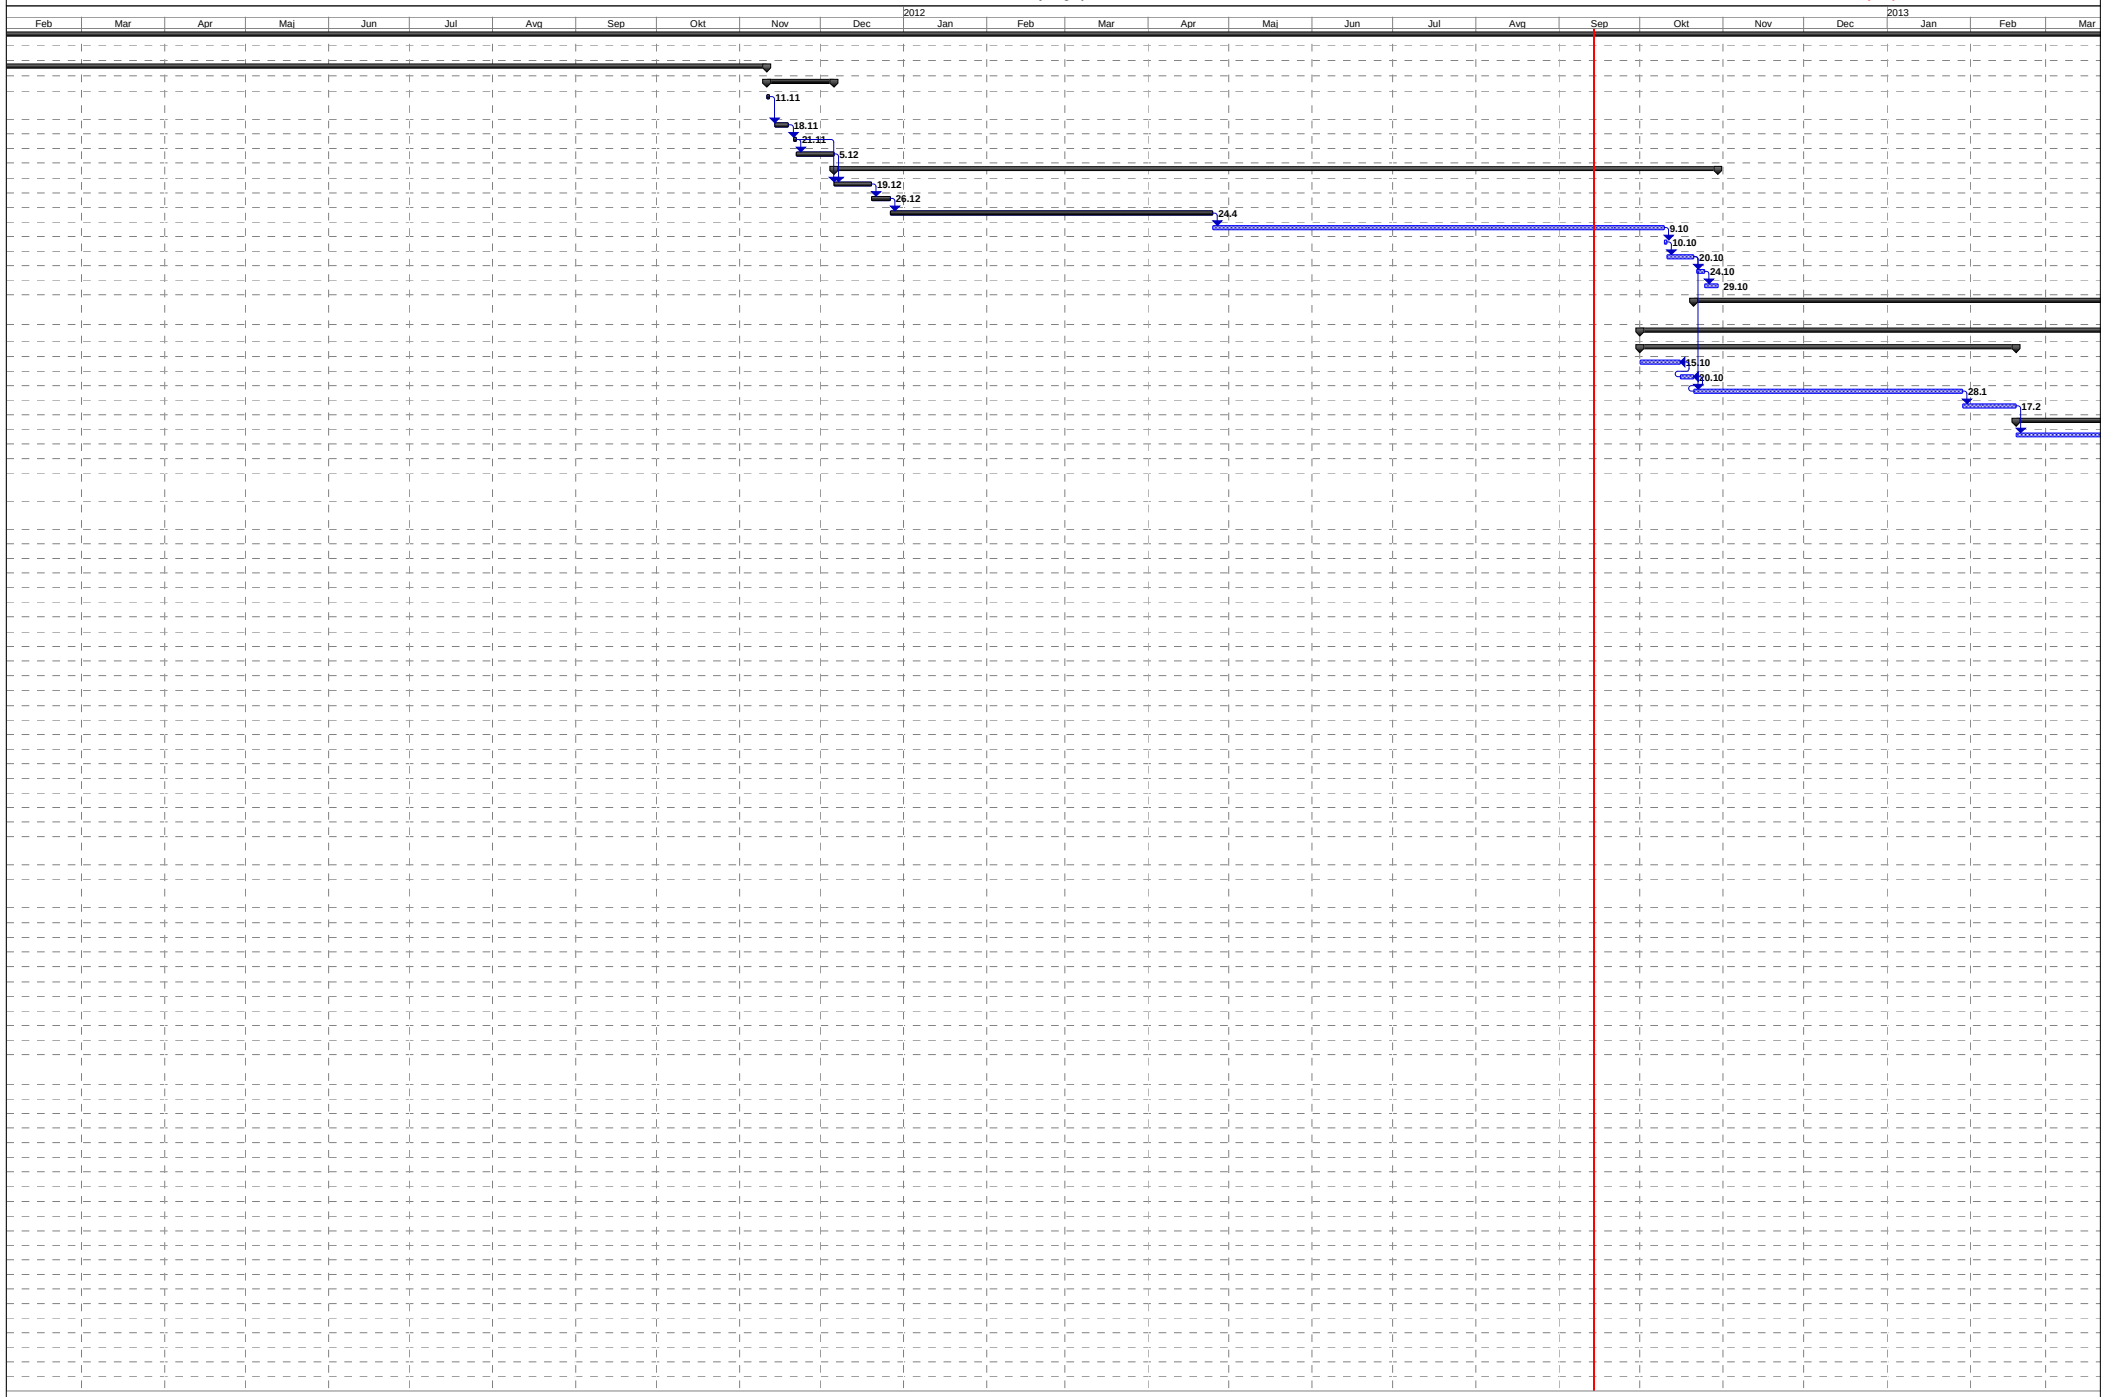
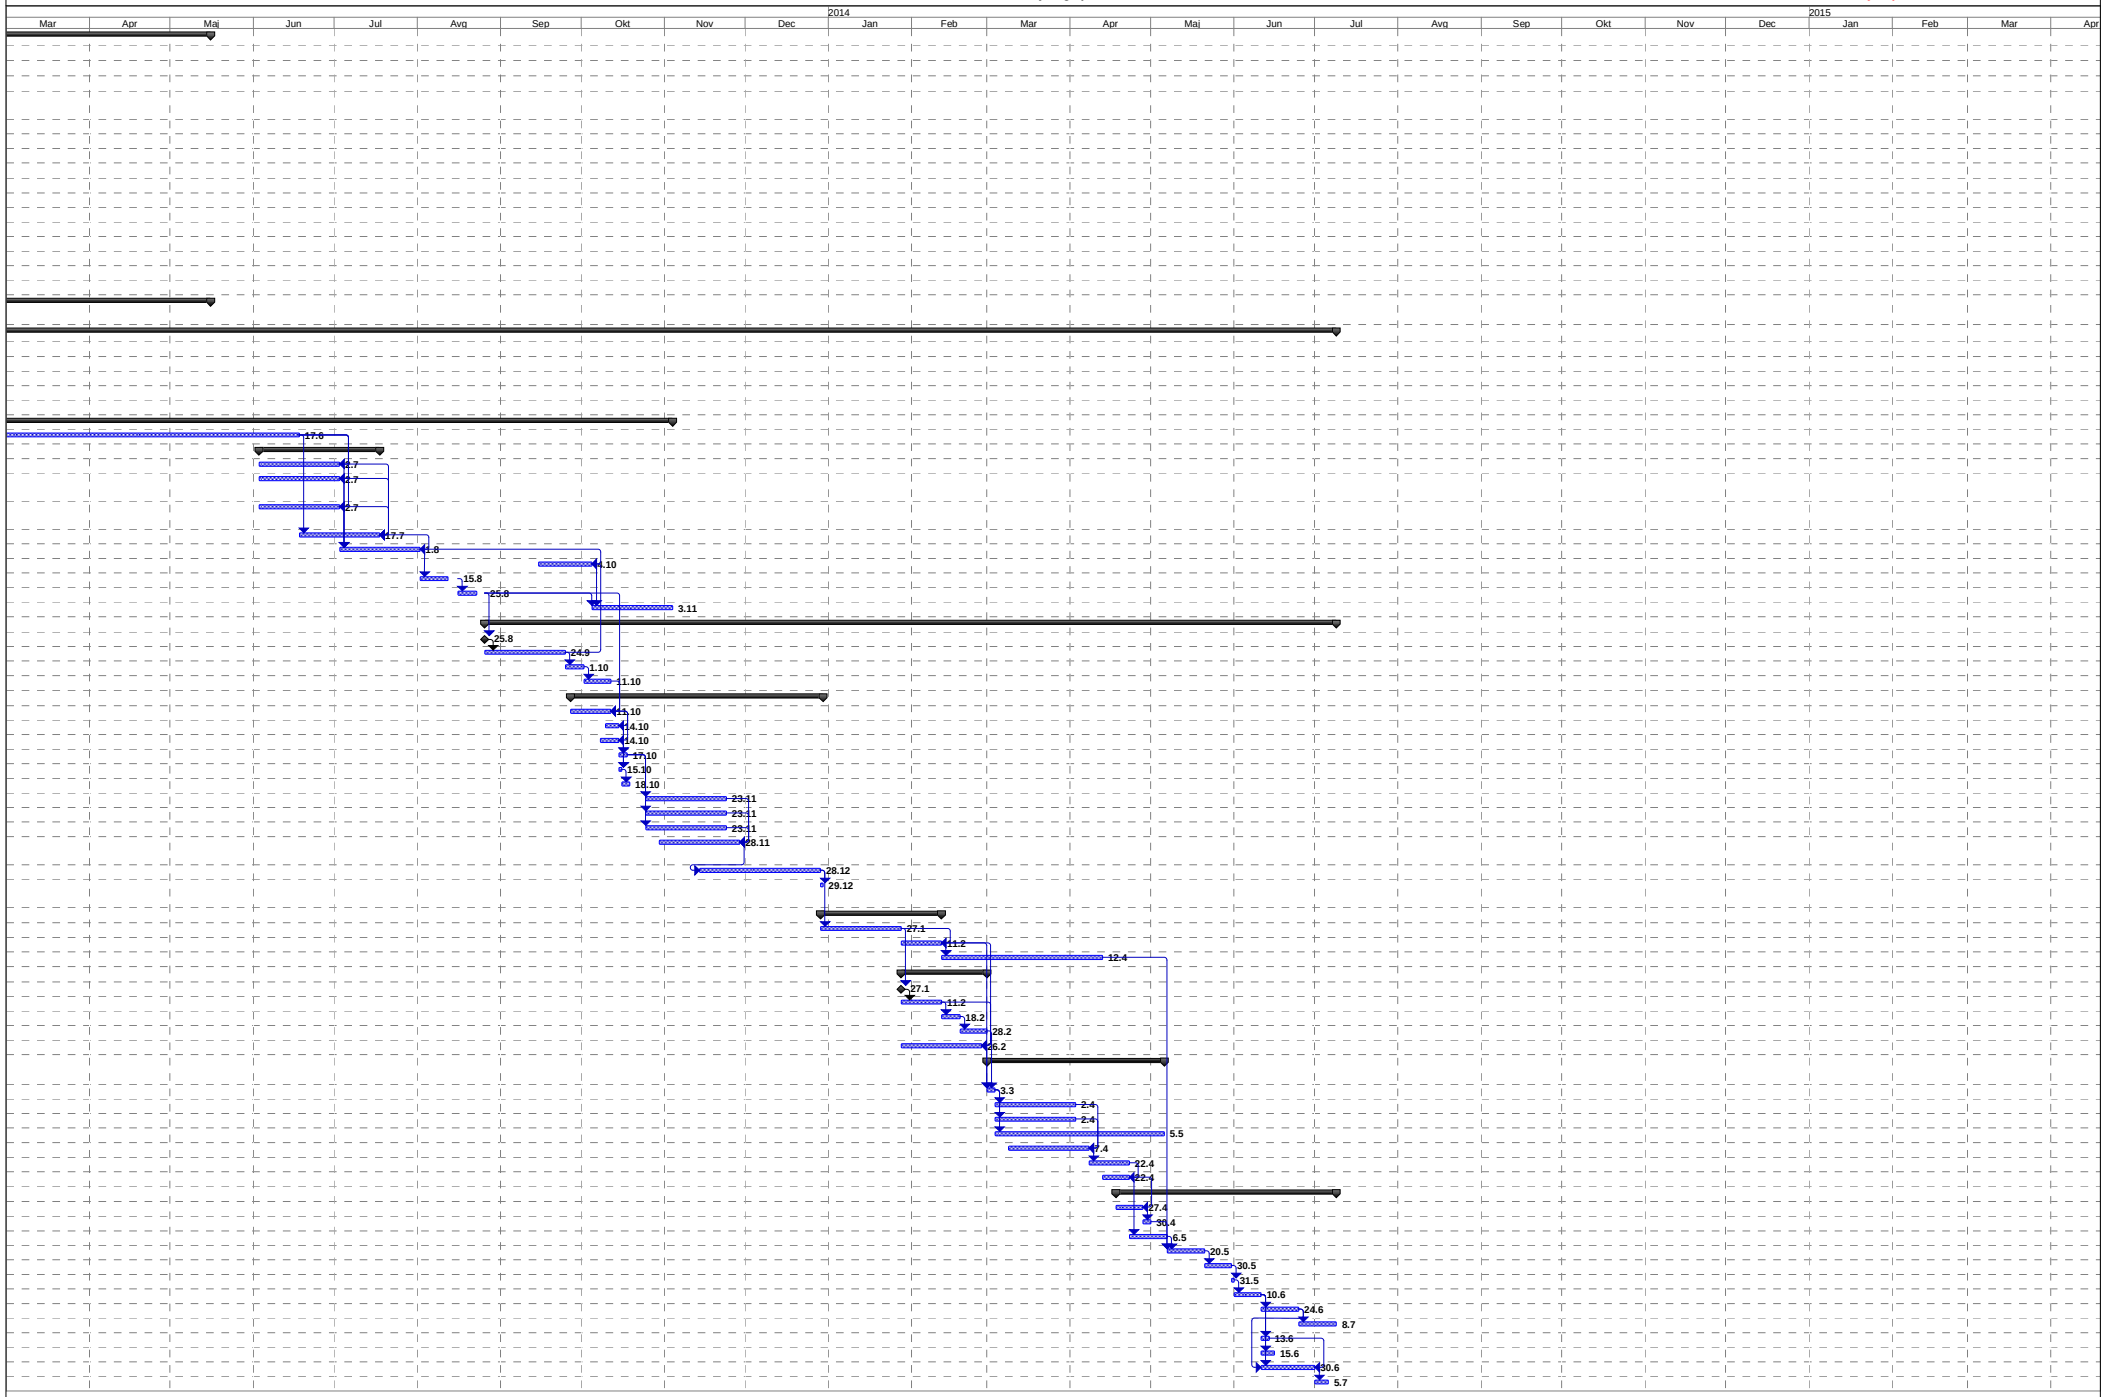
Ureditev izvennivojskega prehoda RAKEK
