TERMINSKI PLAN za Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
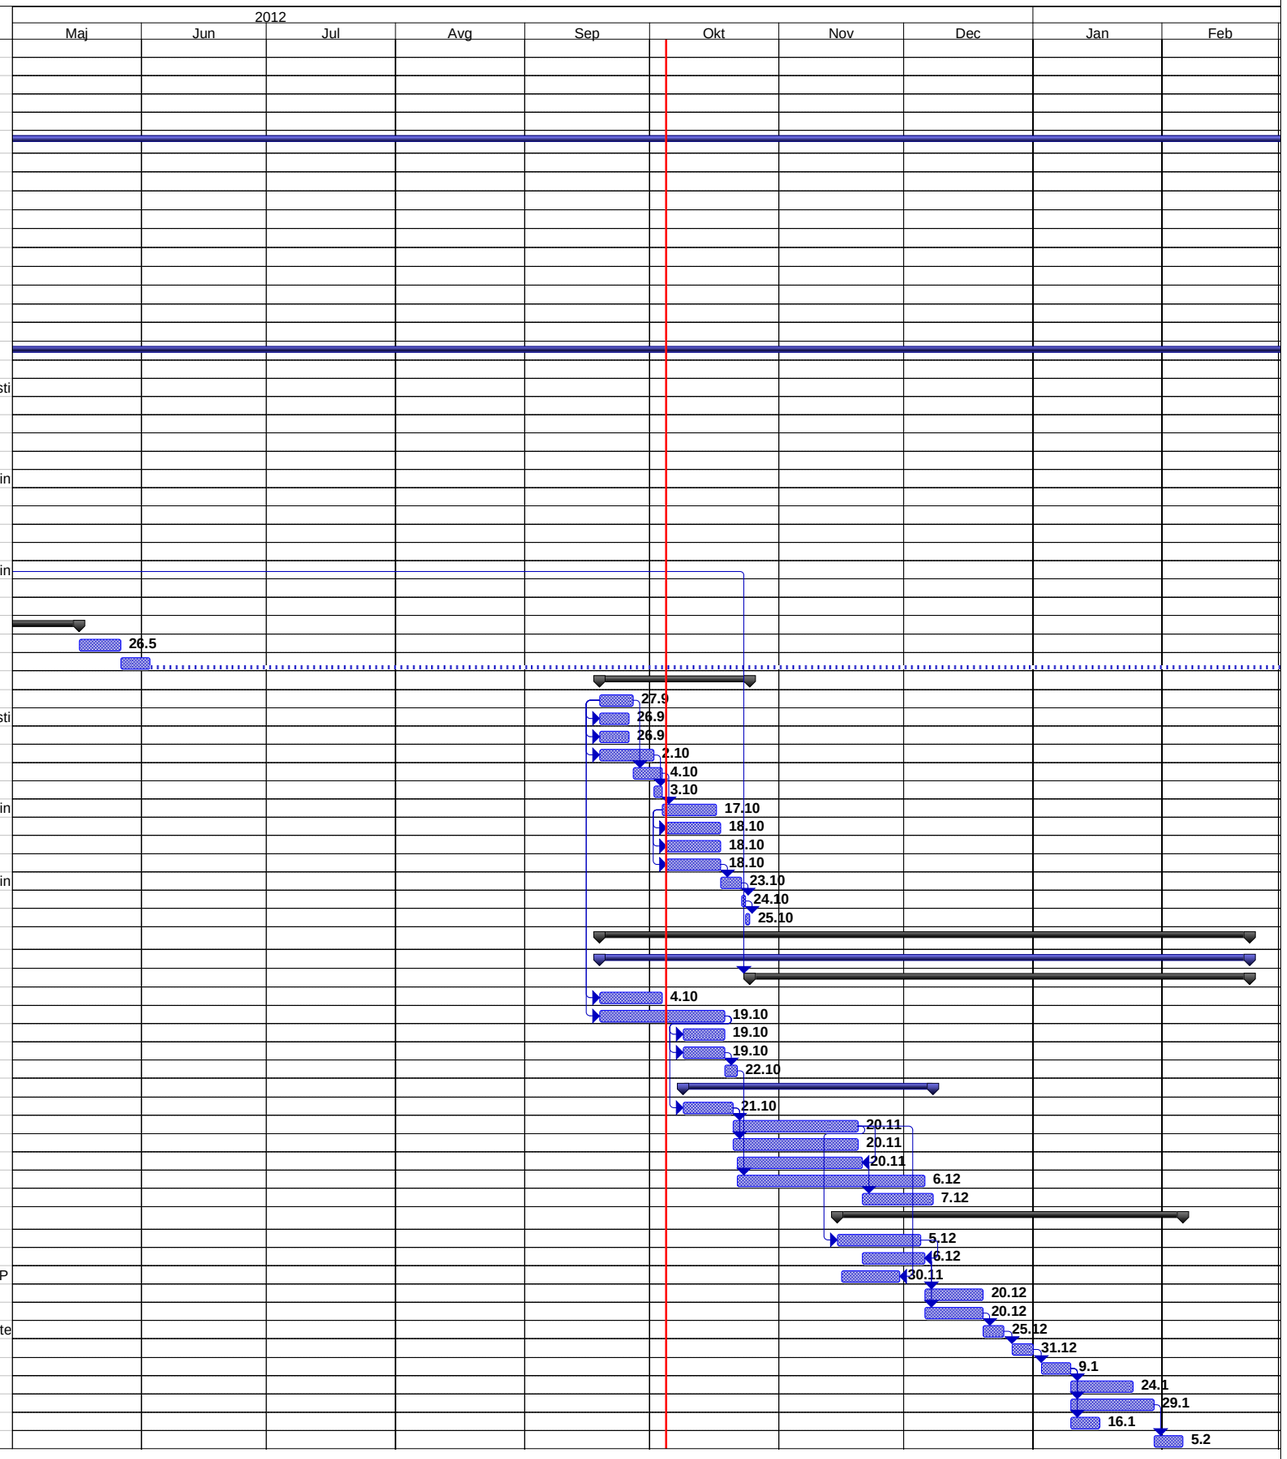
ID	Faza postopka priprave DLN	Trajanje dni	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Nosilec
1	Pobuda ministra za promet	1 pd	Tor 12.10.04	Sre 13.10.04		
2	Odločba o CPVO	53,33 pd	Pon 16.1.06	Pet 10.3.06		
3	Program priprave	88,33 pd	Pon 13.2.06	Pet 12.5.06		
4	Pridobitev smernic	116,33 pd	Pon 24.4.06	Pet 18.8.06		
5	Pridobitev dopolnitev smernic	51,33 pd	Pon 11.12.06	Sre 31.1.07		
6	**DOPOLNITEV OSNUTKA DPN**	**1836,25 d**	**Čet 30.11.06**	**Pon 17.3.14**		
7	**PRIDOBITEV STROKOVNIH REŠITEV PROSTORSKIH UREDITEV (s primerjavo va**	**187 d**	**Čet 30.11.06**	**Pet 31.8.07**		
14	**UVELJAVITEV ZPNačrt**	**1 d**	**Tor 24.4.07**	**Tor 24.4.07**		
15	**Nadaljevanje postopka**	**357 d**	**Pon 9.4.07**	**Čet 11.9.08**		
29	**DOPOLNITEV SMERNIC IN PODATKOV NUP**	**145 d**	**Pon 1.9.08**	**Pon 30.3.09**		
33	**IZBOR IZDELOVALCEV STROKOVNIH PODLAG**	**272,88 d**	**Pon 16.6.08**	**Sre 15.7.09**		
63	**PREDHODNA FAZA (OPTIMIZACIJE,…)**	**106 d**	**Pet 12.6.09**	**Tor 10.11.09**		
68	**Izdelava IdP**	**234 d**	**Tor 10.11.09**	**Ned 10.10.10**		
72	**Izdelava dopolnitev OP**	**128 d**	**Čet 22.7.10**	**Tor 18.1.11**		
78	**Priprava usmeritev projektantu (spPVO)**	**240 pd**	**Tor 10.11.09**	**Čet 8.7.10**	**67**	**investitor**
79	**IZDELAVA OSNUTKA DPN (oDPN)**	**151 d**	**Pet 23.7.10**	**Sre 23.2.11**		
88	**JAVNA RAZGRNITEV in JAVNE OBRAVNAVE**	**772,25 d**	**Čet 17.2.11**	**Pon 17.3.14**		
89	Organizacija javne razgrnitve (JR) in obravnav (JO)	15 pd	Čet 17.2.11	Pet 4.3.11	86KZ-5 d	MOP DP
90	Priprava in uskladitev javnega naznanila JR in JO	5 pd	Sre 2.3.11	Pon 7.3.11	86KZ+5 d	MOP DP, MzP, investi
91	Izdelava povzetka za javnost	5 pd	Sre 2.3.11	Pon 7.3.11	90SS	investitor
92	Izdelava gradiva za javno razgrnitev in javne obravnave	8 pd	Sre 23.2.11	Čet 3.3.11	86	investitor
93	Objava javnega naznanila	7 pd	Čet 3.3.11	Čet 10.3.11	92	MOP DP
94	Posredovanje oDPN občinam za JR in za pripravo njihovega stališča	4 d	Pet 4.3.11	Sre 9.3.11	92	MOP DP
95	JR in JO oDPN, strokovnih podlag (SP), variante ter OP	36 pd	Čet 10.3.11	Pet 15.4.11	93	MOP DP, pobudnik, in
96	Pripombe in predlogi javnosti	30 pd	Ned 20.3.11	Tor 19.4.11	93KZ+10 pd	javnost
97	Pripombe in predlogi občin	30 pd	Čet 17.3.11	Sob 16.4.11	93KZ+7 pd	občine
98	Posredovanje pripomb in predlogov izdelovalcu DPN	20 pd	Sre 6.4.11	Tor 26.4.11	96KZ-10 d	MOP DP
99	Priprava povzetka pridobljenih pripomb in predlogov	14 pd	Tor 26.4.11	Tor 10.5.11	98	investitor
100	Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti in občin k oDPN, SP ter OP	300 pd	Tor 10.5.11	Pon 5.3.12	99	MOP DP, pobudnik, in
101	Elaboriranje končne verzije stališč do pripomb in predlogov	14 pd	Pon 5.3.12	Pon 19.3.12	100	investitor
102	Posredovanje stališč občinam in objava na internetu	5 d	Pon 19.3.12	Pet 23.3.12	101	MOP DP
103	**Dopolnitev SP po JR**	**35 d**	**Pet 23.3.12**	**Sre 16.5.12**		**investitor**
105	Dopolnitev OP zaradi dopolnitev SP po JR	10 pd	Sre 16.5.12	Sob 26.5.12	104	investitor
106	Izdelava doposnutka DPN (doposnDPN), zaključek analize smernic	659,71 pd	Sob 26.5.12	Pon 17.3.14	104KZ+10 pd	investitor
107	**PONOVNA JAVNA SEZNANITEV IN JAVNE OBRAVNAVE**	**26 d**	**Sre 19.9.12**	**Čet 25.10.12**		
108	Organizacija javne razgrnitve (JR) in obravnav (JO)	8 pd	Sre 19.9.12	Čet 27.9.12		MOP DP
109	Priprava in uskladitev javnega naznanila JR in JO	7 pd	Sre 19.9.12	Sre 26.9.12	108SS	MOP DP, MzP, investi
110	Izdelava povzetka za javnost	7 pd	Sre 19.9.12	Sre 26.9.12	108SS	investitor
111	Izdelava gradiva za javno razgrnitev in javne obravnave	13 pd	Sre 19.9.12	Tor 2.10.12	108SS	investitor
112	Objava javnega naznanila	7 pd	Čet 27.9.12	Čet 4.10.12	108	MOP DP
113	Posredovanje oDPN občinam za JR in za pripravo njihovega stališča	2 d	Tor 2.10.12	Sre 3.10.12	111	MOP DP
114	JR in JO oDPN, strokovnih podlag (SP), variante ter OP	13 pd	Čet 4.10.12	Sre 17.10.12	112	MOP DP, pobudnik, in
115	Pripombe in predlogi javnosti	13 pd	Pet 5.10.12	Čet 18.10.12	114SS+1 pd	javnost
116	Pripombe in predlogi občin	13 pd	Pet 5.10.12	Čet 18.10.12	114SS+1 pd	občine
117	Posredovanje pripomb in predlogov izdelovalcu DPN	13 pd	Pet 5.10.12	Čet 18.10.12	114SS+1 pd	MOP DP
118	Priprava odgovorov do pripomb in predlogov javnosti in občin	5 pd	Čet 18.10.12	Tor 23.10.12	117	MOP DP, pobudnik, in
119	Elaboriranje končne verzije odgovorov do pripomb in predlogov	1 pd	Tor 23.10.12	Sre 24.10.12	118	investitor
120	Posredovanje odgovorov občinam in objava na internetu	1 pd	Sre 24.10.12	Čet 25.10.12	119	
121	**PREDLOG DPN**	**105 d**	**Sre 19.9.12**	**Pet 22.2.13**		
122	**IZDELAVA PREDLOGA DPN (pDPN)**	**105 d**	**Sre 19.9.12**	**Pet 22.2.13**		
123	**Dopolnitev SP po JR**	**79 d**	**Čet 25.10.12**	**Pet 22.2.13**	**100**	**investitor**
127	Dopolnitev OP zaradi dopolnitev SP po JR	15 pd	Sre 19.9.12	Čet 4.10.12	108SS	investitor
128	Izdelava predloga DPN (pDPN), zaključek analize smernic	30 pd	Sre 19.9.12	Pet 19.10.12	108SS	investitor
129	Uskladitev pDPN - vsebinsko, s pobudnikom	10 pd	Tor 9.10.12	Pet 19.10.12	28KZ-10 pd	MOP DP, MzP
130	Recenzija/pregled pDPN	10 pd	Tor 9.10.12	Pet 19.10.12	28KZ-10 pd	MOP DP
131	Dopolnitev po recenziji/pregledu DPN	3 pd	Pet 19.10.12	Pon 22.10.12	130	investitor
132	**MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA**	**42 d**	**Tor 9.10.12**	**Pet 7.12.12**		
133	Priprava gradiva za pridobitev mnenj NUP	12 pd	Tor 9.10.12	Ned 21.10.12	28KZ-10 pd	
134	Pridobitev mnenj NUP in projektnih pogojev	30 pd	Ned 21.10.12	Tor 20.11.12	133	MOP DP
135	Peidobitev mnenj o sprejemljivosti vplivovo DPN varstvenih resorjev	30 pd	Ned 21.10.12	Tor 20.11.12	133	VM
136	Posredovanje mnenj NUP investitorju	30 pd	Ned 21.10.12	Tor 20.11.12	134ZZ+1 d	MOP DO
137	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti izvedbe plana	45 pd	Pon 22.10.12	Čet 6.12.12	131	MOP DP
138	Popravki OP po uskladitvi predloga DPN	17 pd	Tor 20.11.12	Pet 7.12.12	136	
139	**SPREJEM DPN**	**55 d**	**Čet 15.11.12**	**Tor 5.2.13**		
140	Priprava gradiva za Vlado RS	20 pd	Čet 15.11.12	Sre 5.12.12	134KZ-3 d	MOP DP
141	Uskladitev gradiva - vsebinsko, s pobudnikom in investitorjem	15 pd	Sre 21.11.12	Čet 6.12.12	140ZZ+1 pd	MOP DP, MzP
142	Lektoriranje gradiva	14 pd	Pet 16.11.12	Pet 30.11.12	134ZZ+10 pd	lektorska služba;MOP
143	Uskladitevz MF	14 pd	Čet 6.12.12	Čet 20.12.12	141	MF;MOP DP
144	Uskladitev gradiva s SVZ	14 pd	Čet 6.12.12	Čet 20.12.12	141	SVZ;MOP DP
145	Posredovanje pDPN s stališči do pripomb javnosti in občin v sprejem Vladi RS	5 pd	Čet 20.12.12	Tor 25.12.12	144	MOP DP;MOP ministe
146	**Sprejem Uredbe o DPN***	**3 d**	**Čet 27.12.12**	**Pon 31.12.12**	**145**	**Vlada RS**
147	Objava Uredbe o DPN v Uradnem listu RS	5 d	Čet 3.1.13	Sre 9.1.13	146	Vlada RS
148	Pravnomočnost Uredbe o DPN	15 pd	Sre 9.1.13	Čet 24.1.13	147	
149	Izdelava končnih elaboratov DPN	20 pd	Sre 9.1.13	Tor 29.1.13	147	investitor
150	Izdelava povzetka za javnost	5 d	Čet 10.1.13	Sre 16.1.13	147	investitor
151	Posredovanje končnih elaboratov DLN občinam, UE, …	5 d	Sre 30.1.13	Tor 5.2.13	149	MOP DP
