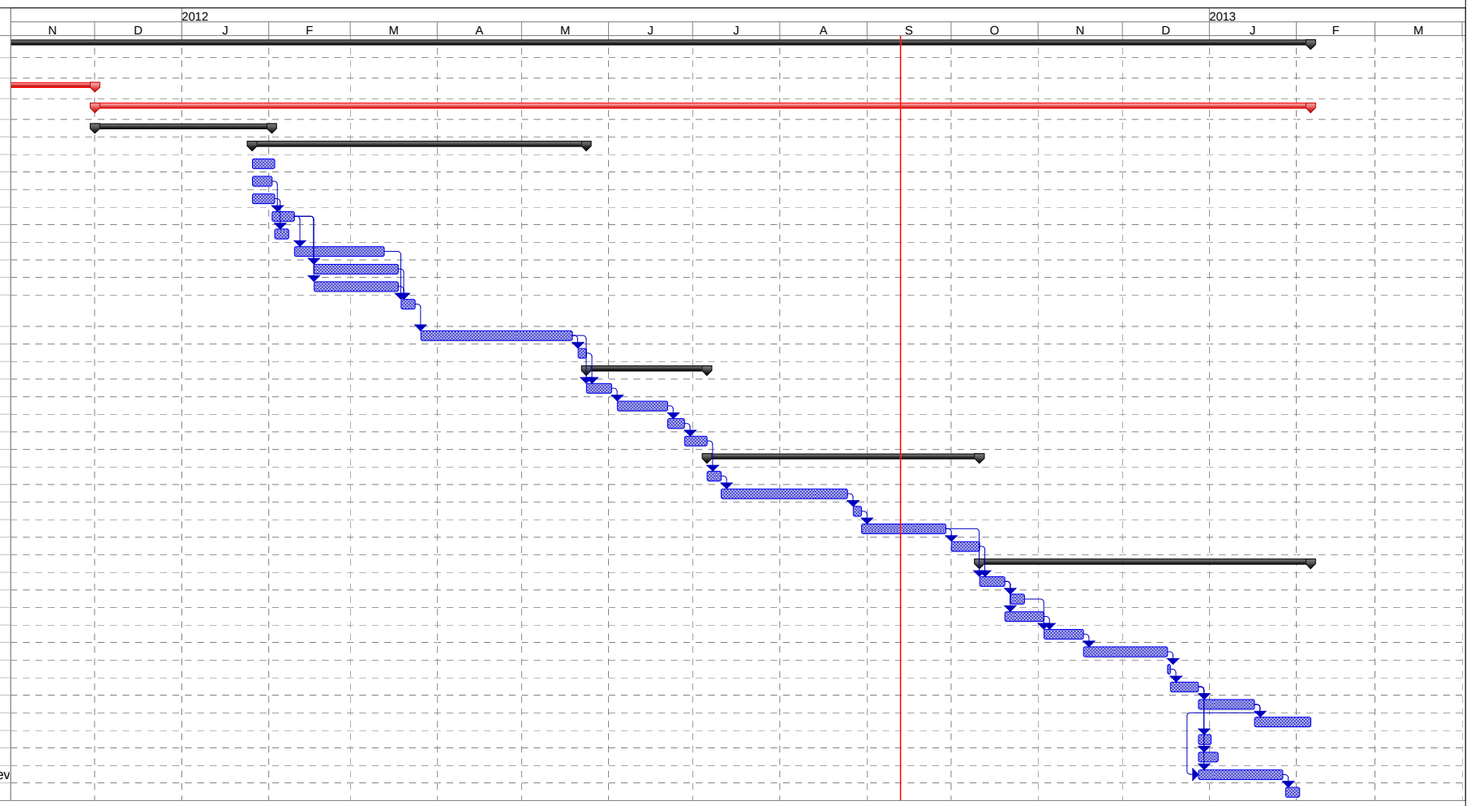ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila
1	**POSTOPEK DPN ZA DV 2 x 110 kV BRESTANICA - HUDO**	**705 dnevi**	**Čet 27.5.10**	**Tor 5.2.13**	
2	**POBUDA**	**368 dnevi**	**Čet 27.5.10**	**Pet 21.10.11**	
23	**ŠTUDIJA VARIANT**	**28 dnevi**	**Pet 21.10.11**	**Sre 30.11.11**	
31	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**309 dnevi**	**Čet 1.12.11**	**Tor 5.2.13**	
32	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**45 dnevi**	**Čet 1.12.11**	**Sre 1.2.12**	
37	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + MNENJE OBČIN**	**85 dnevi**	**Čet 26.1.12**	**Sre 23.5.12**	
38	Organizacija JR in JO	6 dnevi	Čet 26.1.12	Čet 2.2.12	34
39	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5 dnevi	Čet 26.1.12	Sre 1.2.12	34
40	Izdelava povzetka za javnost	6 dnevi	Čet 26.1.12	Čet 2.2.12	34
41	Objava javnega naznanila	6 dnevi	Čet 2.2.12	Čet 9.2.12	39
42	Posredovanje osnutka DPN občinam	3 dnevi	Pet 3.2.12	Tor 7.2.12	40
43	JR in JO	32	Čet 9.2.12	Pon 12.3.12	41
44	Pripombe in predlogi javnosti	30	Čet 16.2.12	Sob 17.3.12	41KZ+7
45	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Čet 16.2.12	Sob 17.3.12	41KZ+7
46	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalcu	5 dnevi	Pon 19.3.12	Pet 23.3.12	45;43;44
47	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	40 dnevi	Pon 26.3.12	Pet 18.5.12	46
48	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	3 dnevi	Pon 21.5.12	Sre 23.5.12	47
49	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**31 dnevi**	**Čet 24.5.12**	**Čet 5.7.12**	
50	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	7 dnevi	Čet 24.5.12	Pet 1.6.12	48;47
51	Izdelava predloga DPN	14 dnevi	Pon 4.6.12	Čet 21.6.12	50
52	Pregled (recenzija) predloga DPN	4 dnevi	Pet 22.6.12	Sre 27.6.12	51
53	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	6 dnevi	Čet 28.6.12	Čet 5.7.12	52
54	**PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP**	**69 dnevi**	**Pet 6.7.12**	**Sre 10.10.12**	
55	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Pet 6.7.12	Tor 10.7.12	53
56	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	45	Tor 10.7.12	Pet 24.8.12	55
57	Posredovanje mnenj NUP investitorju	3 dnevi	Pon 27.8.12	Sre 29.8.12	56
58	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	30	Sre 29.8.12	Pet 28.9.12	57
59	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	8 dnevi	Pon 1.10.12	Sre 10.10.12	58
60	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**84 dnevi**	**Čet 11.10.12**	**Tor 5.2.13**	
61	Priprava gradiva za vlado	7 dnevi	Čet 11.10.12	Pet 19.10.12	59;58
62	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Pon 22.10.12	Pet 26.10.12	61
63	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 19.10.12	Pet 2.11.12	61
64	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 2.11.12	Pet 16.11.12	62;63
65	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	30	Pet 16.11.12	Ned 16.12.12	64
66	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 17.12.12	Pon 17.12.12	65
67	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Pon 17.12.12	Čet 27.12.12	66
68	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Pet 28.12.12	Sre 16.1.13	67
69	Uveljavitev uredbe o DPN	14 dnevi	Čet 17.1.13	Tor 5.2.13	68
70	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	2,5 dnevi	Pet 28.12.12	Tor 1.1.13	67
71	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Pet 28.12.12	Čet 3.1.13	67
72	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Pet 28.12.12	Ned 27.1.13	68KZ-14 dnev
73	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5 dnevi	Pon 28.1.13	Pet 1.2.13	72
