3_TP DPN za HE Mokrice september 2012
po drugem negativnem mnenju o ustreznosti okoljskega poročila

Date: Sre 12.9.12

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
1	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**174 dnevi**	**Pet 17.8.12**	**Sre 17.4.13**		
2	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**25 dnevi**	**Pet 17.8.12**	**Čet 20.9.12**		
3	3 Dopolnitev OP	17 dnevi	Pet 17.8.12	Pon 10.9.12		IZ
4	Izdelava osnutka DPN	1 dan	Tor 11.9.12	Tor 11.9.12	3	IZ
5	posredovanje vloge za usterznost OP	1 dan	Sre 12.9.12	Sre 12.9.12	4	
6	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	6 dnevi	Čet 13.9.12	Čet 20.9.12	5	SCPVO
7	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN**	**68 dnevi**	**Pet 31.8.12**	**Tor 4.12.12**		
8	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Pet 31.8.12	Čet 20.9.12	6ZZ	K;občine
9	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	10 dnevi	Pet 7.9.12	Čet 20.9.12	8ZZ	K;IN
10	Izdelava povzetka za javnost	15 dnevi	Pet 31.8.12	Čet 20.9.12	8ZZ	IZ
11	Objava javnega naznanila	5 dnevi	Pet 14.9.12	Čet 20.9.12	8ZZ	K;izbran mec
12	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	3 dnevi	Pet 21.9.12	Tor 25.9.12	9	K
13	JR in JO (v Sloveniji in na Hrvaškem**)	30	Čet 27.9.12	Sob 27.10.12	11KZ+7	K+MKO SPV
14	Pripombe in predlogi javnosti	30	Čet 27.9.12	Sob 27.10.12	11KZ+7	javnost
15	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Čet 27.9.12	Sob 27.10.12	11KZ+7	LNUP
16	Pripombe RH (rok dogovori MKO SCPVO v postopku priprave čezmejnih vplivov	30	Čet 27.9.12	Sob 27.10.12	11KZ+7	R Hrvaška
17	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalcu ter Sektorju za CPVO	2 dnevi	Pon 29.10.12	Tor 30.10.12	13;14;16	K
18	Priprava, uskladitev in podpis stališč (v Sloveniji in s strani RH)	30	Tor 30.10.12	Čet 29.11.12	17	K;IZ;IN;P+MH SCPVO
19	Objava stališč na spletu in posredovanje občinam ter RH	3 dnevi	Pet 30.11.12	Tor 4.12.12	18	K
20	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**15 dnevi**	**Sre 5.12.12**	**Tor 25.12.12**		
21	Izdelava predloga DPN	15 dnevi	Sre 5.12.12	Tor 25.12.12	19	IZ
22	Preveritev/dopolnitev OP	15 dnevi	Sre 5.12.12	Tor 25.12.12	21ZZ	SPVO
23	**PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV**	**38 dnevi**	**Sre 5.12.12**	**Ned 27.1.13**		
24	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Sre 26.12.12	Pet 28.12.12	22	K
25	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	20	Pet 28.12.12	Čet 17.1.13	24	DNUP
26	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pet 28.12.12	Ned 27.1.13	24	DNUP
27	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti (vključuje zaključek postopka čezmejnih vplivov z RH)	30	Pet 28.12.12	Ned 27.1.13	24	SCPVO
28	Priprava čistopisov prekritih DPN	30 dnevi	Sre 5.12.12	Tor 15.1.13	19	IZ
29	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5 dnevi	Pon 21.1.13	Ned 27.1.13	27ZZ	K
30	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**78 dnevi**	**Pet 28.12.12**	**Sre 17.4.13**		
31	Priprava gradiva za vlado	11 dnevi	Čet 24.1.13	Čet 7.2.13	27KZ-2 dnevi	K
32	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	4 dnevi	Tor 5.2.13	Pet 8.2.13	31KZ-3 dnevi	K;IN
33	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 28.12.12	Pet 11.1.13	24	lektorji
34	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 8.2.13	Pet 22.2.13	32;33	P;K;MF;SVZ
35	Podpis gradiva za Vlado	1 dan	Pon 25.2.13	Pon 25.2.13	34	K
36	Odbor Vlade RS za GTR	3 dnevi	Tor 26.2.13	Čet 28.2.13	35	vlada
37	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	9	Čet 28.2.13	Sob 9.3.13	36	vlada
38	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Pon 11.3.13	Čet 28.3.13	37	vlada
39	Uveljavitev uredbe o DPN	14 dnevi	Pet 29.3.13	Sre 17.4.13	38	
40	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	2,5 dnevi	Pon 11.3.13	Sre 13.3.13	37	vlada;K
41	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Pon 11.3.13	Pet 15.3.13	37	IZ
42	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Pon 11.3.13	Sre 10.4.13	38KZ-14 dnevi;	IZ
43	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5 dnevi	Sre 10.4.13	Tor 16.4.13	42	K

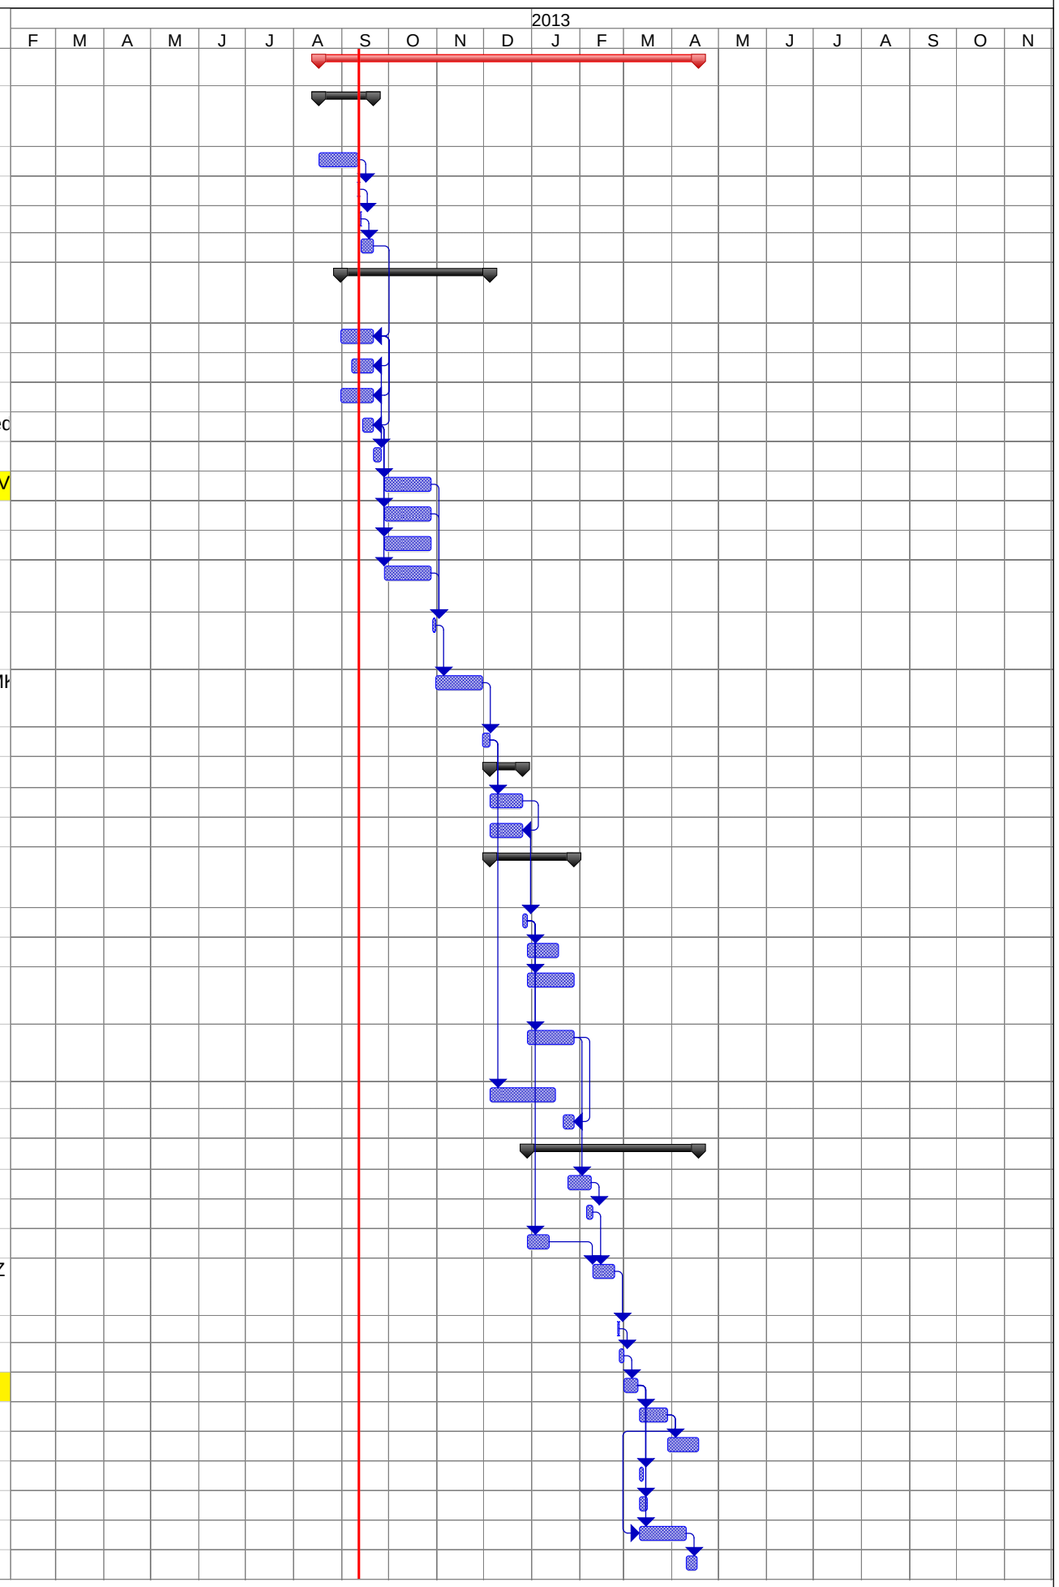

brez kakršnih koli popravkov, predstavitev lok skupnosti izven JR, sočasnosti trajanja in dokončanja postopka čezmejnih vplivov, prekrivanje aktivnosti in skrajšani roki za mnenja v fazi predloga
