TERMINSKI PLAN priprave spr. in dop. DLN za II. tir železniške proge Divača-Koper
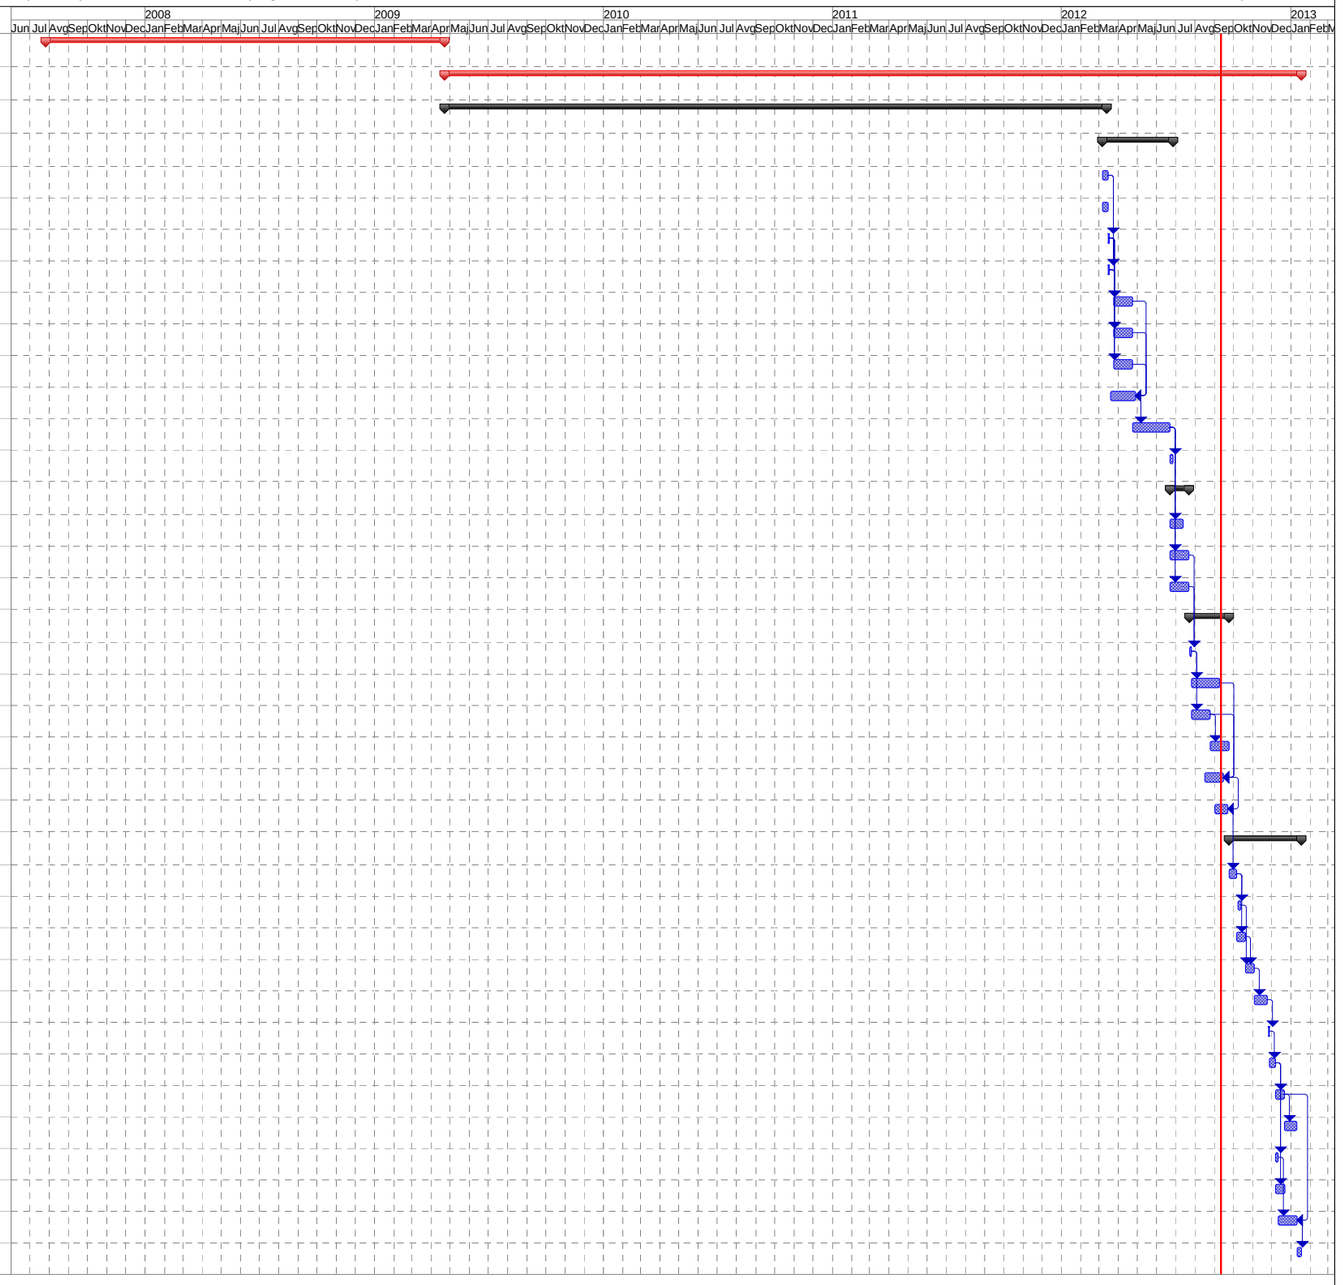
ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
1	**POBUDA**	**454 dnevi**	**Čet 26.7.07**	**Tor 21.4.09**		
15	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**977,5 dnevi**	**Tor 21.4.09**	**Čet 17.1.13**		
16	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**755 dnevi**	**Tor 21.4.09**	**Pon 12.3.12**		
33	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN IN OP + MNENJE OBČIN**	**81 dnevi**	**Tor 6.3.12**	**Tor 26.6.12**		
34	Organizacija JR in JO, priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	7 dnevi	Tor 6.3.12	Sre 14.3.12	31	K;občine
35	Izdelava povzetka za javnost	7 dnevi	Tor 6.3.12	Sre 14.3.12	31	IZ
36	Objava javnega naznanila	2 dnevi	Čet 15.3.12	Pet 16.3.12	34	K;izbran medij
37	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	2 dnevi	Čet 15.3.12	Pet 16.3.12	34	K
38	JR in JO	30	Pet 23.3.12	Ned 22.4.12	36KZ+7 ;3	K
39	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pet 23.3.12	Ned 22.4.12	36KZ+7 ;3	javnost
40	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Pet 23.3.12	Ned 22.4.12	36KZ+7 ;3	LNUP
41	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalcu ter Sektor	30 dnevi	Pon 19.3.12	Pet 27.4.12	40ZZ+5 dr	K
42	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Pon 23.4.12	Pet 22.6.12	41KZ-5 dn	K;IZ;IN;P
43	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	3 dnevi	Pet 22.6.12	Tor 26.6.12	42	K
44	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**21 dnevi**	**Pet 22.6.12**	**Ned 22.7.12**		
45	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	21	Pet 22.6.12	Pet 13.7.12	42	IZ
46	Izdelava predloga DPN	30	Pet 22.6.12	Ned 22.7.12	42	IZ
47	Preveritev / Dopolnitev OP	30	Pet 22.6.12	Ned 22.7.12	42	IZ
48	**PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV**	**45 dnevi**	**Pon 23.7.12**	**Ned 23.9.12**		
49	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Pon 23.7.12	Sre 25.7.12	46;47	K
50	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	45	Sre 25.7.12	Sob 8.9.12	49	DNUP
51	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Sre 25.7.12	Pet 24.8.12	49	DNUP
52	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	30	Pet 24.8.12	Ned 23.9.12	51	SPVO
53	Posredovanje mnenj NUP investitorju	30	Sre 15.8.12	Pet 14.9.12	50ZZ+5 dr	K
54	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	21	Pet 31.8.12	Pet 21.9.12	53ZZ+5 dr	K;IZ;DNUP;IN;P
55	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**83,5 dnevi**	**Pon 24.9.12**	**Čet 17.1.13**		
56	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Pon 24.9.12	Pet 5.10.12	54	K
57	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Pon 8.10.12	Pet 12.10.12	56	K;IN
58	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 5.10.12	Pet 19.10.12	56	lektorji
59	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 19.10.12	Pet 2.11.12	57;58	P;K;MF;SVZ
60	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	21	Pet 2.11.12	Pet 23.11.12	59	K
61	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 26.11.12	Pon 26.11.12	60	vlada
62	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Pon 26.11.12	Čet 6.12.12	61	vlada
63	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Čet 6.12.12	Čet 20.12.12	62	vlada
64	Uveljavitev uredbe o DPN	14 dnevi	Pet 21.12.12	Sre 9.1.13	63	
65	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	2,5 dnevi	Pet 7.12.12	Tor 11.12.12	62	vlada;K
66	Izdelava povzetka za javnost	15	Čet 6.12.12	Pet 21.12.12	62	IZ
67	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Tor 11.12.12	Čet 10.1.13	63ZZ;65	IZ
68	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5 dnevi	Čet 10.1.13	Čet 17.1.13	67	K
