ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Preštirja opravila
1	**POBUDA**	**401 dnevi**	**Čet 17.11.11**	**Čet 30.5.13**	
2	**USKLADITEV POBUDE**	**80 dnevi**	**Čet 17.11.11**	**Sre 7.3.12**	
3	Prejem osnutka pobude in pregled ter posredovanje pripomb k pobudi	27 dnevi	Čet 17.11.11	Pet 23.12.11	
4	Priprava in posredovanje mnenja na pobudo	5 dnevi	Čet 29.12.11	Sre 4.1.12	3
5	Predstavitev pobude občini Črnomelj in Kočevje	1 dan	Pon 30.1.12	Pon 30.1.12	4
6	Objava pobude (in DIIPI) na spletni strani MOP	27 dnevi	Tor 31.1.12	Sre 7.3.12	5
7	**PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI, ODLOČBE O CPVO**	**156 dnevi**	**Sre 1.2.12**	**Sre 5.9.12**	
8	Posredovanje vseh vlog	1 dan	Sre 1.2.12	Sre 1.2.12	4
9	Pridobitev odločbe o CPVO (27.3.2012)	42	Tor 14.2.12	Tor 27.3.12	8KZ+1 dan
10	Pridobitev mnenj javnosti	30	Čet 2.2.12	Sob 3.3.12	8KZ+1 dan
11	Pridobitev smernic, usmeritev, podatkov NUP	56	Sre 1.2.12	Sre 28.3.12	
12	Posredovanje smernic pobudniku, investitorju in izdelovalcu	17 dnevi	Tor 6.3.12	Sre 28.3.12	
13	Pregled smernic, usklajevanje z Občino Črnomelj, priprava gradiva za dopolnite	40 dnevi	Čet 29.3.12	Sre 23.5.12	12;11
14	Pridobitev dopolnitev smernic	25 dnevi	Čet 24.5.12	Sre 27.6.12	13
15	Posredovanje dopolnitve smernic pobudniku, investitorju in izdelovalcu	5 dnevi	Čet 28.6.12	Sre 4.7.12	14
16	Vsebinski pregled in analiza smernic	15 dnevi	Čet 5.7.12	Sre 25.7.12	15
17	Izdelava elaborata analize smernic	30	Čet 26.7.12	Sob 25.8.12	16KZ+1 dan
18	Priprava osnutka sklepa o pripravi DPN	4 dnevi	Pon 27.8.12	Čet 30.8.12	17
19	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	4 dnevi	Pet 31.8.12	Sre 5.9.12	18
20	**IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE**	**64 dnevi**	**Pon 6.8.12**	**Čet 1.11.12**	
21	Posredovanje osn. sklepa + elaborata analize smernic članom prostorske konfe	1 dan	Čet 6.9.12	Čet 6.9.12	19
22	Sklic seje prostorske konference	5 dnevi	Pet 7.9.12	Čet 13.9.12	21
23	Izvedba seje prostorske konference	1 dan	Pet 14.9.12	Pet 14.9.12	22
24	Priprava predloga sklepa o pripravi DPN	10 dnevi	Pon 17.9.12	Pet 28.9.12	23
25	Vključevanje javnosti	64 dnevi	Pon 6.8.12	Čet 1.11.12	
26	Priprava gradiva za delavnice po občinah	10 dnevi	Pon 6.8.12	Pet 17.8.12	
27	Organizacija delavnic po občinah	10 dnevi	Pon 20.8.12	Pet 31.8.12	26
28	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila delavnic po občinah	5 dnevi	Pon 13.8.12	Pet 17.8.12	
29	Objava javnega naznanila	15 dnevi	Pon 27.8.12	Pet 14.9.12	
30	Izvedba delavnic	2 dnevi	Sre 19.9.12	Čet 20.9.12	
31	Analiza predlogov javnosti podanih na delavnicah po občinah	15 dnevi	Pet 21.9.12	Čet 11.10.12	30
32	Popravki variant v skladu z analizo in predlogi javnosti na delavnicah	15 dnevi	Pet 12.10.12	Čet 1.11.12	31
33	**SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN**	**65 dnevi**	**Pon 1.10.12**	**Pet 28.12.12**	
34	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Pon 1.10.12	Pet 12.10.12	24
35	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Pon 15.10.12	Pet 19.10.12	34
36	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pon 22.10.12	Pon 5.11.12	35KZ+1 dan
37	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	30	Tor 6.11.12	Čet 6.12.12	36KZ+1 dan
38	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pet 7.12.12	Pet 7.12.12	37
39	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10	Pon 10.12.12	Čet 20.12.12	38KZ+1 dan
40	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3 dnevi	Pet 21.12.12	Tor 25.12.12	39
41	Objava sklepa na spletni strani MOP	3 dnevi	Sre 26.12.12	Pet 28.12.12	40
42	**SPREJEM UREDBE O (PRENEHANJU VELJAVNOSTI) ZAČASNEM UKREPU -**	**115 dnevi**	**Pet 21.12.12**	**Čet 30.5.13**	
43	Izdelava gradiva z osnutkom uredbe o ZUKR	7 dnevi	Pet 21.12.12	Pon 31.12.12	39
44	Prejem gradiva	1 dan	Pet 21.12.12	Pet 21.12.12	39
45	Pregled gradiva, pripombe na gradivo	10 dnevi	Pon 24.12.12	Pet 4.1.13	44
46	Zaključek gradiva	10 dnevi	Pon 7.1.13	Pet 18.1.13	45
47	Priprava osnutka uredbe o ZUKR	10 dnevi	Pon 21.1.13	Pet 1.2.13	46
48	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Pon 4.2.13	Pet 15.2.13	47
49	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Pon 18.2.13	Pet 22.2.13	48
50	Lektoriranje predloga uredbe o ZUKR	14	Pon 25.2.13	Pon 11.3.13	49KZ+1 dan
51	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Tor 12.3.13	Tor 26.3.13	50KZ+1 dan
52	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Sre 27.3.13	Sob 6.4.13	51KZ+1 dan
53	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 8.4.13	Pon 8.4.13	52
54	Seja Vlade RS - sprejem/razveljavitev uredbe o ZUKR	10 dnevi	Tor 9.4.13	Pon 22.4.13	53
55	Objava uredbe o ZUKR v Uradnem listu RS	14 dnevi	Tor 23.4.13	Pet 10.5.13	54
56	Uveljavitev uredbe o ZUKR	14	Pon 13.5.13	Pon 27.5.13	55KZ+1 dan
57	Izdelava končnih elaboratov	5 dnevi	Pon 13.5.13	Pet 17.5.13	55
58	Posredovanje elaboratov UE, občinam,…	5 dnevi	Pon 20.5.13	Pet 24.5.13	57
59	Vpisi/izbris vlož ZK	14 dnevi	Pon 13.5.13	Čet 30.5.13	55
60	**ŠTUDIJA VARIANT**	**518 dnevi**	**Tor 25.12.12**	**Ned 21.12.14**	
61	**IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)**	**263 dnevi**	**Tor 25.12.12**	**Pet 27.12.13**	
62	**IZBOR IZDELOVALCA STROKOVNIH PODLAG, OP in ŠV/PIZ**	**108 dnevi**	**Tor 25.12.12**	**Pet 24.5.13**	
63	Priprava osnutka projektne naloge	15	Tor 25.12.12	Sre 9.1.13	40
64	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	15	Sre 9.1.13	Čet 24.1.13	63
65	Izbor izdelovalca: javna naročila	100	Čet 24.1.13	Sob 4.5.13	64
66	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Sob 4.5.13	Pet 24.5.13	65
67	**IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA ŠV/PIZ**	**90 dnevi**	**Pon 27.5.13**	**Pet 27.9.13**	**62**
68	Izdelava gradbeno-tehnična in ekonomskega elaborata (funkcionalni in ekc	90 dnevi	Pon 27.5.13	Pet 27.9.13	
69	Izdelava razvojno-urbanističnega in okoljskega elaborata (prostorski in varstv	90 dnevi	Pon 27.5.13	Pet 27.9.13	68SS
70	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	18 dnevi	Pon 30.9.13	Sre 23.10.13	68;69
71	Izdelava okoljskega poročila (OP) - zaključek	30 dnevi	Čet 3.10.13	Sre 13.11.13	70KZ-15 dnevi
72	Pregled ŠV/PIZ	10 dnevi	Čet 24.10.13	Sre 6.11.13	70
73	**VKLJUČEVANJE JAVNOSTI**	**10 dnevi**	**Čet 7.11.13**	**Sre 20.11.13**	**72**
74	Predstavitev variant občinam in predstavnikom javnosti	10 dnevi	Čet 7.11.13	Sre 20.11.13	72
75	Zaključek ŠV/PIZ po pregledu	5 dnevi	Čet 21.11.13	Sre 27.11.13	74
76	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Sre 27.11.13	Pet 27.12.13	75
77	**JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV IN OP + 1. MNENJE OBČIN**	**105 dnevi**	**Pet 27.12.13**	**Ned 25.5.14**	
78	Organizacija JR in JO	15	Pet 27.12.13	Sob 11.1.14	76
79	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	11	Sob 11.1.14	Sre 22.1.14	78
80	Zaključek povzetka za javnost	1 dan	Pon 13.1.14	Pon 13.1.14	78
81	Objava javnega naznanila	5	Sre 22.1.14	Pon 27.1.14	79
82	Posredovanje ŠV/PIZ in PNV ter OP občinam	5	Sre 22.1.14	Pon 27.1.14	79
83	JR in JO + 1. mnenje občin	30	Sre 5.2.14	Pet 7.3.14	81KZ+7 dnevi
84	Posredovanje pripomb in predlogov + 1. mnenj pobudniku, investitorju in izdelov	5	Pet 7.3.14	Sre 12.3.14	83
85	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb	60	Sre 12.3.14	Ned 11.5.14	84
86	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Pon 12.5.14	Pon 12.5.14	85
87	Dopolnitev ŠV/PIZ in PNV ter OP	14	Ned 11.5.14	Ned 25.5.14	85
88	**PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI V**	**50 dnevi**	**Ned 25.5.14**	**Pet 1.8.14**	
89	Posredovanje vseh vlog	3	Ned 25.5.14	Sre 28.5.14	87
90	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30	Čet 29.5.14	Sob 28.6.14	89KZ+1 dan
91	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30	Čet 29.5.14	Sob 28.6.14	89KZ+1 dan
92	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV	45	Sre 28.5.14	Sob 12.7.14	89
93	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	3 dnevi	Pon 14.7.14	Sre 16.7.14	90;91;92
94	Uskladitev ŠV/PIZ in PNV z mnenji	10	Sob 12.7.14	Tor 22.7.14	90;91;92
95	Priprava osnutka sklepa o potrditvi PNV	7	Tor 22.7.14	Tor 29.7.14	94
96	Potrditev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	3	Tor 29.7.14	Pet 1.8.14	95
97	**SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI PNV**	**111 dnevi**	**Čet 17.7.14**	**Ned 21.12.14**	
98	Priprava gradiva za vlado	7	Tor 29.7.14	Tor 5.8.14	95ZZ+5 dnevi
99	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Tor 5.8.14	Pet 8.8.14	95;98
100	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pon 11.8.14	Pon 25.8.14	99KZ+1 dan
101	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Tor 26.8.14	Pet 5.9.14	100KZ+1 dan
102	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 8.9.14	Pon 8.9.14	101
103	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	10	Pon 8.9.14	Čet 18.9.14	102
104	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3	Čet 18.9.14	Ned 21.9.14	103
105	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Ned 21.9.14	Sre 24.9.14	104
106	**IZBOR IZDELOVALCA DPN + PVO**	**111 dnevi**	**Čet 17.7.14**	**Ned 21.12.14**	
107	Priprava osnutka projektne naloge	15	Čet 17.7.14	Pet 1.8.14	93KZ+1 dan
108	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	15	Pon 4.8.14	Tor 19.8.14	107KZ+1 dan
109	Izbor izdelovalca: javna naročila	100	Sre 20.8.14	Pet 28.11.14	108KZ+1 dan
110	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Pon 1.12.14	Ned 21.12.14	109KZ+1 dan
111	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**463 dnevi**	**Pet 19.9.14**	**Tor 28.6.16**	
112	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**174 dnevi**	**Pet 19.9.14**	**Sre 20.5.15**	
113	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	60 dnevi	Pet 19.9.14	Čet 11.12.14	103
114	Izdelava osnutka poročila o vplivih na okolje (PVO)	60 dnevi	Pet 12.12.14	Čet 5.3.15	113
115	Izdelava osnutka DPN	75 dnevi	Pet 12.12.14	Čet 26.3.15	113
116	Pregled osnutka DPN	10	Pet 27.3.15	Pon 6.4.15	115KZ+1 dan
117	**Vključevanje javnosti**	**5 dnevi**	**Pon 6.4.15**	**Pon 13.4.15**	
118	Predstavitev rešitve občinam in predstavnikom javnosti	7	Pon 6.4.15	Pon 13.4.15	116
119	Zaključek osnutka DPN po pregledu	10	Pon 6.4.15	Čet 16.4.15	116
120	Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	3	Čet 16.4.15	Ned 19.4.15	119
121	Pridobitev osnutka OVS	30	Pon 20.4.15	Sre 20.5.15	120KZ+1 dan
122	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN**	**98 dnevi**	**Čet 21.5.15**	**Pon 5.10.15**	
123	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Čet 21.5.15	Sre 10.6.15	121
124	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Sre 10.6.15	Pon 15.6.15	123
125	Zaključek povzetka za javnost	1 dan	Pon 15.6.15	Pon 15.6.15	124ZZ
126	Objava javnega naznanila	5	Pon 15.6.15	Sob 20.6.15	124
127	Posredovanje osnutka DPN, PVO in osnutka OVS občinam	5	Sob 20.6.15	Čet 25.6.15	126
128	JR in JO + pridobitev 2. mnenja občin	30	Sob 27.6.15	Pon 27.7.15	126KZ+7
129	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS	1 potrdni	Sob 27.6.15	Ned 28.6.15	126KZ+7
130	Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelov	5	Pon 27.7.15	Sob 1.8.15	128
131	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Pon 3.8.15	Pet 2.10.15	130KZ+1 dan
132	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Pon 5.10.15	Pon 5.10.15	131
133	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**46 dnevi**	**Sre 7.10.15**	**Sre 9.12.15**	
134	Izdelava predloga PVO	30 dnevi	Sre 7.10.15	Tor 17.11.15	132KZ+1 dan
135	Izdelava predloga DPN	30 dnevi	Sre 7.10.15	Tor 17.11.15	132KZ+1 dan
136	Preveritev PVO	30 dnevi	Sre 7.10.15	Tor 17.11.15	132KZ+1 dan
137	Pregled predloga DPN	7 dnevi	Čet 19.11.15	Pet 27.11.15	135KZ+1 dan
138	Zaključek predloga DPN po pregledu	7 dnevi	Tor 1.12.15	Sre 9.12.15	137KZ+1 dan
139	**PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS**	**73 dnevi**	**Čet 10.12.15**	**Pon 21.3.16**	
140	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Čet 10.12.15	Pon 14.12.15	138
141	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Tor 15.12.15	Čet 14.1.16	140KZ+1 dan
142	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Tor 15.12.15	Čet 14.1.16	140KZ+1 dan
143	Pridobitev odločbe o OVS	30	Pet 15.1.16	Ned 14.2.16	142KZ+1 dan
144	Pravnomočnost odločbe o OVS	14	Pon 15.2.16	Pon 29.2.16	143KZ+1 dan
145	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Čet 14.1.16	Tor 19.1.16	142
146	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10	Tor 1.3.16	Pet 11.3.16	144KZ+1 dan;145
147	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Pet 11.3.16	Pon 21.3.16	146
148	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**71 dnevi**	**Pon 21.3.16**	**Tor 28.6.16**	
149	Priprava gradiva za vlado	7	Pon 21.3.16	Pon 28.3.16	146;147
150	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pon 28.3.16	Čet 31.3.16	149
151	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Tor 29.3.16	Tor 12.4.16	149KZ+1 dan
152	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sre 13.4.16	Sre 27.4.16	150;151KZ+1 dan
153	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Čet 28.4.16	Ned 8.5.16	152KZ+1 dan
154	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 9.5.16	Pon 9.5.16	153
155	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Tor 10.5.16	Pet 20.5.16	154KZ+1 dan
156	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Pon 23.5.16	Čet 9.6.16	155
157	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Pet 10.6.16	Pet 24.6.16	156KZ+1 dan
158	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3 dnevi	Pet 10.6.16	Tor 14.6.16	156
159	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Pon 23.5.16	Pet 27.5.16	155
160	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Pon 23.5.16	Sre 22.6.16	155;156KZ-14 dnevi
161	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5 dnevi	Sre 22.6.16	Tor 28.6.16	160

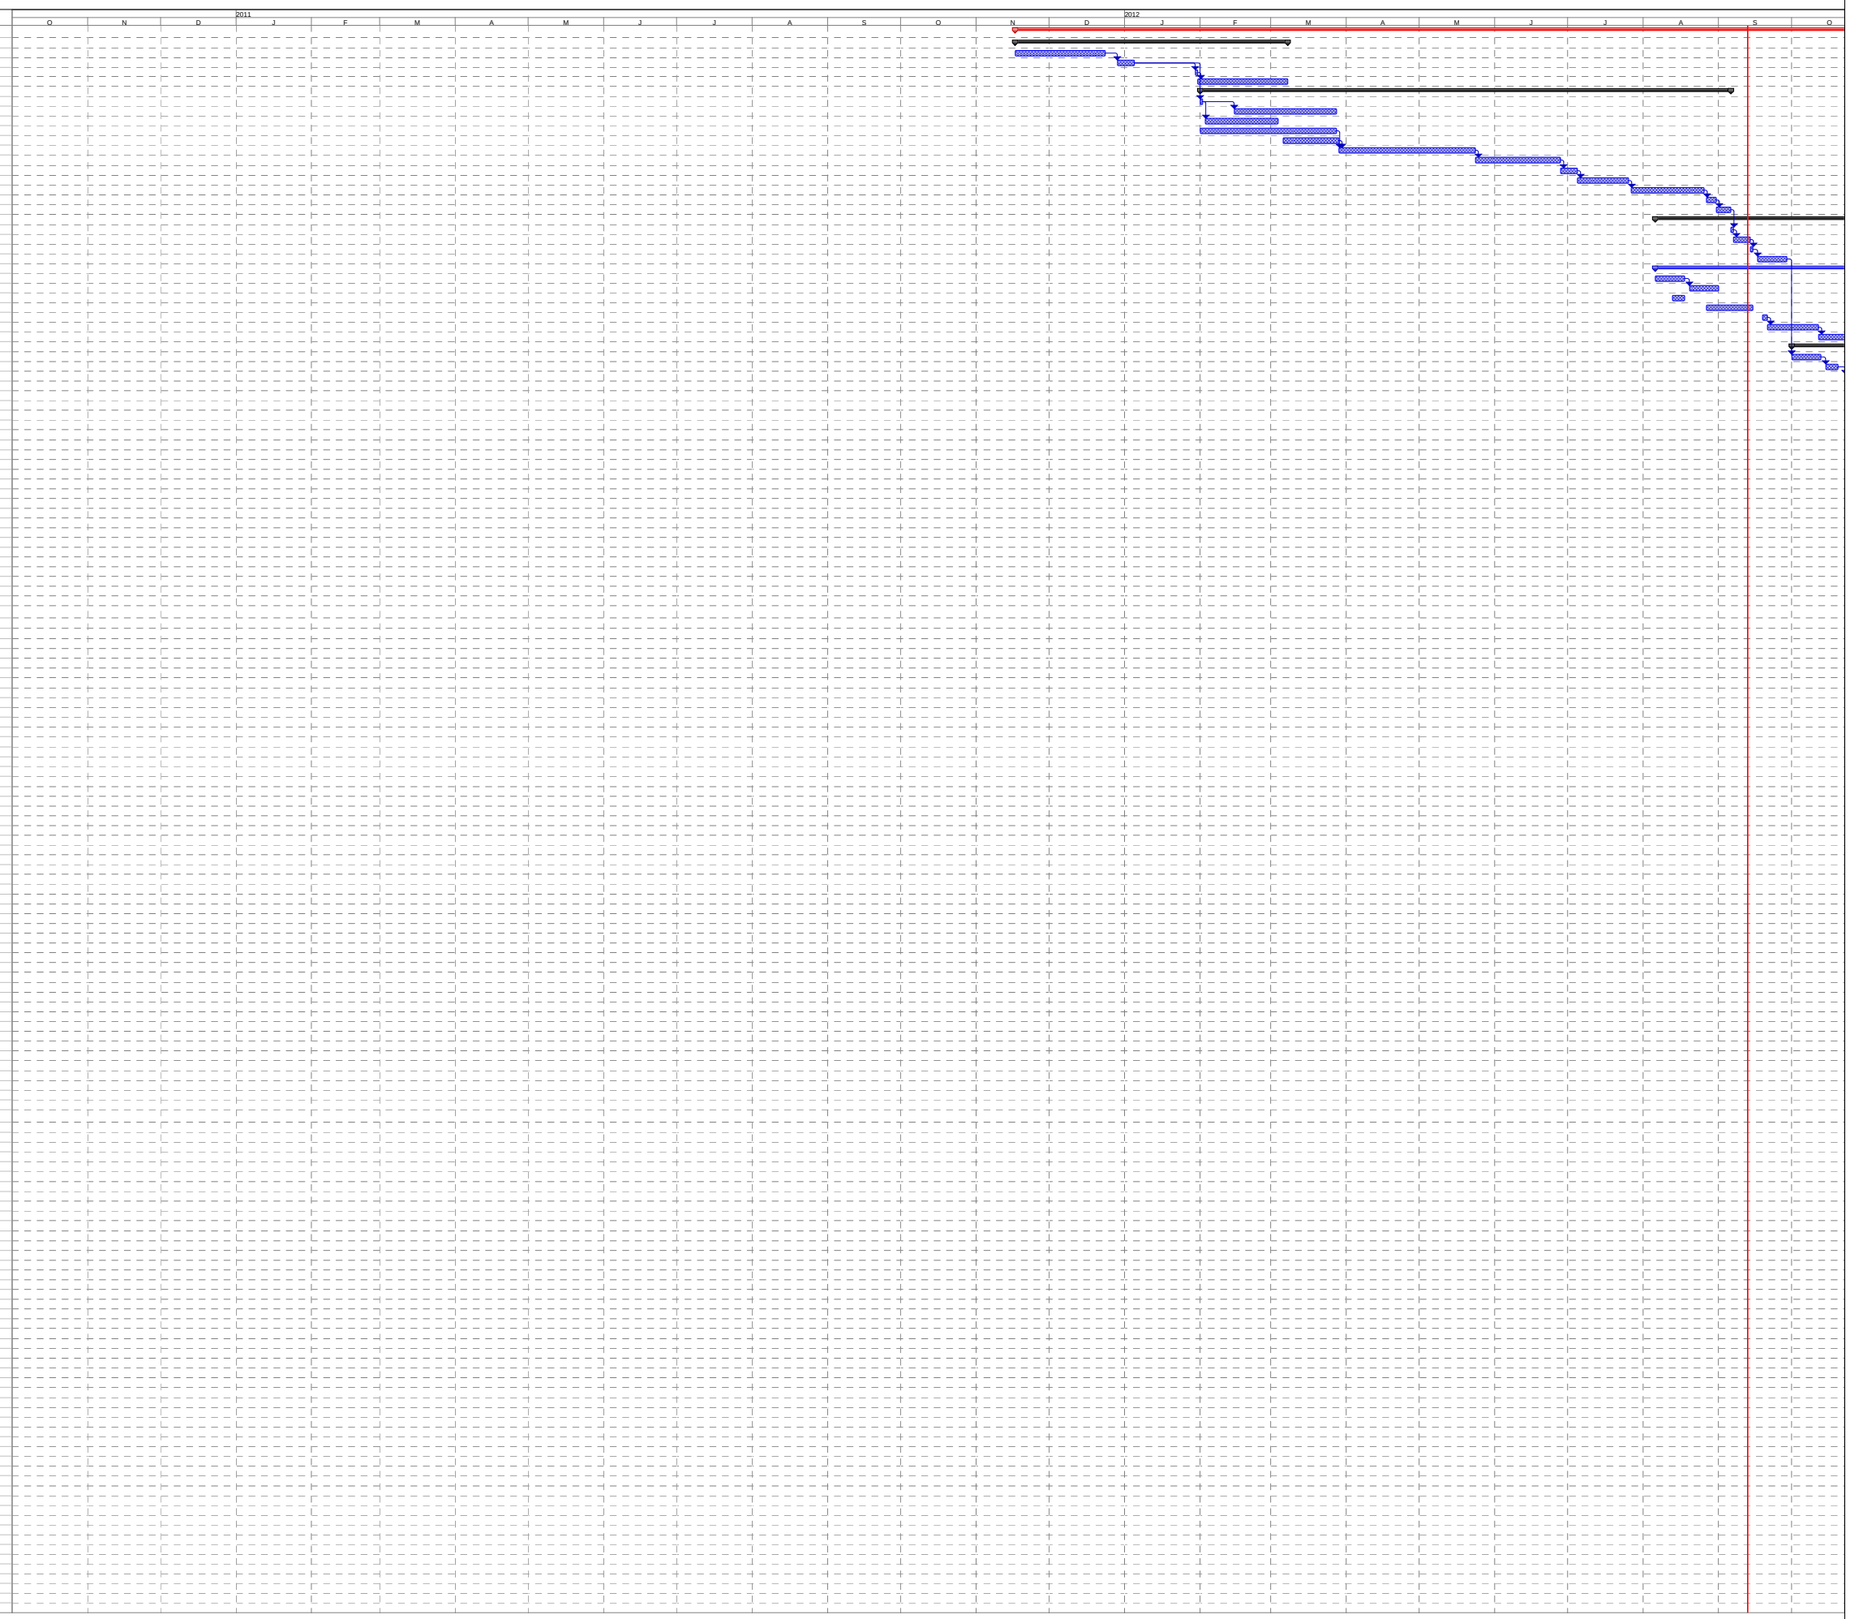

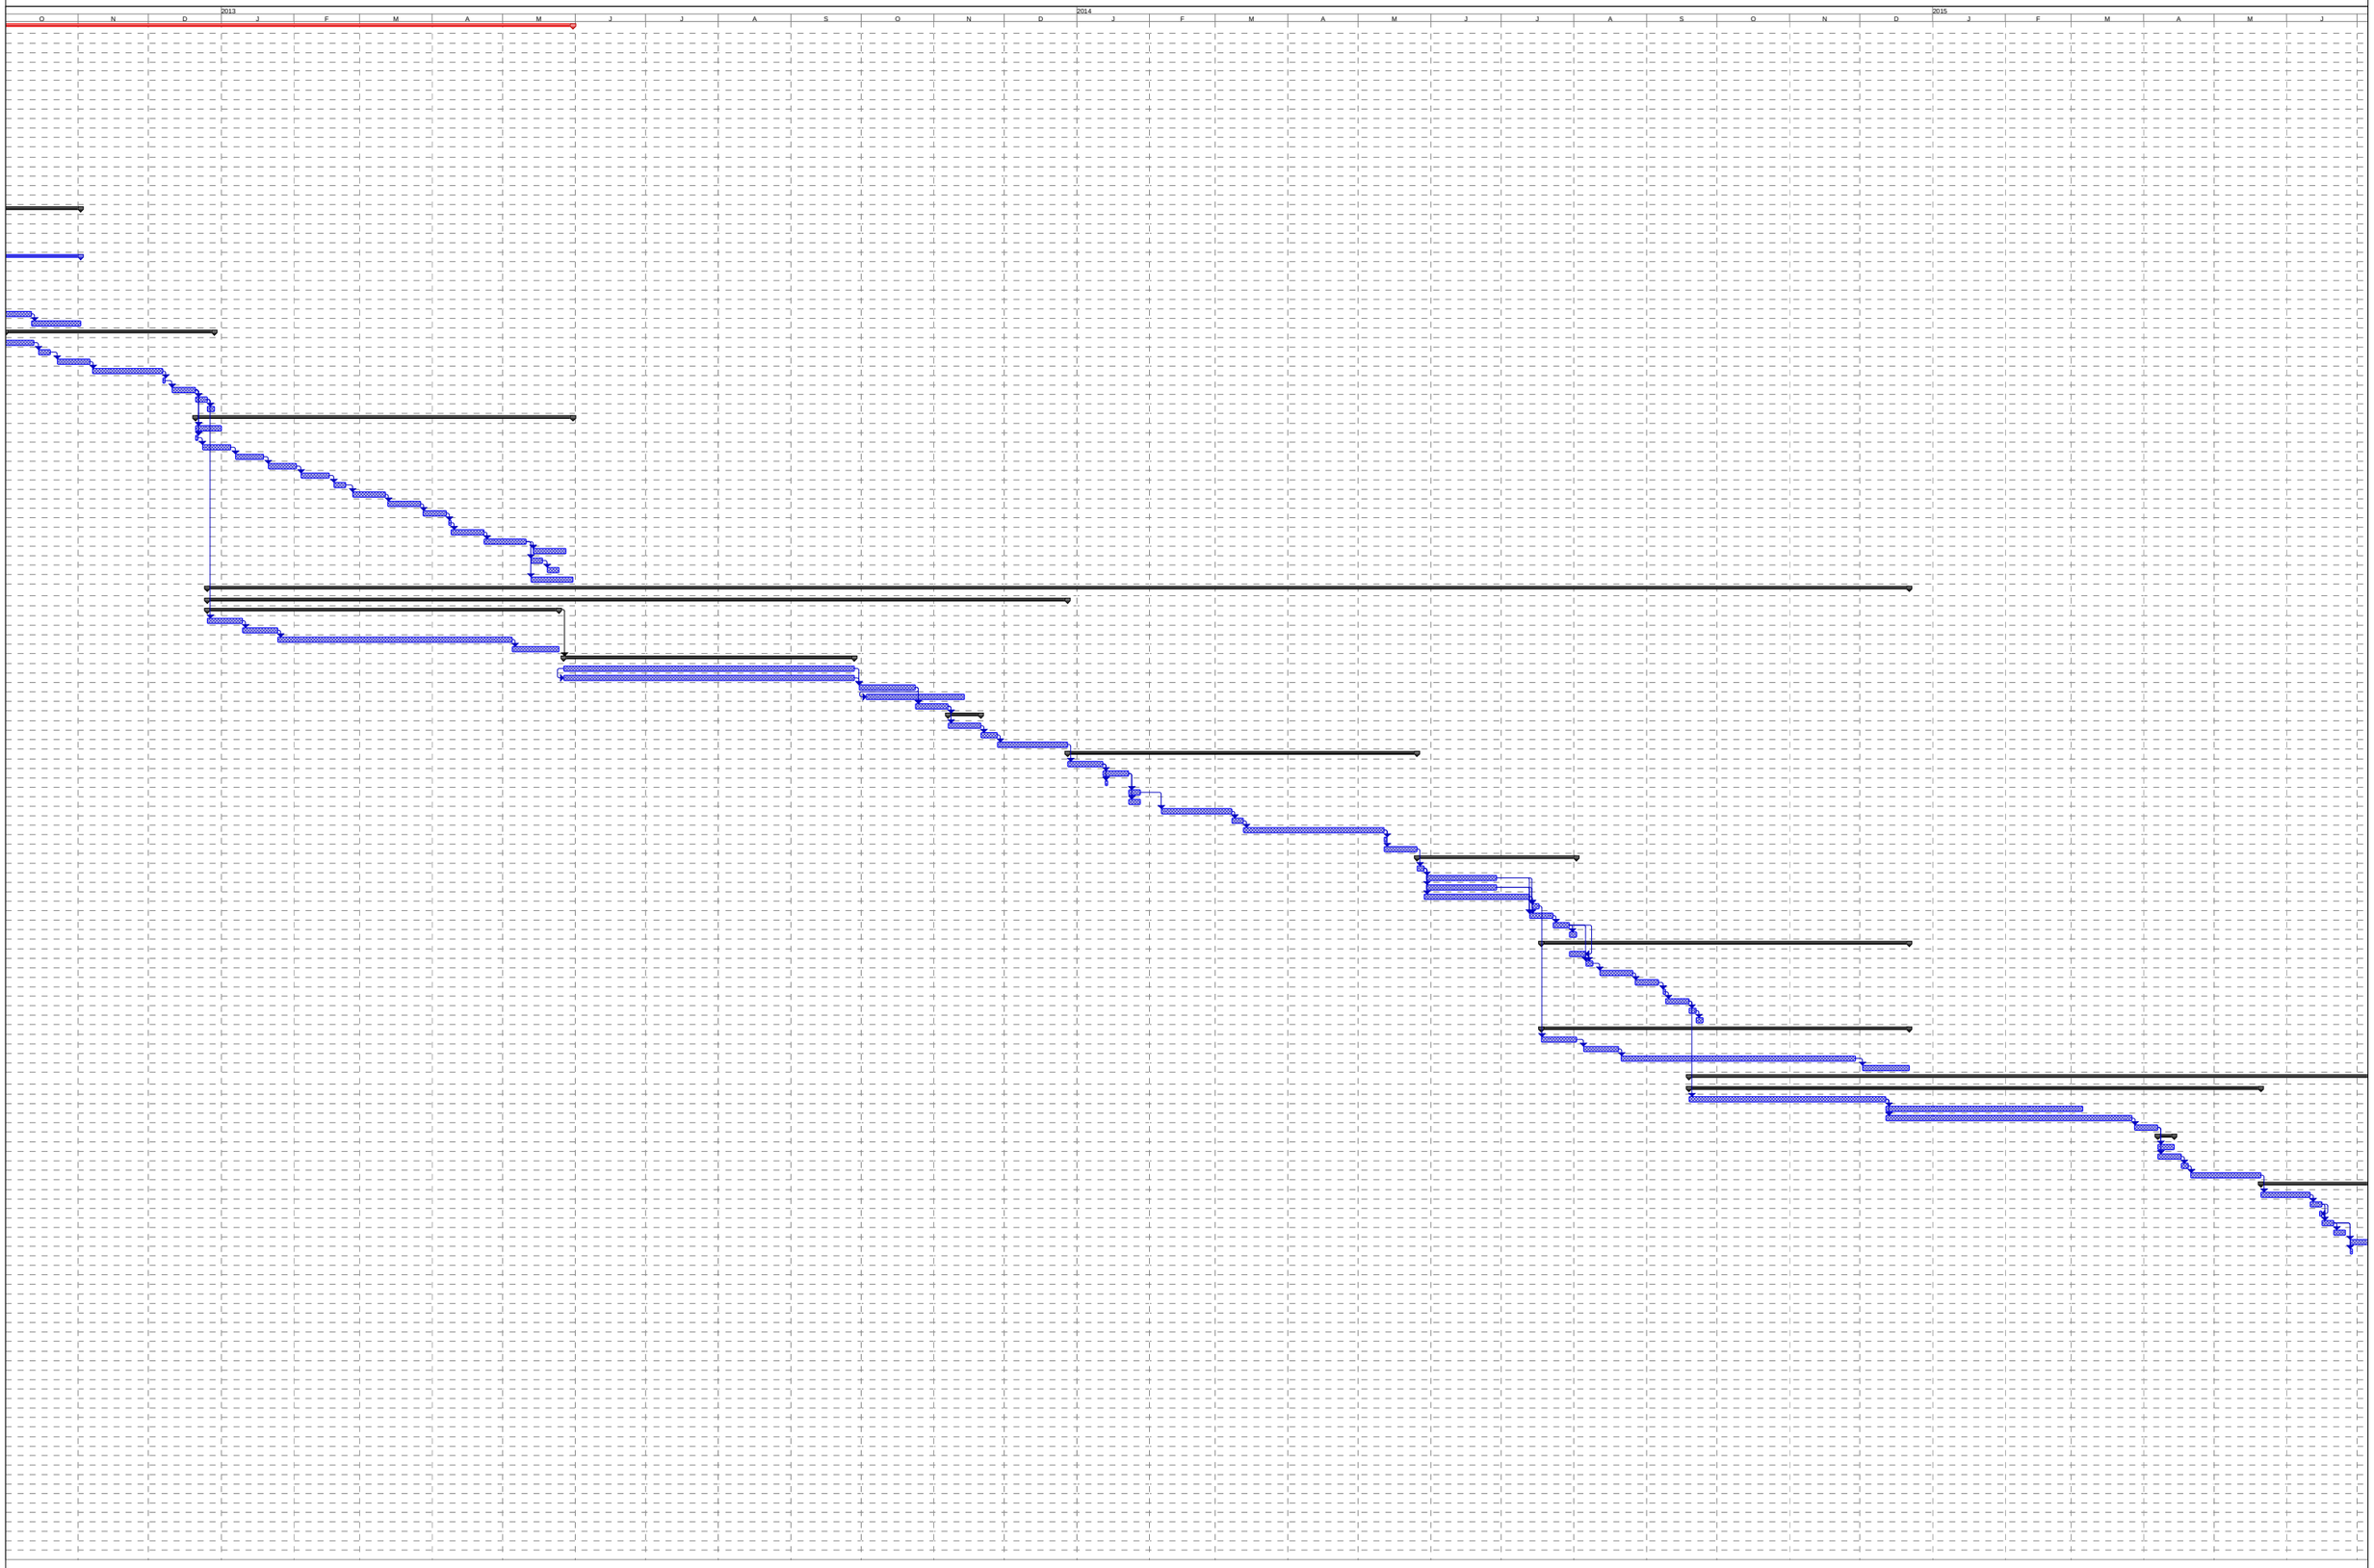
2013
2014
2015
O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J
