ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila
1	**POBUDA**	**243 dnevi?**	**Pet 30.11.12**	**Tor 5.11.13**	
2	**PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI, ODLOČBE O CPVO**	**73 dnevi?**	**Pet 30.11.12**	**Tor 12.3.13**	
3	podpis koncesijske pogodbe	1 dan?	Pet 30.11.12	Pet 30.11.12	
4	uskladitev nabora ureditev z v DPN z vsebino koncesijske pogodbe	15	Pet 30.11.12	Sob 15.12.12	3
5	Priprava osnutka sklepa o pripravi DPN	3	Sob 15.12.12	Tor 18.12.12	4
6	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudniki (in investitorji)	60 dnevi	Sre 19.12.12	Tor 12.3.13	5
7	**IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE**	**13 dnevi**	**Tor 12.3.13**	**Ned 31.3.13**	
8	Posredovanje osn. sklepa + elaborata analize semernic članom prostorske	3	Tor 12.3.13	Pet 15.3.13	6
9	Sklic seje prostorske konference	8 dnevi	Pon 18.3.13	Sre 27.3.13	8
10	Izvedba seje prostorske konference	1 potdni	Sre 27.3.13	Čet 28.3.13	9
11	Priprava predloga sklepa o pripravi DPN	3	Čet 28.3.13	Ned 31.3.13	10
12	**SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN**	**36 dnevi**	**Sob 23.3.13**	**Pon 13.5.13**	
13	Priprava gradiva za vlado	10	Sob 23.3.13	Tor 2.4.13	11ZZ+2 ;10ZZ;8ZZ
14	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Tor 2.4.13	Pet 5.4.13	13
15	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 5.4.13	Pet 19.4.13	14
16	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Pet 19.4.13	Pon 29.4.13	15
17	Odbor Vlade RS	1 potdni	Pon 29.4.13	Tor 30.4.13	16
18	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10	Tor 30.4.13	Pet 10.5.13	17
19	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3	Pet 10.5.13	Pon 13.5.13	18
20	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Pet 10.5.13	Pon 13.5.13	18
21	**SPREJEM UREDBE O (PRENEHANJU VELJAVNOSTI) ZAČASNEM UKRE**	**127 dnevi**	**Pon 13.5.13**	**Tor 5.11.13**	
38	**ŠTUDIJA VARIANT**	**325 dnevi**	**Pon 1.4.13**	**Ned 29.6.14**	
39	**IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)**	**170 dnevi**	**Pon 1.4.13**	**Sob 23.11.13**	
40	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	120 dnevi	Pon 1.4.13	Pet 13.9.13	
41	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	120 dnevi	Pon 1.4.13	Pet 13.9.13	11
42	Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik)	120 dnevi	Pon 1.4.13	Pet 13.9.13	11
43	Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidik)	120 dnevi	Pon 1.4.13	Pet 13.9.13	11
44	Izdelava okoljskega elaborata (varstveni vidik)	120 dnevi	Pon 1.4.13	Pet 13.9.13	11
45	Izdelava ocene sprejemljivosti v lokalnem okolju	120 dnevi	Pon 1.4.13	Pet 13.9.13	11
46	Izdelava okoljskega poročila (OP)	120 dnevi	Pon 1.4.13	Pet 13.9.13	11
47	Recenzija (pregled) ŠV/PIZ	14	Pet 13.9.13	Pet 27.9.13	40
48	Vključevanje javnosti	19 dnevi	Pet 27.9.13	Čet 24.10.13	
49	Predstavitev variant občinam in predstavnikom javnosti	7	Pet 27.9.13	Pet 4.10.13	47
50	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10	Pet 4.10.13	Pon 14.10.13	49
51	Dopolnitev ŠVIPIZ v skladu s sprejetimi pripombami občin in predstavnik	10	Pon 14.10.13	Čet 24.10.13	50
52	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	10	Pon 14.10.13	Čet 24.10.13	50;47
53	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Čet 24.10.13	Sob 23.11.13	52;46
54	**JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV IN OP + 1. MNENJE OBČIN**	**100 dnevi**	**Sre 9.10.13**	**Sre 26.2.14**	
55	Organizacija JR in JO	15	Sre 9.10.13	Čet 24.10.13	52ZZ
56	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	11	Sre 16.10.13	Ned 27.10.13	52ZZ+3
57	Izdelava povzetka za javnost	15	Sre 9.10.13	Čet 24.10.13	52ZZ
58	Objava javnega naznanila	5	Ned 27.10.13	Pet 1.11.13	56;57
59	Posredovanje ŠV/PIZ in PNV ter OP občinam	5	Ned 27.10.13	Pet 1.11.13	56;57
60	JR in JO	30	Pet 8.11.13	Ned 8.12.13	58KZ+7
61	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pet 8.11.13	Ned 8.12.13	58KZ+7
62	Pripombe in predlogi občin + 1. mnenje občin	30	Pet 8.11.13	Ned 8.12.13	58KZ+7
63	Posredovanje pripomb in predlogov + 1. mnenj pobudniku, investitorju in izd	5	Ned 8.12.13	Pet 13.12.13	62;60;61
64	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb	60	Pet 13.12.13	Tor 11.2.14	63
65	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Tor 11.2.14	Sre 12.2.14	64
66	Dopolnitev ŠV/PIZ in PNV ter OP	14	Sre 12.2.14	Sre 26.2.14	65;64
67	**PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVO**	**55 dnevi**	**Sre 26.2.14**	**Sre 14.5.14**	
68	Posredovanje vseh vlog	3	Sre 26.2.14	Sob 1.3.14	66
69	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30	Sob 1.3.14	Pon 31.3.14	68
70	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30	Sob 1.3.14	Pon 31.3.14	68
71	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV	45	Sob 1.3.14	Tor 15.4.14	68
72	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	3 dnevi	Sre 16.4.14	Pet 18.4.14	69;70;71
73	Uskladitev ŠV/PIZ in PNV z mnenji	10	Pon 28.4.14	Čet 8.5.14	71ZZ;72ZZ+14 dnevi
74	Priprava osnutka sklepa o potrditvi PNV	7	Ned 4.5.14	Ned 11.5.14	73ZZ+3
75	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	3	Ned 11.5.14	Sre 14.5.14	74
76	**IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE (opcija)**	**12 dnevi**	**Sre 14.5.14**	**Sob 31.5.14**	
77	Posredovanje osn. sklepa članom prostorske konf.	3	Sre 14.5.14	Sob 17.5.14	75
78	Sklic seje prostorske konference	8	Sob 17.5.14	Ned 25.5.14	77
79	Izvedba seje prostorske konference	1 potdni	Ned 25.5.14	Pon 26.5.14	78
80	Priprava predloga sklepa o potrditvi PNV	5	Pon 26.5.14	Sob 31.5.14	79
81	**SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI PNV (opcija - vezati tudi na 110)**	**34 dnevi**	**Pon 12.5.14**	**Ned 29.6.14**	
82	Priprava gradiva za vlado	7	Pon 12.5.14	Pon 19.5.14	75ZZ+5
83	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pon 19.5.14	Čet 22.5.14	82
84	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Čet 22.5.14	Čet 5.6.14	83
85	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Čet 5.6.14	Ned 15.6.14	84
86	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Ned 15.6.14	Pon 16.6.14	85
87	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	10	Pon 16.6.14	Čet 26.6.14	86
88	Posredovanje sklepa koordinatroju, pobudniku, investiroju, vsem NUP	3	Čet 26.6.14	Ned 29.6.14	87

TP je hipotetičen, predvideva podpis koncesijske pogodbe(je v pristojnosti MKO) in definiranje ureditev v DPN jeseni 2012

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila
89	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Čet 26.6.14	Ned 29.6.14	87
90	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**316 dnevi**	**Pet 9.5.14**	**Sob 25.7.15**	
91	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**70 dnevi**	**Pet 9.5.14**	**Čet 14.8.14**	
92	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	1 dan	Pet 9.5.14	Pet 9.5.14	73
93	Izdelava osnutka poročila o vplivih na okolje (PVO)	1 dan	Pet 9.5.14	Pet 9.5.14	73
94	Izdelava osnutka DPN	1 dan	Pon 12.5.14	Pon 12.5.14	92
95	Pregled osnutka DPN	14	Pon 12.5.14	Pon 26.5.14	94
96	Vključevanje javnosti	27 dnevi	Pon 26.5.14	Sre 2.7.14	
97	Predstavitev rešitve občinam in predstavnikom javnosti	7	Pon 26.5.14	Pon 2.6.14	95
98	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10	Pon 2.6.14	Čet 12.6.14	97
99	Dopolnitev osnutka v skladu s sprejetimi pripombami občin in javnosti	20	Čet 12.6.14	Sre 2.7.14	98
100	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Sre 2.7.14	Sob 12.7.14	99;95
101	Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	3	Sob 12.7.14	Tor 15.7.14	100
102	Pridobitev osnutka OVS	30	Tor 15.7.14	Čet 14.8.14	101
103	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN**	**96 dnevi**	**Pet 25.7.14**	**Pet 5.12.14**	
104	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Pet 25.7.14	Čet 14.8.14	102ZZ
105	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Čet 14.8.14	Tor 19.8.14	104
106	Izdelava povzetka za javnost	15	Pon 4.8.14	Tor 19.8.14	105ZZ
107	Objava javnega naznanila	5	Tor 19.8.14	Ned 24.8.14	105
108	Posredovanje osnutka DPN, PVO in osnutka OVS občinam	5	Ned 24.8.14	Pet 29.8.14	107;102
109	JR in JO	30	Ned 31.8.14	Tor 30.9.14	107KZ+7
110	Pripombe in predlogi javnosti	30	Ned 31.8.14	Tor 30.9.14	107KZ+7
111	Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Ned 31.8.14	Tor 30.9.14	107KZ+7
112	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS (opcija)	1 potdni	Ned 31.8.14	Pon 1.9.14	107KZ+7
113	Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenj pobudniku, invsetitorju in izd	5	Tor 30.9.14	Ned 5.10.14	111;109;110
114	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Ned 5.10.14	Čet 4.12.14	113
115	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Čet 4.12.14	Pet 5.12.14	114
116	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**44 dnevi**	**Pet 5.12.14**	**Sre 4.2.15**	
117	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	30 dnevi	Pet 5.12.14	Čet 15.1.15	114
118	Izdelava predloga DPN	30 dnevi	Pet 5.12.14	Čet 15.1.15	114
119	Preveritev PVO	30 dnevi	Pet 5.12.14	Čet 15.1.15	114
120	Pregled predloga DPN	7 dnevi	Pet 16.1.15	Pon 26.1.15	118
121	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	7 dnevi	Tor 27.1.15	Sre 4.2.15	120
122	**PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS**	**62 dnevi**	**Sre 4.2.15**	**Sob 2.5.15**	
123	Posredovanje vseh vlog	3	Sre 4.2.15	Sob 7.2.15	121
124	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Sob 7.2.15	Pon 9.3.15	123
125	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Sob 7.2.15	Pon 9.3.15	123
126	Pridobitev odločbe o OVS	30	Pon 9.3.15	Sre 8.4.15	125
127	Pravnomočnost odločbe o OVS	14	Sre 8.4.15	Sre 22.4.15	126
128	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Pon 9.3.15	Sob 14.3.15	124;125
129	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10	Sre 22.4.15	Sob 2.5.15	128;127
130	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Sre 22.4.15	Sob 2.5.15	129ZZ
131	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**61 dnevi**	**Čet 30.4.15**	**Sob 25.7.15**	
132	Priprava gradiva za vlado	7	Čet 30.4.15	Čet 7.5.15	130ZZ+5
133	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Čet 7.5.15	Ned 10.5.15	132
134	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Sob 2.5.15	Sob 16.5.15	130
135	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sob 16.5.15	Sob 30.5.15	133;134
136	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Sob 30.5.15	Tor 9.6.15	135
137	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Tor 9.6.15	Sre 10.6.15	136
138	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Sre 10.6.15	Sob 20.6.15	137
139	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Sob 20.6.15	Sob 4.7.15	138
140	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Sob 4.7.15	Sob 18.7.15	139
141	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3	Sob 20.6.15	Tor 23.6.15	138
142	Izdelava povzetka za javnost	5	Sob 20.6.15	Čet 25.6.15	138
143	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Sob 20.6.15	Pon 20.7.15	139KZ-14 dnevi;138
144	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5	Pon 20.7.15	Sob 25.7.15	143
145					
146	**IZBOR IZDELOVALCA**	**4 dnevi**	**Pon 3.1.11**	**Pet 7.1.11**	
147	Priprava osnutka projektne naloge	1 potdni	Pon 3.1.11	Tor 4.1.11	
148	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	1 potdni	Tor 4.1.11	Sre 5.1.11	147
149	Izbor izdelovalca: javna naročila	1 potdni	Sre 5.1.11	Čet 6.1.11	148
150	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	1 potdni	Čet 6.1.11	Pet 7.1.11	149

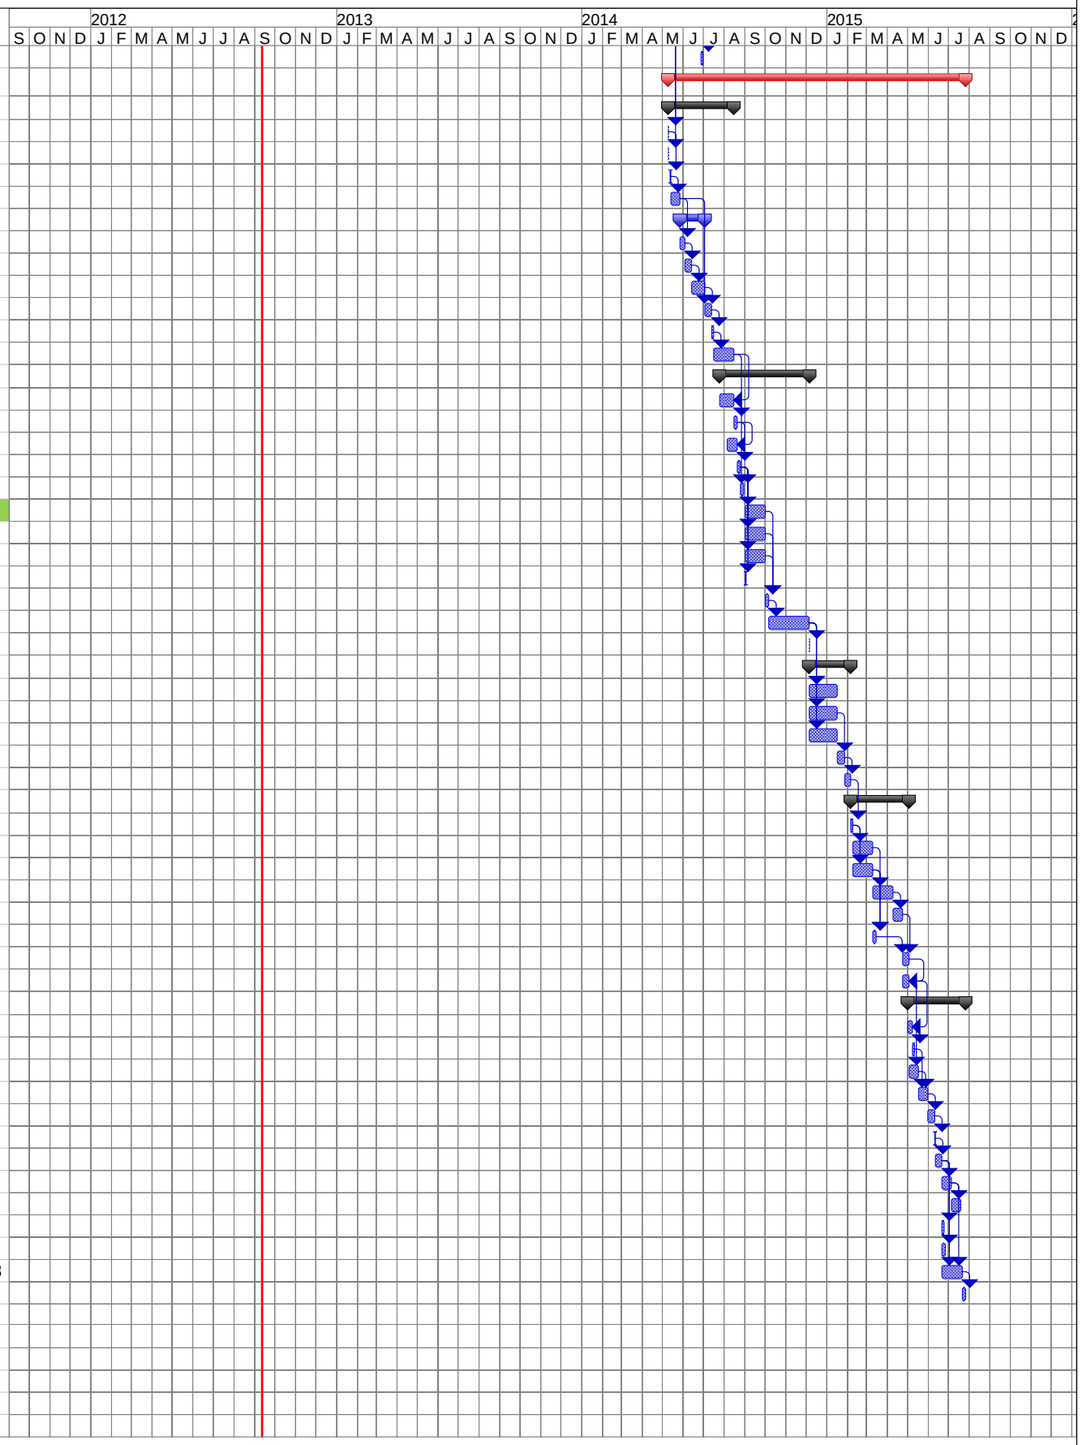

TP je hipotetičen, predvideva podpis koncesijske pogodbe(je v pristojnosti MKO) in definiranje ureditev v DPN jeseni 2012
