OSNUTEK

Železniška proga Maribor - Šentilj

2_DPN za železniško progo Maribor Šentilj

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila
1	POBUDE MINISTROV ZAINTERESIRANIH RESORJEV (NUP z razvojnimi potrebami)	1 dan	Pon 6.7.09	Pon 6.7.09	
2	**SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**210 dnevi**	**Pet 10.7.09**	**Pet 30.4.10**	
3	Presoja pobude	31 dnevi	Pet 10.7.09	Pet 21.8.09	1
4	Priprava osnutka Sklepa o začetku priprave DPN - gradivo za Vlado RS	24	Pet 21.8.09	Pon 14.9.09	3
5	Uskladitev Sklepa - gradiva za Vlado RS - vsebinsko, z zainteresiranimi resorji	116	Pon 14.9.09	Pet 8.1.10	4
6	Uskladitev gradiva z MF	66	Pet 8.1.10	Pon 15.3.10	5
7	Uskladitev gradiva s SVZ	38	Pet 8.1.10	Pon 15.2.10	5
8	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	14 dnevi	Pon 15.2.10	Čet 4.3.10	7
9	Obravnava in sprejem Sklepa na Vladi RS	28	Čet 4.3.10	Čet 1.4.10	8
10	Objava Sklepa na spletni strani MOP	1 dan	Pet 2.4.10	Pet 2.4.10	9
11	Seznanitev s sklepom in pridobitev razvojnih potreb	29	Čet 1.4.10	Pet 30.4.10	9
12	**OSNUTEK DPN**	**149 dnevi**	**Pet 2.4.10**	**Sre 27.10.10**	
13	**IZDELAVA OSNUTKA DPN (oDPN)**	**41 dnevi**	**Pet 2.4.10**	**Pon 31.5.10**	
14	Priprava osnutka DPN (predhodne analize na podlagi obstoječih podatkov; nabor variant; 1. mapa, 1. zvez	59	Pet 2.4.10	Pon 31.5.10	11
15	**SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (NUP)**	**107 dnevi**	**Tor 1.6.10**	**Sre 27.10.10**	
16	Pridobitev smernic NUP	60	Tor 1.6.10	Sob 31.7.10	14KZ+5
17	Odločba o CPVO	30	Tor 1.6.10	Čet 1.7.10	14KZ+10
18	Posredovanje smernic izdelovalcu DPN	46	Ned 20.6.10	Čet 5.8.10	16KZ-10
19	Formalni pregled in pridobitev dopolnitev smernic	50	Sre 30.6.10	Čet 19.8.10	16SS+30
20	Posredovanje dopolnjenih smernic izdelovalcu DPN	15	Sre 4.8.10	Čet 19.8.10	18KZ-20 ;19KZ-
21	Vsebinski pregled in analiza smernic	39	Čet 19.8.10	Pon 27.9.10	20
22	**UVELJAVITEV ZUPUDPP**	**1 dan**	**Sre 27.10.10**	**Sre 27.10.10**	
23	**ŠTUDIJA VARIANT**	**337 dnevi**	**Sob 7.7.12**	**Pon 21.10.13**	
24	**IZBOR IZDELOVALCA STROKOVNIH PODLAG, OP in ŠV/PIZ**	**96 dnevi**	**Sob 7.7.12**	**Pon 19.11.12**	
25	Priprava osnutka projektne naloge	20	Sob 7.7.12	Pet 27.7.12	
26	Uskladitev in potrditev projektne naloge	5	Pet 27.7.12	Sre 1.8.12	25
27	Izbor izdelovalca: javna naročila	90	Sre 1.8.12	Tor 30.10.12	26
28	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Tor 30.10.12	Pon 19.11.12	27
29	**Izdelava strokovnih podlag za ŠV/PIZ**	**140 dnevi**	**Pon 19.11.12**	**Sob 1.6.13**	
30	Izdelava IdZ in prometno tehnološkega elaborata	120	Pon 19.11.12	Tor 19.3.13	28
31	Izdelava okoljskega poročila brez ocene sprejemljivosti plana	30	Pon 4.3.13	Sre 3.4.13	30ZZ+15
32	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	30	Tor 19.3.13	Čet 18.4.13	31ZZ+15 ;30
33	Izdelava okoljskega poročila (OP) - zaključek	15	Čet 18.4.13	Pet 3.5.13	32
34	Pregled in potrditev ŠV/PIZ	7	Čet 18.4.13	Čet 25.4.13	32
35	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	7	Čet 25.4.13	Čet 2.5.13	34
36	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Čet 2.5.13	Sob 1.6.13	35
37	**JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV IN OP + 1. MNENJE OBČIN**	**114 dnevi**	**Čet 25.4.13**	**Sre 2.10.13**	
38	Organizacija JR in JO	5 dnevi	Čet 25.4.13	Čet 2.5.13	35ZZ
39	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	2 dnevi	Čet 2.5.13	Ned 5.5.13	35ZZ+3
40	Izdelava povzetka za javnost	7	Ned 28.4.13	Ned 5.5.13	35ZZ+3
41	Objava javnega naznanila	3	Ned 5.5.13	Sre 8.5.13	39;40
42	Predstavitev SV/PIZ, PNV in OP občinam in predstavnikom javnosti	1 dan	Pon 6.5.13	Pon 6.5.13	39;40
43	Posredovanje ŠV/PIZ in PNV ter OP občinam	4	Ned 5.5.13	Čet 9.5.13	39;40
44	JR in JO	30	Sre 15.5.13	Pet 14.6.13	41KZ+7
45	Pripombe in predlogi javnosti	30	Sre 15.5.13	Pet 14.6.13	41KZ+7
46	Pripombe in predlogi občin + 1. mnenje občin	30	Sre 15.5.13	Pet 14.6.13	41KZ+7
47	Posredovanje pripomb in predlogov + 1. mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sektorju za CPVO	30	Pon 20.5.13	Sre 19.6.13	44ZZ+5 ;45ZZ+5 ;46ZZ+5
48	Priprava in uskladitev stališč do pripomb	45	Tor 4.6.13	Pet 19.7.13	47ZZ+30
49	Podpis in objava stališč do pripomb na spletu ter posredovanje občinam	1 potdni	Pet 19.7.13	Sob 20.7.13	48
50	Dopolnitev ŠV/PIZ in PNV ter OP	45	Sre 19.6.13	Sob 3.8.13	48ZZ+15
51	Potrditev ŠV/PIZ na Komisiji za potrjevanje investicijske dokumentacije	60	Sob 3.8.13	Sre 2.10.13	35;50
52	**PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV**	**36 dnevi**	**Pon 5.8.13**	**Pon 23.9.13**	
53	Posredovanje vseh vlog	1 dan	Pon 5.8.13	Pon 5.8.13	50
54	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30	Pon 5.8.13	Sre 4.9.13	53
55	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30	Pon 5.8.13	Sre 4.9.13	53
56	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV (zaključek postopka CPVO)	30	Pon 5.8.13	Sre 4.9.13	53
57	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	2 dnevi	Čet 5.9.13	Pet 6.9.13	55;56;54
58	Uskladitev ŠV/PIZ in PNV z mnenji	30	Sre 21.8.13	Pet 20.9.13	57ZZ+14 ;56ZZ
59	Priprava osnutka sklepa o potrditvi PNV	5 dnevi	Pon 16.9.13	Pet 20.9.13	58ZZ
60	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa	1 dan	Pon 23.9.13	Pon 23.9.13	59
61	***IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE (opcija)***	***0 dnevi***	***Pon 23.9.13***	***Pon 23.9.13***	
66	**SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI PNV**	**24 dnevi**	**Sre 18.9.13**	**Pon 21.10.13**	
67	Priprava gradiva za vlado	3 dnevi	Sre 18.9.13	Pet 20.9.13	59ZZ
68	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	1 dan	Pon 23.9.13	Pon 23.9.13	67
69	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pon 23.9.13	Pon 7.10.13	68
70	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	2 dnevi	Tor 8.10.13	Sre 9.10.13	69
71	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Čet 10.10.13	Čet 10.10.13	70;51
72	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	7	Čet 10.10.13	Čet 17.10.13	71
73	Posredovanje sklepa koordinatroju, pobudniku, investiroju, vsem NUP	2 dnevi	Pet 18.10.13	Pon 21.10.13	72
74	Objava sklepa na spletni strani MzIP	1 dan	Pet 18.10.13	Pet 18.10.13	72

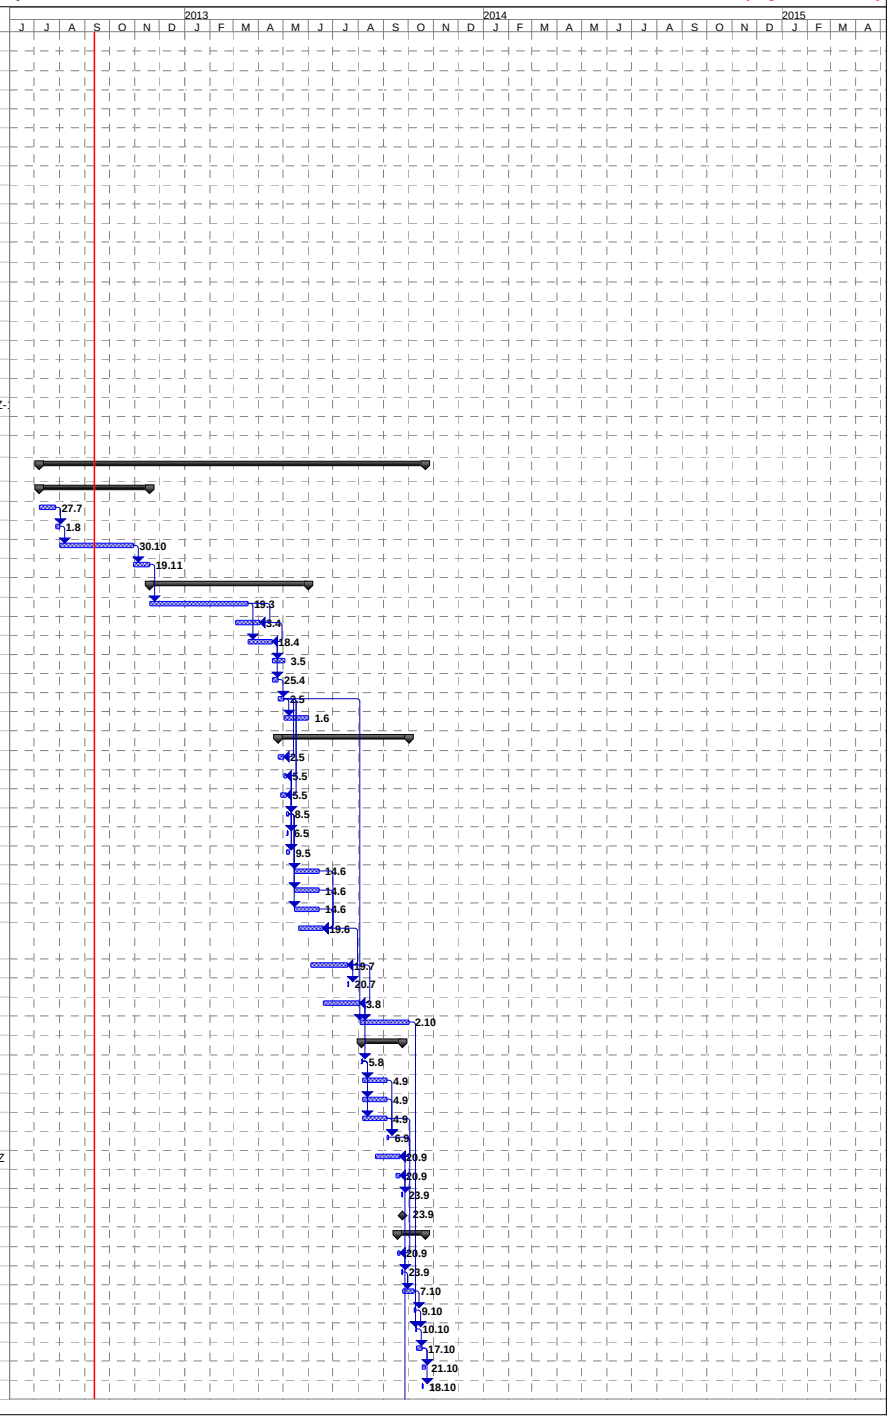

OSNUTEK

Železniška proga Maribor - Šentilj

2_DPN za železniško progo Maribor Šentilj
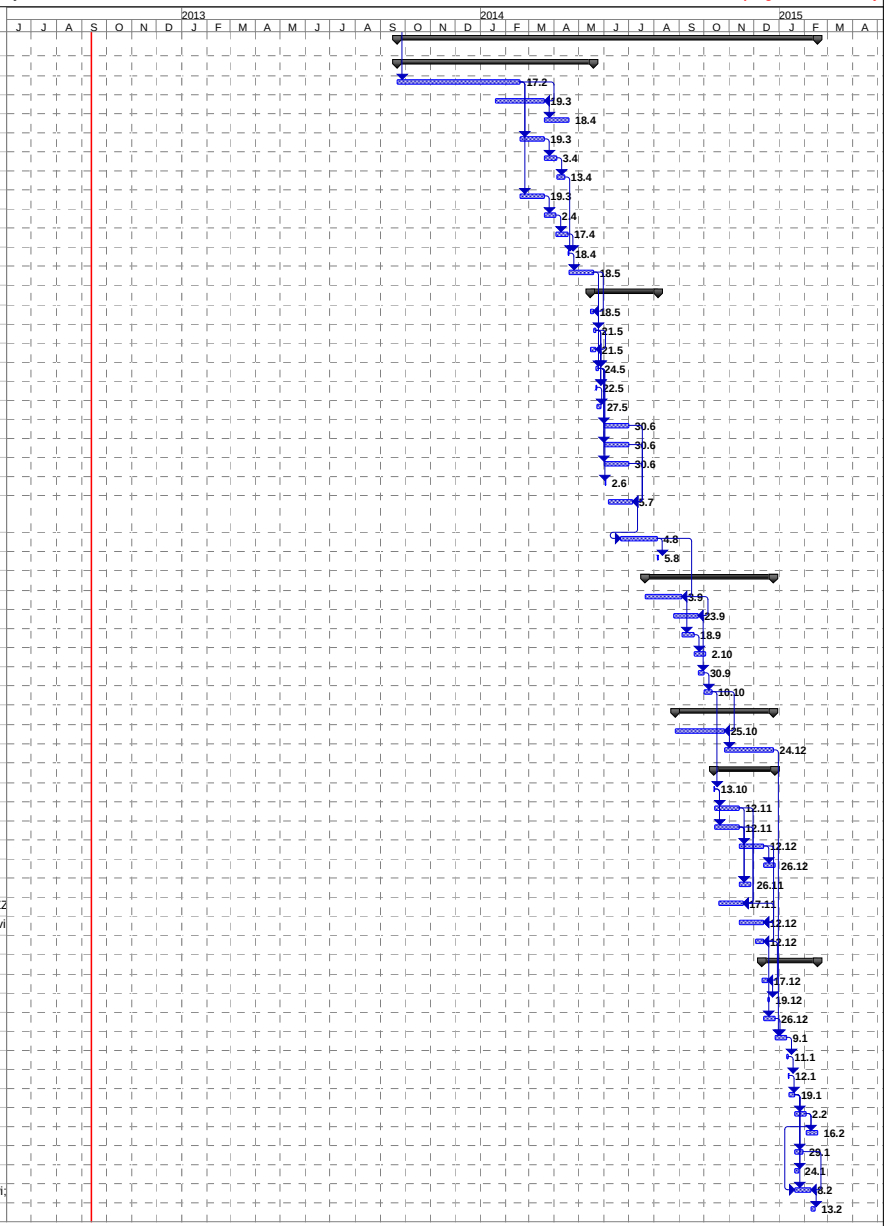
ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila
75	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**366 dnevi**	**Pet 20.9.13**	**Pon 16.2.15**	
76	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**170 dnevi**	**Pet 20.9.13**	**Ned 18.5.14**	
77	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	150	Pet 20.9.13	Pon 17.2.14	58
78	Recenzija podrobnih strokovnih podlag	60	Sob 18.1.14	Sre 19.3.14	77ZZ+30
79	Popravki podrobnih strokovnih podlag po recenziji	30	Sre 19.3.14	Pet 18.4.14	78
80	Izdelava osnutka poročila o vplivih na okolje (PVO)	30	Pon 17.2.14	Sre 19.3.14	77
81	Recenzija PVO	15	Sre 19.3.14	Čet 3.4.14	80
82	Dopolnitev PVO po recenziji,	10	Čet 3.4.14	Ned 13.4.14	81
83	Izdelava osnutka DPN	30	Pon 17.2.14	Sre 19.3.14	77
84	Pregled in potrditev osnutka DPN	14	Sre 19.3.14	Sre 2.4.14	83
85	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	15	Sre 2.4.14	Čet 17.4.14	84
86	Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	1 dan	Pet 18.4.14	Pet 18.4.14	82;85
87	Pridobitev osnutka OVS	30	Pet 18.4.14	Ned 18.5.14	86
88	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN**	**59 dnevi**	**Sre 14.5.14**	**Tor 5.8.14**	
89	Organizacija JR in JO	2 dnevi	Čet 15.5.14	Ned 18.5.14	87ZZ
90	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	3 dnevi	Pon 19.5.14	Sre 21.5.14	89
91	Izdelava povzetka za javnost	7	Sre 14.5.14	Sre 21.5.14	90ZZ
92	Objava javnega naznanila	3	Sre 21.5.14	Sob 24.5.14	90;91;87
93	Predstavitev oDPN, SP, PVO in osnutka OVS občinam in predstavnikom javnosti	1 potdni	Sre 21.5.14	Čet 22.5.14	90;91
94	Posredovanje osnutka DPN, PVO in osnutka OVS občinam	3 dnevi	Pet 23.5.14	Tor 27.5.14	93
95	JR in JO	30	Sob 31.5.14	Pon 30.6.14	92KZ+7
96	Pripombe in predlogi javnosti	30	Sob 31.5.14	Pon 30.6.14	92KZ+7
97	Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Sob 31.5.14	Pon 30.6.14	92KZ+7
98	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS (opcija)	1 dan	Pon 2.6.14	Pon 2.6.14	92KZ+7
99	Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sektorju za PVO	30	Čet 5.6.14	Sob 5.7.14	95ZZ+5 ;96ZZ+5 ;97ZZ+5
100	Priprava in uskladitev stališč do pripomb	45	Pet 20.6.14	Pon 4.8.14	99KZ-15
101	Podpis in objava stališč do pripomb na spletu ter posredovanje občinam	1 potdni	Pon 4.8.14	Tor 5.8.14	100
102	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**113 dnevi**	**Ned 20.7.14**	**Sre 24.12.14**	
103	Dopolnitev strokovnih podlag	45	Ned 20.7.14	Sre 3.9.14	100ZZ+30
104	Izdelava predloga DPN	30	Ned 24.8.14	Tor 23.9.14	103ZZ+20
105	Dopolnitev PVO	15	Sre 3.9.14	Čet 18.9.14	103
106	Preveritev PVO	14	Čet 18.9.14	Čet 2.10.14	105
107	Pregled in potrditev predloga DPN	7	Tor 23.9.14	Tor 30.9.14	104
108	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	10	Tor 30.9.14	Pet 10.10.14	107
109	**IZDELAVA INVESTICIJSKE ZASNOVE (opcija)**	**86 dnevi**	**Tor 26.8.14**	**Sre 24.12.14**	
110	Izdelava investicijske zasnove (IZ)	60	Tor 26.8.14	Sob 25.10.14	108ZZ+15
111	Potrditev IZ na Komisiji za potrjevanje investicijske dokumentacije	60	Sob 25.10.14	Sre 24.12.14	110
112	**PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS**	**55 dnevi**	**Pon 13.10.14**	**Pet 26.12.14**	
113	Posredovanje vseh vlog	1 dan	Pon 13.10.14	Pon 13.10.14	108
114	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pon 13.10.14	Sre 12.11.14	113
115	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pon 13.10.14	Sre 12.11.14	113
116	Pridobitev odločbe o OVS	30	Sre 12.11.14	Pet 12.12.14	115
117	Pravnomočnost odločbe o OVS (zaključek postopka PVO)	14	Pet 12.12.14	Pet 26.12.14	116
118	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	14	Sre 12.11.14	Sre 26.11.14	114;115
119	Posredovanje mnenj NUP investitorju	30	Sob 18.10.14	Pon 17.11.14	114ZZ+5 ;115ZZ
120	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	30	Sre 12.11.14	Pet 12.12.14	119ZZ+15 dnevi
121	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Tor 2.12.14	Pet 12.12.14	120ZZ
122	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**48 dnevi**	**Čet 11.12.14**	**Pon 16.2.15**	
123	Priprava gradiva za vlado	5 dnevi	Čet 11.12.14	Sre 17.12.14	121ZZ+5
124	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	2 dnevi	Čet 18.12.14	Pet 19.12.14	123
125	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 12.12.14	Pet 26.12.14	121
126	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 26.12.14	Pet 9.1.15	125;111
127	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	2	Pet 9.1.15	Ned 11.1.15	126
128	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 12.1.15	Pon 12.1.15	127
129	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	7	Pon 12.1.15	Pon 19.1.15	128
130	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Pon 19.1.15	Pon 2.2.15	129
131	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Pon 2.2.15	Pon 16.2.15	130
132	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	8 dnevi	Tor 20.1.15	Čet 29.1.15	129
133	Izdelava povzetka za javnost	5	Pon 19.1.15	Sob 24.1.15	129
134	Izdelava končnih elaboratov DPN	20	Pon 19.1.15	Ned 8.2.15	130KZ-14 dnevi
135	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5 dnevi	Pon 9.2.15	Pet 13.2.15	134
