TP po ZUPUDPP-A za DPN SREDIŠČE OB DRAVI - postopek s CPVO in brez PVO

september 2012
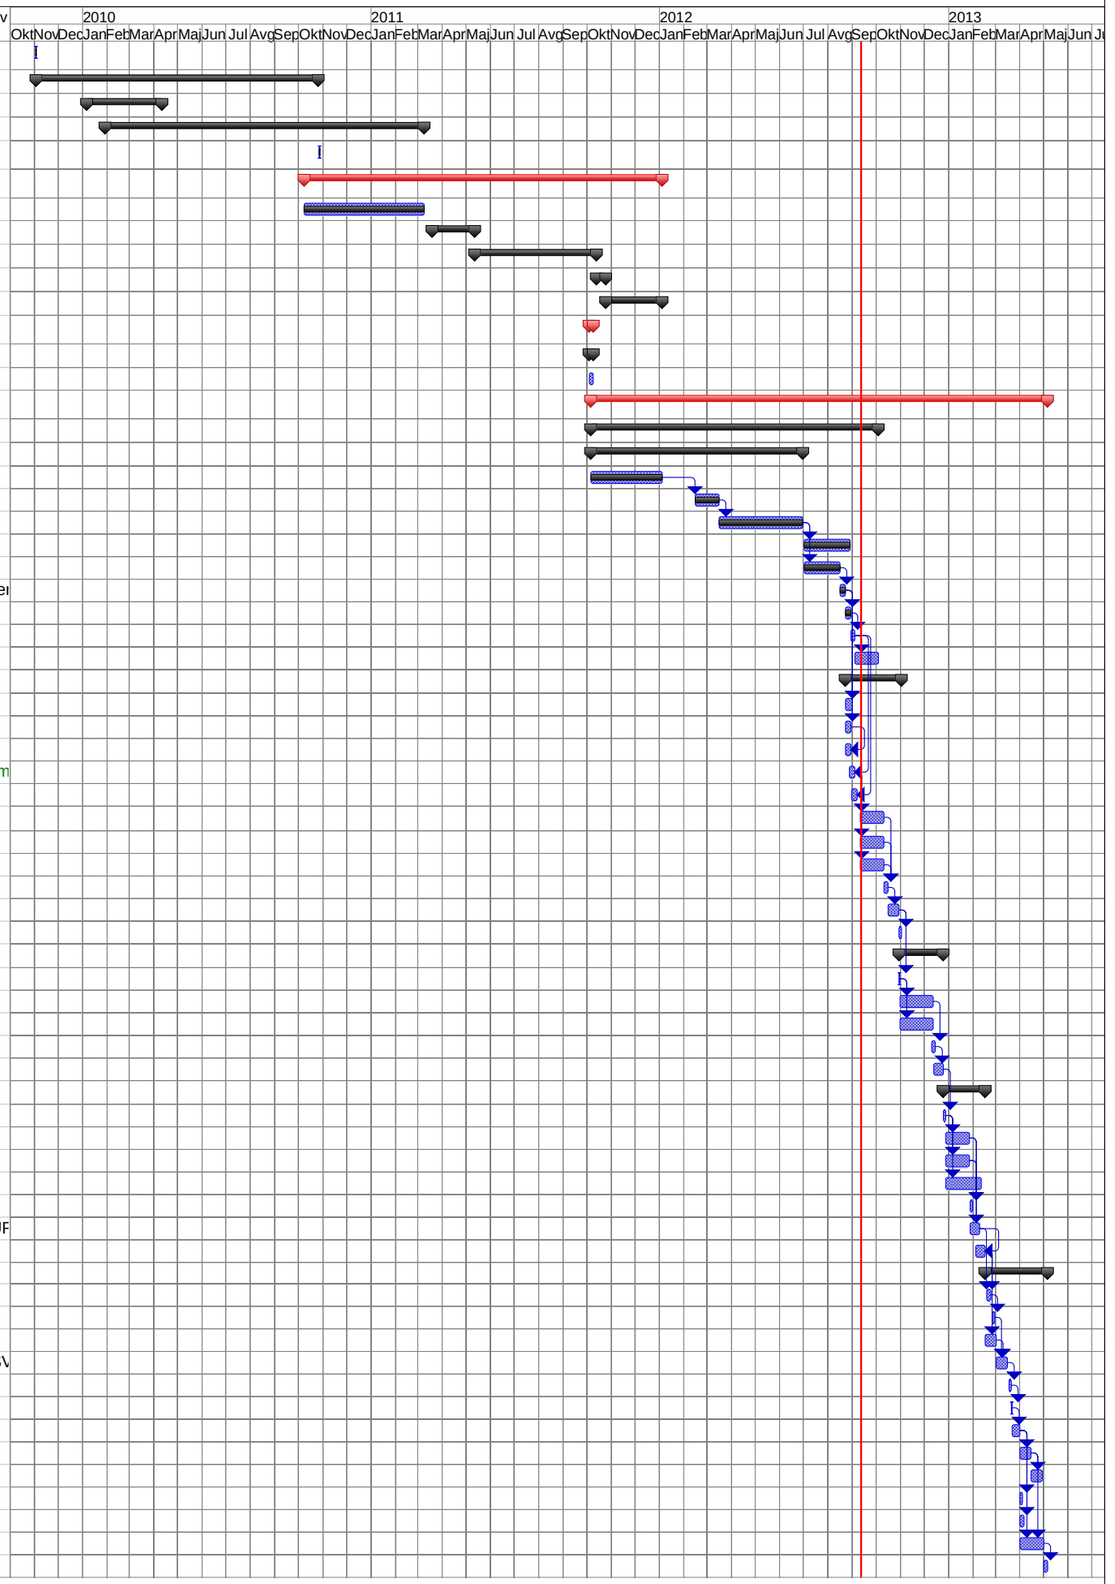
ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
1	**Postopek po ZPNačrt**	1 dan	Pon 2.11.09	Pon 2.11.09		
2	**PRESOJA POBUDE**	**255 dnevi**	**Tor 3.11.09**	**Pon 25.10.10**		
5	**SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**68 dnevi**	**Tor 5.1.10**	**Sob 10.4.10**		
14	**OSNUTEK DPN**	**289 dnevi**	**Čet 28.1.10**	**Tor 8.3.11**		
25	**Uveljavitev ZUPUDPP**	1 dan	Sre 27.10.10	Sre 27.10.10		
26	**POBUDA**	**324 dnevi**	**Pet 8.10.10**	**Tor 3.1.12**		
27	Dopolnitev strokovnih podlag za izdelavo osnutka DPN (dopolnitev pobude)	109 dnevi	Pet 8.10.10	Tor 8.3.11	23	
28	**USKLADITEV POBUDE IN DIIP**	**38 dnevi**	**Pet 18.3.11**	**Sre 11.5.11**		
32	**PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI, ODLOČBE O CPVO**	**110 dnevi**	**Čet 12.5.11**	**Sre 12.10.11**		
44	**IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE**	**8 dnevi**	**Čet 13.10.11**	**Pon 24.10.11**		
49	**SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN**	**51 dnevi**	**Tor 25.10.11**	**Tor 3.1.12**		
58	**ŠTUDIJA VARIANT - Utemeljitev rešitve**	**4 dnevi**	**Pon 3.10.11**	**Sob 8.10.11**	40	
59	**IZDELAVA ŠV - UTEMELJITEV REŠITVE (ŠV)**	**4 dnevi**	**Pon 3.10.11**	**Sob 8.10.11**	40	
60	Izdelava ŠV - Utemeljitev rešitve	5	Pon 3.10.11	Sob 8.10.11	40	IZ
61	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**412 dnevi**	**Sre 5.10.11**	**Ned 5.5.13**		
62	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**260 dnevi**	**Sre 5.10.11**	**Sre 3.10.12**		
63	**Izdelava podrobnih strokovnih podlag**	**192 dnevi**	**Sre 5.10.11**	**Pet 29.6.12**	40	**IZ**
64	**Izdelava IDP**	90	Sre 5.10.11	Tor 3.1.12	40KZ+2 dnevi	
65	Recenzija IDP	30	Tor 14.2.12	Čet 15.3.12	64	
66	Popravki IDP po recenziji	106	Čet 15.3.12	Pet 29.6.12	65	
67	Izdelava OP	42 dnevi	Pon 2.7.12	Tor 28.8.12	66	IZ
68	Izdelava osnutka DPN	33 dnevi	Pon 2.7.12	Sre 15.8.12	66	IZ
69	Pregled osnutka DPN	5 dnevi	Čet 16.8.12	Sre 22.8.12	68	K;recenzen
70	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	5 dnevi	Čet 23.8.12	Sre 29.8.12	69	IZ
71	Vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti OP	3 dnevi	Čet 30.8.12	Pon 3.9.12	70	
72	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Pon 3.9.12	Sre 3.10.12	71	SPVO
73	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + MNENJE OBČIN**	**51 dnevi**	**Čet 23.8.12**	**Čet 1.11.12**		
74	Organizacija JR in JO	7 dnevi	Čet 23.8.12	Pet 31.8.12	69	K;občine
75	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5 dnevi	Čet 23.8.12	Sre 29.8.12	69	K;IN
76	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Čet 23.8.12	Sre 29.8.12	75ZZ	IZ
77	Objava javnega naznanila	5 dnevi	Tor 28.8.12	Pon 3.9.12	71ZZ	K;izbran m
78	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	5 dnevi	Pet 31.8.12	Čet 6.9.12	71ZZ+3 dnevi	K
79	JR in JO	30	Pon 10.9.12	Sre 10.10.12	77KZ+7	K
80	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pon 10.9.12	Sre 10.10.12	77KZ+7	javnost
81	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Pon 10.9.12	Sre 10.10.12	77KZ+7	LNUP
82	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalcu t	3 dnevi	Čet 11.10.12	Pon 15.10.12	79;80;81	K
83	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	10 dnevi	Tor 16.10.12	Pon 29.10.12	82	K;IZ;IN;P
84	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	3 dnevi	Tor 30.10.12	Čet 1.11.12	83	K
85	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**40 dnevi**	**Tor 30.10.12**	**Pon 24.12.12**		
86	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	1 dan	Tor 30.10.12	Tor 30.10.12	83	IZ
87	Izdelava predloga DPN	30 dnevi	Sre 31.10.12	Tor 11.12.12	86	IZ
88	Preveritev/dopolnitev OP	30 dnevi	Sre 31.10.12	Tor 11.12.12	86	SPVO
89	Pregled predloga DPN	5 dnevi	Pon 10.12.12	Pet 14.12.12	87KZ-2 dnevi	K
90	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	8 dnevi	Čet 13.12.12	Pon 24.12.12	89KZ-2 dnevi	IZ
91	**PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIV**	**39 dnevi**	**Tor 25.12.12**	**Pet 15.2.13**		
92	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Tor 25.12.12	Čet 27.12.12	90	K
93	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Čet 27.12.12	Sob 26.1.13	92	DNUP
94	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Čet 27.12.12	Sob 26.1.13	92	DNUP
95	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	45	Čet 27.12.12	Ned 10.2.13	92	SCPVO
96	Posredovanje mnenj NUP investitorju	3 dnevi	Pon 28.1.13	Sre 30.1.13	93;94	K
97	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10 dnevi	Pon 28.1.13	Pet 8.2.13	93;94	K;IZ;DNUP
98	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10 dnevi	Pon 4.2.13	Pet 15.2.13	97ZZ+5 dnevi	IZ;K
99	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**55 dnevi**	**Pet 15.2.13**	**Ned 5.5.13**		
100	Priprava gradiva za vlado	5 dnevi	Pon 18.2.13	Pet 22.2.13	98;97	K
101	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3 dnevi	Pon 25.2.13	Sre 27.2.13	100	K;IN
102	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 15.2.13	Pet 1.3.13	98	lektorji
103	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 1.3.13	Pet 15.3.13	101;102	P;K;MF;SV
104	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	3 dnevi	Pon 18.3.13	Sre 20.3.13	103	K
105	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Sre 20.3.13	Čet 21.3.13	104	vlada
106	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Čet 21.3.13	Ned 31.3.13	105	vlada
107	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Ned 31.3.13	Ned 14.4.13	106	vlada
108	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Ned 14.4.13	Ned 28.4.13	107	
109	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3	Ned 31.3.13	Sre 3.4.13	106	vlada;K
110	Izdelava povzetka za javnost	5	Ned 31.3.13	Pet 5.4.13	106	IZ
111	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Ned 31.3.13	Tor 30.4.13	106;107KZ-14 d	IZ
112	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5	Tor 30.4.13	Ned 5.5.13	111	K
