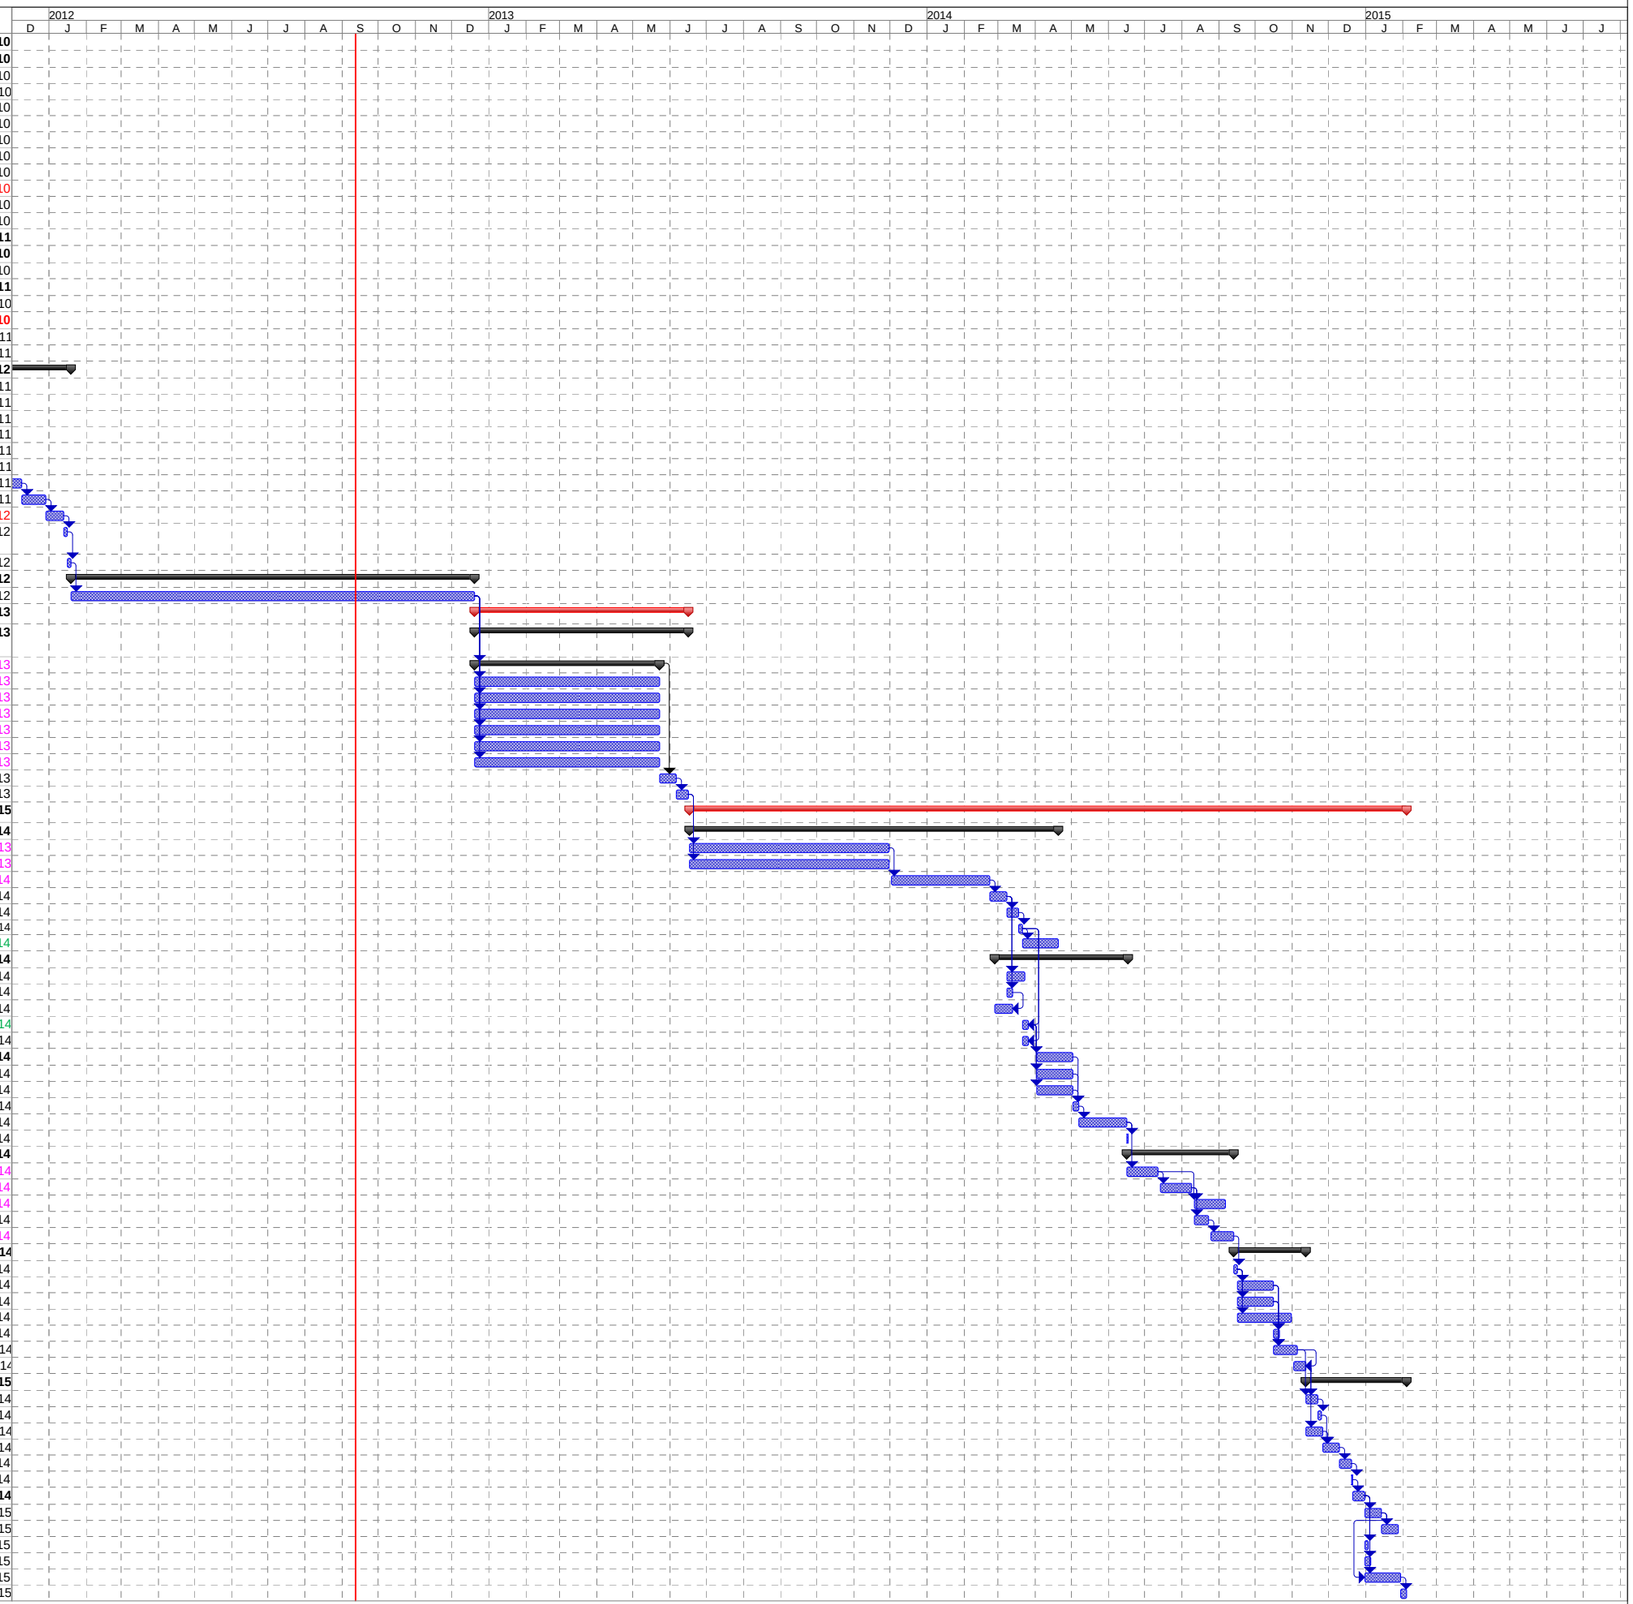ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek
1	**POBUDA MINISTRA ZA GOSPODARSTVO**	**1 dan**	**Pon 18.1.10**	**Pon 18.1.10**
2	**SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (D**	**149 dnevi**	**Tor 19.1.10**	**Sob 14.8.10**
3	Presoja pobude	50 dnevi	Tor 19.1.10	Pon 29.3.10
4	Priprava osnutka Sklepa o začetku priprave DPN - gradivo za Vlado RS	29	Pon 29.3.10	Tor 27.4.10
5	Uskladitev Sklepa - gradiva za Vlado RS - vsebinsko, z investitorjem, zainteres	19	Tor 27.4.10	Ned 16.5.10
6	Uskladitev s pobudnikom	21	Ned 16.5.10	Ned 6.6.10
7	Uskladitev gradiva z MF	32	Ned 16.5.10	Čet 17.6.10
8	Uskladitev gradiva s SVZ	32	Ned 16.5.10	Čet 17.6.10
9	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	16 dnevi	Pet 18.6.10	Pet 9.7.10
10	Obravnava in sprejem Sklepa na Vladi RS	6	Pet 9.7.10	Čet 15.7.10
11	Objava Sklepa na spletni strani MOP	2 dnevi	Pet 16.7.10	Pon 19.7.10
12	Seznanitev s sklepom in pridobitev razvojnih potreb RRA	30	Čet 15.7.10	Sob 14.8.10
13	**OSNUTEK DPN**	**125 dnevi**	**Sob 14.8.10**	**Čet 3.2.11**
14	**IZDELAVA OSNUTKA DPN (oDPN)**	**53 dnevi**	**Sob 14.8.10**	**Sre 27.10.10**
15	Izdelava osnutka DPN	74	Sob 14.8.10	Sre 27.10.10
16	**SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (NUP)**	**73 dnevi**	**Sre 27.10.10**	**Čet 3.2.11**
17	Pridobitev smernic NUP in Odločbe o CPVO	55	Sre 27.10.10	Tor 21.12.10
18	**ZUPUDPP**	**1 dan**	**Sre 27.10.10**	**Sre 27.10.10**
19	posredovanje smernic izdelovalcu DPN	14	Tor 21.12.10	Tor 4.1.11
20	pregled in pridobitev dopolnitev smernic	30	Tor 4.1.11	Čet 3.2.11
21	**NOV SKLEP O PRIPRAVI DPN**	**249 dnevi**	**Čet 3.2.11**	**Sre 18.1.12**
22	Analiza smernic in usmeritve za prostorsko načrtovanje	107	Čet 3.2.11	Sob 21.5.11
23	Dopolnitev analize smernic in usmeritve za prostorsko načrtovanje	100	Sob 21.5.11	Pon 29.8.11
24	Priprava osnutka Sklepa o pripravi DPN - gradivo za Vlado RS	14	Pon 29.8.11	Pon 12.9.11
25	Prostorska konferenca - 21.10.2011	1 dan	Pet 21.10.11	Pet 21.10.11
26	Dopolnitev osnutka Sklepa o pripravi DPN	27	Pet 21.10.11	Čet 17.11.11
27	Prostorska konferenca - 18.11.2011	1 potdni	Čet 17.11.11	Pet 18.11.11
28	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14 dnevi	Pon 21.11.11	Čet 8.12.11
29	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	14 dnevi	Pet 9.12.11	Sre 28.12.11
30	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	15	Sre 28.12.11	Čet 12.1.12
31	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3	Čet 12.1.12	Ned 15.1.12
32	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Ned 15.1.12	Sre 18.1.12
33	**IZBOR IZDELOVALCA**	**240 dnevi**	**Čet 19.1.12**	**Sre 19.12.12**
34	Izbor izdelovalca: PN, javna naročila, podpis pogodbe	240 dnevi	Čet 19.1.12	Sre 19.12.12
35	**ŠTUDIJA VARIANT**	**127 dnevi**	**Čet 20.12.12**	**Sob 15.6.13**
36	**IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)**	**127 dnevi**	**Čet 20.12.12**	**Sob 15.6.13**
37	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	110 dnevi	Čet 20.12.12	Sre 22.5.13
38	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	110 dnevi	Čet 20.12.12	Sre 22.5.13
39	Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik)	110 dnevi	Čet 20.12.12	Sre 22.5.13
40	Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidik)	110 dnevi	Čet 20.12.12	Sre 22.5.13
41	Izdelava okoljskega elaborata (varstveni vidik)	110 dnevi	Čet 20.12.12	Sre 22.5.13
42	Izdelava ocene sprejemljivosti v lokalnem okolju	110 dnevi	Čet 20.12.12	Sre 22.5.13
43	Izdelava okoljskega poročila (OP)	110 dnevi	Čet 20.12.12	Sre 22.5.13
44	Pregled ŠV/PIZ	14	Sre 22.5.13	Sre 5.6.13
45	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	10	Sre 5.6.13	Sob 15.6.13
46	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**427 dnevi**	**Pon 17.6.13**	**Tor 3.2.15**
47	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**220 dnevi**	**Pon 17.6.13**	**Sob 19.4.14**
48	Izdelava strokovnih podlag	120 dnevi	Pon 17.6.13	Pet 29.11.13
49	Dopolnitev OP	120 dnevi	Pon 17.6.13	Pet 29.11.13
50	Izdelava osnutka DPN	60 dnevi	Pon 2.12.13	Pet 21.2.14
51	Pregled osnutka DPN	14	Pet 21.2.14	Pet 7.3.14
52	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Pet 7.3.14	Pon 17.3.14
53	Vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti OP	3	Pon 17.3.14	Čet 20.3.14
54	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Čet 20.3.14	Sob 19.4.14
55	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + 2. MNENJE OBČIN**	**79 dnevi**	**Tor 25.2.14**	**Pon 16.6.14**
56	Organizacija JR in JO	15	Pet 7.3.14	Sob 22.3.14
57	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Pet 7.3.14	Sre 12.3.14
58	Izdelava povzetka za javnost	15	Tor 25.2.14	Sre 12.3.14
59	Objava javnega naznanila	5	Čet 20.3.14	Tor 25.3.14
60	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	5	Čet 20.3.14	Tor 25.3.14
61	**JR in JO**	**30**	**Tor 1.4.14**	**Čet 1.5.14**
62	Pripombe in predlogi javnosti	30	Tor 1.4.14	Čet 1.5.14
63	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Tor 1.4.14	Čet 1.5.14
64	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, invsetitorju in izdel	5	Čet 1.5.14	Tor 6.5.14
65	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	40	Tor 6.5.14	Ned 15.6.14
66	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Ned 15.6.14	Pon 16.6.14
67	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**65 dnevi**	**Pon 16.6.14**	**Pet 12.9.14**
68	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	20 dnevi	Pon 16.6.14	Pet 11.7.14
69	Izdelava predloga DPN	20 dnevi	Pon 14.7.14	Pet 8.8.14
70	Preveritev/dopolnitev OP	20 dnevi	Pon 11.8.14	Pet 5.9.14
71	Pregled predloga DPN	10 dnevi	Pon 11.8.14	Pet 22.8.14
72	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	15 dnevi	Pon 25.8.14	Pet 12.9.14
73	**PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOST**	**42 dnevi**	**Pet 12.9.14**	**Tor 11.11.14**
74	Posredovanje vseh vlog	3	Pet 12.9.14	Pon 15.9.14
75	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pon 15.9.14	Sre 15.10.14
76	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pon 15.9.14	Sre 15.10.14
77	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	45	Pon 15.9.14	Čet 30.10.14
78	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Sre 15.10.14	Pon 20.10.14
79	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	20	Sre 15.10.14	Tor 4.11.14
80	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Sob 1.11.14	Tor 11.11.14
81	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**60 dnevi**	**Tor 11.11.14**	**Tor 3.2.15**
82	Priprava gradiva za vlado	10	Tor 11.11.14	Pet 21.11.14
83	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pet 21.11.14	Pon 24.11.14
84	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Tor 11.11.14	Tor 25.11.14
85	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Tor 25.11.14	Tor 9.12.14
86	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Tor 9.12.14	Pet 19.12.14
87	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Pet 19.12.14	Sob 20.12.14
88	**Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN**	**10**	**Sob 20.12.14**	**Tor 30.12.14**
89	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Tor 30.12.14	Tor 13.1.15
90	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Tor 13.1.15	Tor 27.1.15
91	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3	Tor 30.12.14	Pet 2.1.15
92	Izdelava povzetka za javnost	5	Tor 30.12.14	Ned 4.1.15
93	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Tor 30.12.14	Čet 29.1.15
94	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5	Čet 29.1.15	Tor 3.2.15
