TERMINSKI PLAN priprave DPN za hitro cesto Koper-Dragonja

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
1	**POBUDA**	**258 dnevi**	**Sre 21.4.04**	**Pet 15.4.05**		
2	Prejem usklajene pobude	1 dan	Sre 21.4.04	Sre 21.4.04		K
3	Program priprave	57 dnevi	Čet 22.4.04	Pet 9.7.04	2	
4	Odločba o CPVO	1 dan	Pet 15.4.05	Pet 15.4.05		
5	**PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI**	**105 dnevi**	**Čet 22.4.04**	**Sre 15.9.04**		
6	Izdelava gradiva za pridobitev smernic	66 dnevi	Čet 22.4.04	Čet 22.7.04	2	
7	Pridobitev smernic, usmeritev, podatov NUP	39 dnevi	Pet 23.7.04	Sre 15.9.04	6	DNUP;
8	**ŠTUDIJA VARIANT**	**2112 dnevi**	**Čet 16.9.04**	**Čet 18.10.12**		
9	Izdelava strokovnih podlag	180 dnevi	Čet 16.9.04	Sre 25.5.05	7	
10	Izdelava ŠV in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	180 dnevi	Čet 26.5.05	Sre 1.2.06	9	IZ
11	Izdelava ŠV: izdelava poročila o sprejemljivosti v lokalnem okolju (1. mapa,	145 dnevi	Čet 2.2.06	Sre 23.8.06	10	investitor
12	Recenzija ŠV, PNV in revizija OP (rOP)	24 dnevi	Čet 24.8.06	Tor 26.9.06	11	MOP DP
13	Dopolnitev OP po reviziji	22 dnevi	Sre 27.9.06	Čet 26.10.06	12	investitor
14	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	10 dnevi	Pet 27.10.06	Čet 9.11.06	13	IZ
15	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Čet 9.11.06	Sob 9.12.06	14	SCPVO
16	**JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV IN OP + 1. MNENJE OBČIN**	**153 dnevi**	**Pon 11.12.06**	**Sre 11.7.07**		
17	Organizacija javne razgrnitve, izdelava gradiv za JR	47 dnevi	Pon 11.12.06	Tor 13.2.07	15	
18	Objava javnega naznanila	2 dnevi	Sre 14.2.07	Čet 15.2.07	17	K;izbran medij
19	JR in JO	30	Čet 22.2.07	Sob 24.3.07	18KZ+7	K
20	Pripombe in predlogi javnosti	30	Čet 22.2.07	Sob 24.3.07	18KZ+7	javnost
21	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb	47	Sob 24.3.07	Čet 10.5.07	20	K;P;IN;IZ
22	Dopolnitev strokovnih podlag in ŠV/PIZ s PNV	34 dnevi	Pet 11.5.07	Sre 27.6.07	21	IZ
23	Dopolnitev OP	44	Pon 28.5.07	Sre 11.7.07	22ZZ+10 d	
24	**SPREJEM ZPNačrt**	**0 dnevi**	**Pet 13.4.07**	**Pet 13.4.07**		
25	**IZDELAVA OSNUTKA DPN**	**1144 dnevi**	**Čet 12.7.07**	**Pon 28.11.11**		
26	Izdelava gradiva za dopolnitev smernic	55 dnevi	Čet 12.7.07	Sre 26.9.07	23	
27	Doplnitev smernic	38	Sre 26.9.07	Sob 3.11.07	26	
28	Izbor izdelovalca DPN	158 dnevi	Pon 5.11.07	Sre 11.6.08	27	
29	Izdelava strokovnih podlag za DPN, dodatne preveritve	348 dnevi	Čet 12.6.08	Pon 12.10.09	28	
30	Recenzija strokovnih podlag	777	Pon 12.10.09	Pon 28.11.11	29	
31	**PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJ**	**316 dnevi**	**Tor 21.12.10**	**Tor 6.3.12**		
32	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV	1 dan	Tor 21.12.10	Tor 21.12.10		
33	Posredovanje vseh vlog	1 dan	Sre 29.6.11	Sre 29.6.11		K
34	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše nač	120	Sre 29.6.11	Čet 27.10.11	33	K
35	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	45	Sob 17.9.11	Tor 1.11.11	34ZZ+5	K
36	Analiza prvih mnenj in uskladitev rešitev z NUP	140 dnevi	Sre 24.8.11	Tor 6.3.12	35ZZ+90 dr	
37	**SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI PNV**	**252 dnevi**	**Sre 2.11.11**	**Čet 18.10.12**		
38	Priprava gradiva za vlado	94 dnevi	Sre 2.11.11	Pon 12.3.12	35	K
39	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	120 dnevi	Tor 13.3.12	Pon 27.8.12	38	K;IN
40	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pon 27.8.12	Pon 10.9.12	39	K;MF;SVZ;P
41	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	21	Pon 10.9.12	Pon 1.10.12	40	K
42	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Tor 2.10.12	Tor 2.10.12	41	vlada
43	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	10	Tor 2.10.12	Pet 12.10.12	42	vlada
44	Posredovanje sklepa koordinatroju, pobudniku, investiroju, vsem NUP	3	Pet 12.10.12	Pon 15.10.12	43	vlada
45	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Pon 15.10.12	Čet 18.10.12	44	K
46	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**2578 dnevi?**	**Sre 21.4.04**	**Čet 6.3.14**		
47	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA**	**303 dnevi**	**Tor 6.3.12**	**Pet 3.5.13**		
48	Podpis pogodbe za izdelavo študije ravnanja z viški materiala (zaključek 17.9.2012)	1 dan	Pon 17.9.12	Pon 17.9.12		
49	Izdelava študije ravnanja z viški materiala	120	Pon 17.9.12	Tor 15.1.13	48	
50	*Popravki strokovnih podlag po recenziji*	*170*	*Tor 6.3.12*	*Čet 23.8.12*	*30;36*	
51	Izdelava poročila o vplivih na okolje (PVO)	45	Tor 15.1.13	Pet 1.3.13	50;49	IZ
52	Izdelava osnutka DPN	45	Tor 15.1.13	Pet 1.3.13	50;49	IZ
53	Recenzija poročila o vplivih na okolje (PVO)	20	Pet 1.3.13	Čet 21.3.13	51	IN[50%];recenzent[50%]
54	pregled osnutka DPN	10	Pet 1.3.13	Pon 11.3.13	52	K
55	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Pon 11.3.13	Čet 21.3.13	54	IZ
56	Dopolnitev poročila o vplivih na okolje (PVO) po recenziji	10	Čet 21.3.13	Ned 31.3.13	53	IZ
57	Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	3 dnevi	Pon 1.4.13	Sre 3.4.13	56;55	IN
58	Pridobitev osnutka OVS	30	Sre 3.4.13	Pet 3.5.13	57	SPVO
59	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJI**	**90 dnevi**	**Sre 6.3.13**	**Sre 10.7.13**		

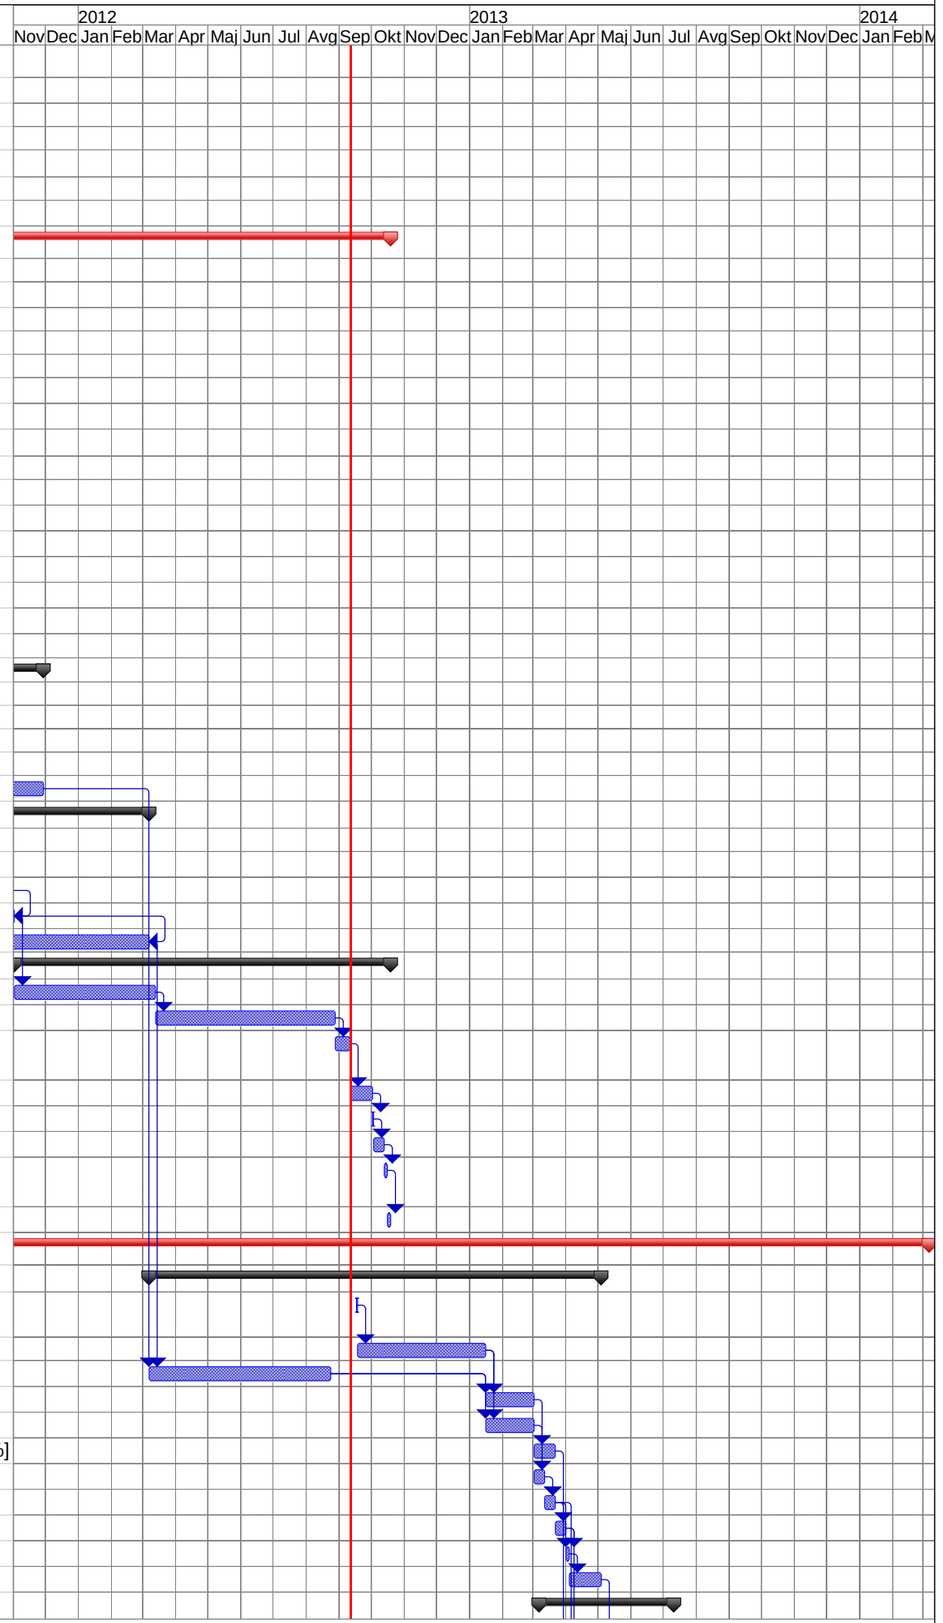

TERMINSKI PLAN priprave DPN za hitro cesto Koper-Dragonja
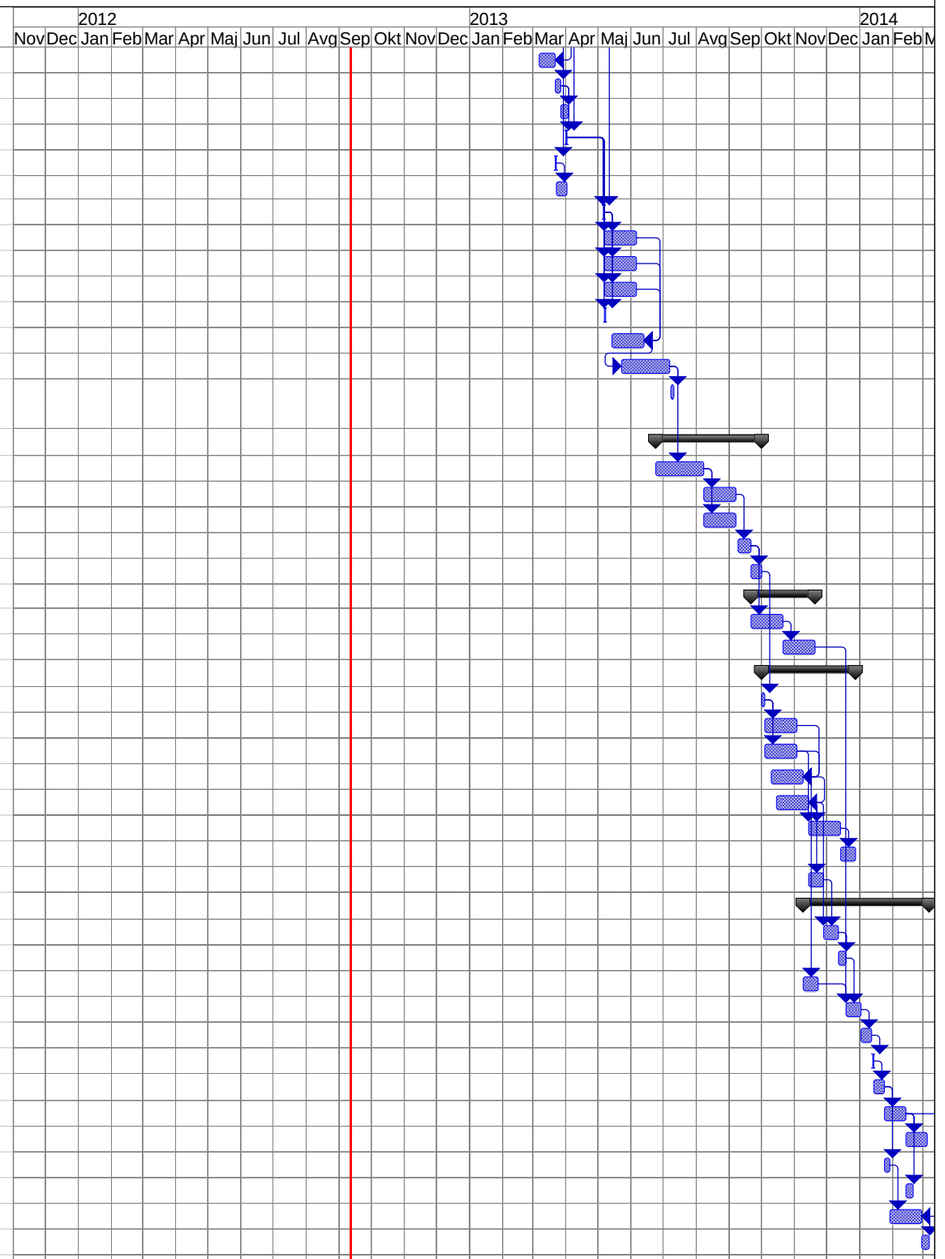
ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
60	Organizacija JR in JO	15	Sre 6.3.13	Čet 21.3.13	55ZZ	K;občine
61	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Čet 21.3.13	Tor 26.3.13	60	K;IN
62	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Sre 27.3.13	Tor 2.4.13	61	IZ
63	Objava javnega naznanila	1 dan	Pon 1.4.13	Pon 1.4.13	61;56	K;izbran medij
64	Predstavitev rešitve občinam in predstavnikom javnosti	1 potdni	Čet 21.3.13	Pet 22.3.13	55	P;K;IN;IZ
65	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10	Pet 22.3.13	Pon 1.4.13	64	P;K;IN;IZ
66	Posredovanje predloga DPN, PVO občinam	1 dan	Pon 6.5.13	Pon 6.5.13	63;58	K
67	JR in JO	30	Pon 6.5.13	Sre 5.6.13	63KZ+7 ;6	K
68	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pon 6.5.13	Sre 5.6.13	63KZ+7 ;6	javnost
69	Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Pon 6.5.13	Sre 5.6.13	63KZ+7 ;6	LNUP
70	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS (opcija)	1 dan	Tor 7.5.13	Tor 7.5.13	63KZ+7 ;6	javnost
71	Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenj pobudniku, invse	30	Pon 13.5.13	Sre 12.6.13	69ZZ+5 dr	K
72	Priprava in uskladitev stališč do pripomb in predlogov	45	Čet 23.5.13	Ned 7.7.13	71KZ-15 d	K;IZ;IN;P
73	Podpis in objava stališč na spletu in posredovanje občinam	3 dnevi	Pon 8.7.13	Sre 10.7.13	72	K
74	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**71 dnevi**	**Pon 24.6.13**	**Pon 30.9.13**		
75	Dopolnitev strokovnih podlag	45	Pon 24.6.13	Čet 8.8.13	72KZ-10 d	IZ
76	Izdelava predloga DPN	30	Čet 8.8.13	Sob 7.9.13	75	IZ
77	Dopolnitev PVO	30	Čet 8.8.13	Sob 7.9.13	75	SPVO
78	Pregled predloga DPN	10 dnevi	Pon 9.9.13	Pet 20.9.13	76	K
79	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	10	Pet 20.9.13	Pon 30.9.13	78	IZ
80	**IZDELAVA INVESTICIJSKE ZASNOVE (opcija)**	**42 dnevi**	**Pet 20.9.13**	**Tor 19.11.13**		
81	Izdelava investicijske zasnove (IZ)	30	Pet 20.9.13	Ned 20.10.13	78	IZ
82	Potrditev IZ na Komisji za potrjevanje investicijske dokumentacije	30	Ned 20.10.13	Tor 19.11.13	81	P
83	**PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS**	**64 dnevi**	**Pon 30.9.13**	**Pet 27.12.13**		
84	Posredovanje vseh vlog	3	Pon 30.9.13	Čet 3.10.13	79	K
85	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Čet 3.10.13	Sob 2.11.13	84	DNUP
86	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Čet 3.10.13	Sob 2.11.13	84	DNUP
87	Posredovanje mnenj NUP investitorju	30	Sre 9.10.13	Pet 8.11.13	85ZZ+5 dr	K
88	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	30	Pon 14.10.13	Sre 13.11.13	87ZZ+3 dr	K;IZ;DNUP;IN;P
89	Pridobitev odločbe o OVS	30	Sre 13.11.13	Pet 13.12.13	88;86	SPVO
90	Pravnomočnost odločbe o OVS	14	Pet 13.12.13	Pet 27.12.13	89	
91	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10 dnevi	Čet 14.11.13	Sre 27.11.13	88	IZ;K
92	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**84 dnevi**	**Pet 8.11.13**	**Čet 6.3.14**		
93	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Čet 28.11.13	Sre 11.12.13	91;88	K
94	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Čet 12.12.13	Sre 18.12.13	93	K;IN
95	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 8.11.13	Pet 22.11.13	87	lektorji
96	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnik	14	Sre 18.12.13	Sre 1.1.14	94;95;82	P;K;MF;SVZ
97	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Sre 1.1.14	Sob 11.1.14	96	K
98	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 13.1.14	Pon 13.1.14	97	vlada
99	**Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN**	10	Pon 13.1.14	**Čet 23.1.14**	98	vlada
100	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Pet 24.1.14	Sre 12.2.14	99	vlada
101	Uveljavitev uredbe o DPN	14 dnevi	Čet 13.2.14	Tor 4.3.14	100	
102	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3 dnevi	Pet 24.1.14	Tor 28.1.14	99	vlada;K
103	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Čet 13.2.14	Sre 19.2.14	100	IZ
104	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Tor 28.1.14	Čet 27.2.14	100ZZ;102	IZ
105	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5 dnevi	Pet 28.2.14	Čet 6.3.14	104	K
106						
107	*Roki iz terminskega plana, ki se nanašajo na aktivnosti oziroma faze,	1 dan?	Sre 21.4.04	Sre 21.4.04		
108	za katere DARS d.d. zagotavlja potrebno dokumentacijo so izvedljivi ob	1 dan?	Sre 21.4.04	Sre 21.4.04		
109	pogoju, da se nemudoma reši vprašanje financiranja nalog s področja	1 dan?	Sre 21.4.04	Sre 21.4.04		
110	prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor med RS in DARS d.d..	1 dan?	Sre 21.4.04	Sre 21.4.04
