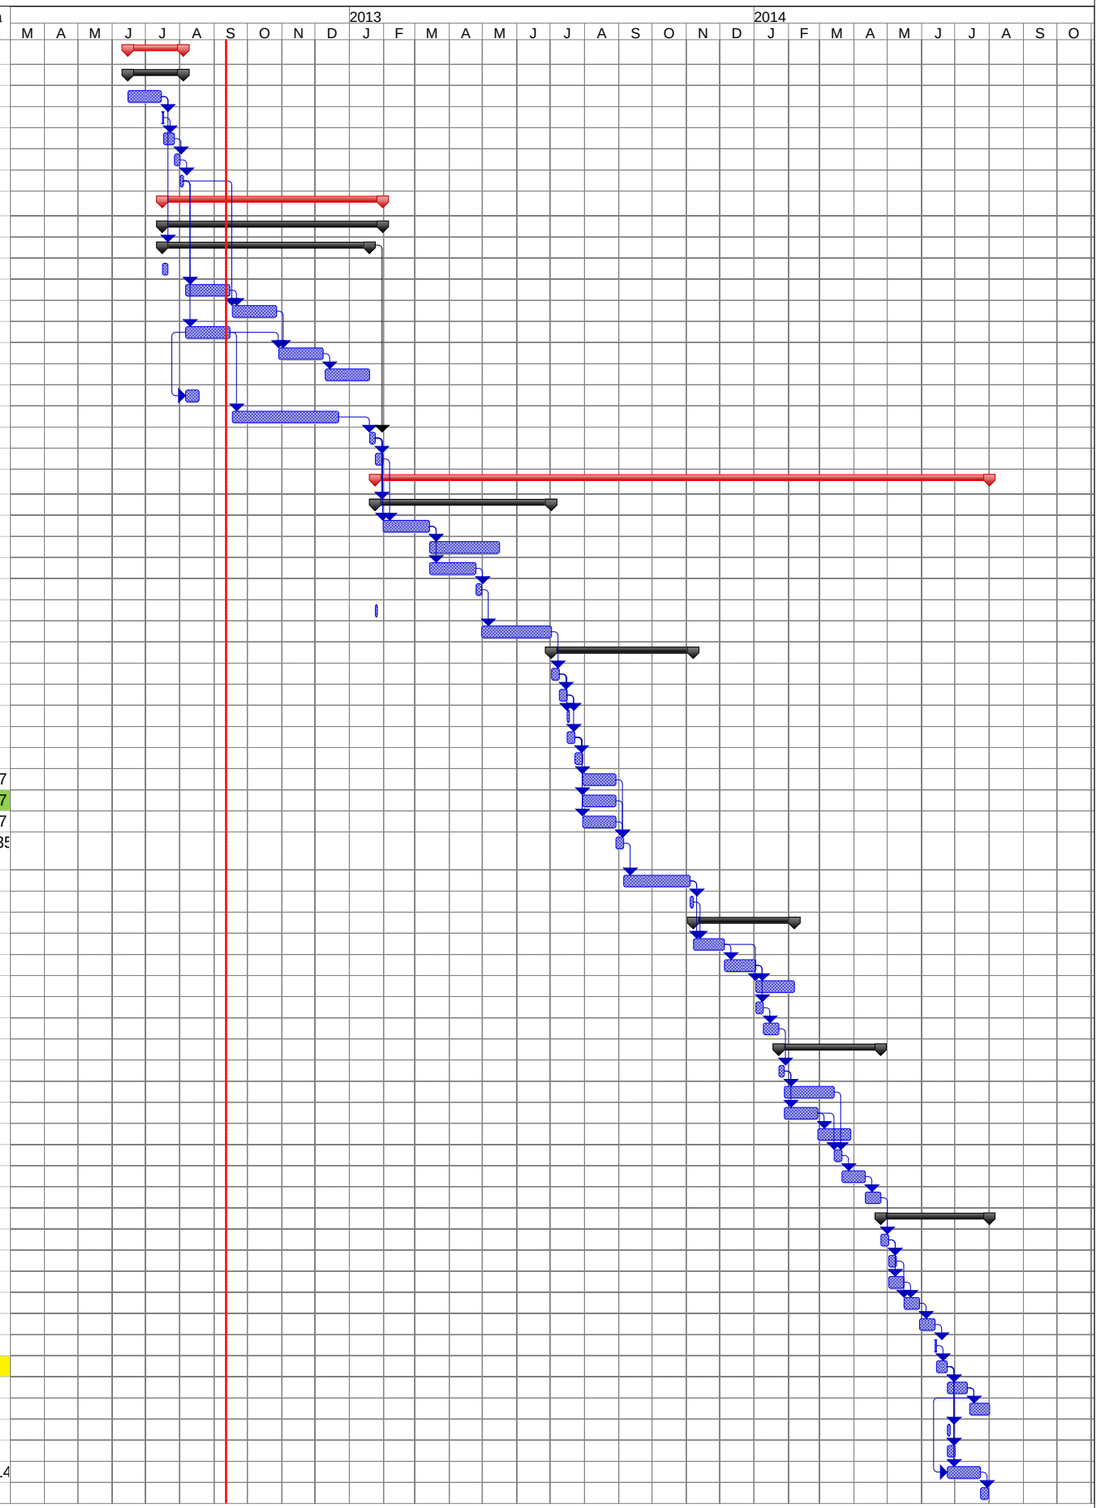ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila
1	**POBUDA**	**36 dnevi**	**Pet 15.6.12**	**Pet 3.8.12**	
2	**SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN**	**36 dnevi**	**Pet 15.6.12**	**Pet 3.8.12**	
3	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	30	Pet 15.6.12	Ned 15.7.12	
4	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 16.7.12	Pon 16.7.12	3
5	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10	Pon 16.7.12	Čet 26.7.12	4
6	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3 dnevi	Pet 27.7.12	Tor 31.7.12	5
7	Objava sklepa na spletni strani MOP	3 dnevi	Sre 1.8.12	Pet 3.8.12	6
8	**ŠTUDIJA VARIANT**	**143 dnevi**	**Pon 16.7.12**	**Sre 30.1.13**	
9	**Izdelava utemeljitve variantne rešitve (ŠV)**	**143 dnevi**	**Pon 16.7.12**	**Sre 30.1.13**	
10	Izdelava ŠV in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	135 dnevi	Pon 16.7.12	Pet 18.1.13	3
11	Izdelava ŠV in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	5 dnevi	Pon 16.7.12	Pet 20.7.12	
12	Izdelava strokovnih podlag - IdR	30 dnevi	Pon 6.8.12	Pet 14.9.12	7
13	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik) - 1	30 dnevi	Pon 17.9.12	Pet 26.10.12	7;12
14	Izdelava okoljskega elaborata (varstveni vidik) - 2	30 dnevi	Pon 6.8.12	Pet 14.9.12	7
15	Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik) - 3	30 dnevi	Pon 29.10.12	Pet 7.12.12	13;14
16	Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidik) - 4 SINTEZA	30 dnevi	Pon 10.12.12	Pet 18.1.13	15
17	Izdelava ocene sprejemljivosti v lokalnem okolju	10 dnevi	Pon 6.8.12	Pet 17.8.12	14SS
18	Izdelava okoljskega poročila (OP) - vezano na HH in PAR	70 dnevi	Pon 17.9.12	Pet 21.12.12	14
19	pregled ŠV	5	Pet 18.1.13	Sre 23.1.13	10;18
20	Dopolnitev ŠV po pregledu	5 dnevi	Čet 24.1.13	Sre 30.1.13	19
21	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**396 dnevi**	**Čet 24.1.13**	**Čet 31.7.14**	
22	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**113 dnevi**	**Čet 24.1.13**	**Pon 1.7.13**	**19**
23	Izdelava strokovnih podlag - IdP	30 dnevi	Čet 31.1.13	Sre 13.3.13	19;20
24	Dopolnitev OP	45 dnevi	Čet 14.3.13	Sre 15.5.13	23
25	Izdelava osnutka DPN	30 dnevi	Čet 14.3.13	Sre 24.4.13	23
26	Pregled osnutka DPN	5	Sre 24.4.13	Pon 29.4.13	25
27	Predstavitev rešitve občini - 4 občine	2 dnevi	Čet 24.1.13	Pet 25.1.13	
28	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	45 dnevi	Tor 30.4.13	Pon 1.7.13	26
29	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN**	**92 dnevi**	**Tor 2.7.13**	**Sre 6.11.13**	
30	Organizacija JR in JO	5 dnevi	Tor 2.7.13	Pon 8.7.13	28
31	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5 dnevi	Tor 9.7.13	Pon 15.7.13	30
32	Izdelava povzetka za javnost	2 dnevi	Tor 16.7.13	Sre 17.7.13	31;30
33	Objava javnega naznanila	5 dnevi	Tor 16.7.13	Pon 22.7.13	31
34	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	5 dnevi	Tor 23.7.13	Pon 29.7.13	33
35	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pon 29.7.13	Sre 28.8.13	33KZ+7
36	JR in JO	30	Pon 29.7.13	Sre 28.8.13	33KZ+7
37	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Pon 29.7.13	Sre 28.8.13	33KZ+7
38	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalcu ter Sektorju za CPVO	5 dnevi	Čet 29.8.13	Sre 4.9.13	37;36;35
39	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Sre 4.9.13	Ned 3.11.13	38
40	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	3 dnevi	Pon 4.11.13	Sre 6.11.13	39
41	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**65 dnevi**	**Čet 7.11.13**	**Sre 5.2.14**	
42	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	20 dnevi	Čet 7.11.13	Sre 4.12.13	40;39
43	Izdelava predloga DPN	20 dnevi	Čet 5.12.13	Sre 1.1.14	42
44	Preveritev/dopolnitev OP	25 dnevi	Čet 2.1.14	Sre 5.2.14	43;42
45	Pregled (recenzija) predloga DPN	5 dnevi	Čet 2.1.14	Sre 8.1.14	43
46	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	10 dnevi	Čet 9.1.14	Sre 22.1.14	45
47	**PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV**	**66 dnevi**	**Čet 23.1.14**	**Čet 24.4.14**	
48	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Čet 23.1.14	Pon 27.1.14	46
49	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	45	Pon 27.1.14	Čet 13.3.14	48
50	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pon 27.1.14	Sre 26.2.14	48
51	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	30	Sre 26.2.14	Pet 28.3.14	50
52	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5 dnevi	Pet 14.3.14	Čet 20.3.14	49;50
53	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	15 dnevi	Pet 21.3.14	Čet 10.4.14	52
54	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10 dnevi	Pet 11.4.14	Čet 24.4.14	53
55	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**70 dnevi**	**Pet 25.4.14**	**Čet 31.7.14**	
56	Priprava gradiva za vlado	5 dnevi	Pet 25.4.14	Čet 1.5.14	54
57	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Pet 2.5.14	Čet 8.5.14	56
58	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Čet 1.5.14	Čet 15.5.14	56
59	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Čet 15.5.14	Čet 29.5.14	57;58
60	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10 dnevi	Pet 30.5.14	Čet 12.6.14	59
61	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pet 13.6.14	Pet 13.6.14	60
62	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Pet 13.6.14	Pon 23.6.14	61
63	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Tor 24.6.14	Pet 11.7.14	62
64	Uveljavitev uredbe o DPN	14 dnevi	Pon 14.7.14	Čet 31.7.14	63
65	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	2,5 dnevi	Tor 24.6.14	Čet 26.6.14	62
66	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Tor 24.6.14	Pon 30.6.14	62
67	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Tor 24.6.14	Čet 24.7.14	63KZ-14
68	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5 dnevi	Čet 24.7.14	Sre 30.7.14	67
