TP - plinovod Kalce-Vodice

Datum: 10. 9. 2012

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
1	POBUDE MINISTROV ZAINTERESIRANIH RESORJEV (NUP z razvojnimi potrebami)	1 dan	Sre 10.10.07	Sre 10.10.07		zainteresirani resorji
2	SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	123 dnevi	Sre 10.10.07	Pet 28.3.08		
3	**OSNUTEK DPN**	**358 dnevi?**	**Čet 24.1.08**	**Pon 8.6.09**		
4	IZBOR IZDELOVALCA IN IZDELAVA OSNUTKA DPN	197 dnevi?	Čet 24.1.08	Pet 24.10.08		
5	SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (NUP)	153 dnevi	Čet 6.11.08	Pon 8.6.09		
6	**DOPOLNITEV OSNUTKA DPN**	**1374 dnevi**	**Pet 19.12.08**	**Tor 25.3.14**		
7	UTEMELJITEV PREDLAGANEGA KORIDORJA	458 dnevi	Pet 19.12.08	Tor 21.9.10		
8	ZAČASNI UKREP ZA ZAVAROVANJE UREJANJA PROSTORA	46 dnevi	Čet 2.12.10	Čet 3.2.11		
9	SPREMEMBA ZAČASNEGA UKREPA ZA ZAVAROVANJE UREJANJA PROSTORA	83 dnevi	Pon 5.3.12	Sre 27.6.12		
10	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**916 dnevi**	**Sre 22.9.10**	**Tor 25.3.14**		
11	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**719 dnevi**	**Sre 22.9.10**	**Ned 23.6.13**		
12	Izdelava strokovnih podlag	630 dnevi	Sre 22.9.10	Pon 18.2.13	7	IZ
13	Izdelava okoljskega poročila (OP)	630 dnevi	Sre 22.9.10	Pon 18.2.13	7	IZ
14	Izdelava osnutka DPN	20 dnevi	Tor 19.2.13	Pon 18.3.13	12	IZ
15	Pregled osnutka DPN	14	Pon 18.3.13	Pon 1.4.13	14	K
16	**Vključevanje javnosti**	**29 dnevi**	**Tor 2.4.13**	**Pet 10.5.13**		
17	Predstavitev rešitve občinam in predstavnikom javnosti	7 dnevi	Tor 2.4.13	Sre 10.4.13	15	P;K;IN;IZ
18	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10	Sre 10.4.13	Sob 20.4.13	17	P;K;IN;IZ
19	Dopolnitev osnutka v skladu s sprejetimi pripombami občin in javnosti	20	Sob 20.4.13	Pet 10.5.13	18	IN;IZ
20	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Pet 10.5.13	Pon 20.5.13	15;19	IZ
21	Vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti OP	4 dnevi	Tor 21.5.13	Pet 24.5.13	20	K
22	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Pet 24.5.13	Ned 23.6.13	21	SPVO
23	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + MNENJE OBČIN**	**121 dnevi**	**Pet 22.3.13**	**Pon 9.9.13**		
24	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Tor 2.4.13	Pon 22.4.13	15	K;občine
25	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Pon 1.4.13	Sob 6.4.13	15	K;IN
26	Izdelava povzetka za javnost	15	Pet 22.3.13	Sob 6.4.13	25ZZ	IZ
27	Objava javnega naznanila	5	Pet 24.5.13	Sre 29.5.13	21ZZ+3 dnevi	K;izbran medij
28	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	5	Pet 24.5.13	Sre 29.5.13	21ZZ+3 dnevi	K
29	JR in JO	30	Sre 5.6.13	Pet 5.7.13	27KZ+7	K
30	Pripombe in predlogi javnosti	30	Sre 5.6.13	Pet 5.7.13	27KZ+7	javnost
31	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Sre 5.6.13	Pet 5.7.13	27KZ+7	LNUP
32	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalcu ter Sek	5	Pet 5.7.13	Sre 10.7.13	29;30;31	K
33	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Sre 10.7.13	Ned 8.9.13	32	K;IZ;IN;P
34	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Ned 8.9.13	Pon 9.9.13	33	K
35	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**60 dnevi**	**Pon 9.9.13**	**Pet 29.11.13**		
36	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	30 dnevi	Pon 9.9.13	Pet 18.10.13	33	IZ
37	Izdelava predloga DPN	30 dnevi	Pon 9.9.13	Pet 18.10.13	33	IZ
38	Preveritev/dopolnitev OP	30 dnevi	Pon 21.10.13	Pet 29.11.13	36	SPVO
39	Pregled predloga DPN	7 dnevi	Pon 21.10.13	Tor 29.10.13	37	K
40	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	7 dnevi	Sre 30.10.13	Čet 7.11.13	39	IZ
41	**PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV**	**46 dnevi**	**Čet 7.11.13**	**Pet 10.1.14**		
42	Posredovanje vseh vlog	3	Čet 7.11.13	Ned 10.11.13	40	K
43	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Ned 10.11.13	Tor 10.12.13	42	DNUP
44	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Ned 10.11.13	Tor 10.12.13	42	DNUP
45	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	45 dnevi	Pon 11.11.13	Pet 10.1.14	42	SPVO
46	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Tor 10.12.13	Ned 15.12.13	43;44	K
47	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10 dnevi	Sre 11.12.13	Tor 24.12.13	43;44	K;IZ;DNUP;IN;P
48	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Sob 21.12.13	Tor 31.12.13	47ZZ+5 dnevi	IZ;K
49	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**65 dnevi**	**Tor 24.12.13**	**Tor 25.3.14**		
50	Priprava gradiva za vlado	10	Tor 24.12.13	Pet 3.1.14	47	K
51	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pet 3.1.14	Pon 6.1.14	50	K;IN
52	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Tor 31.12.13	Tor 14.1.14	48	lektorji
53	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Tor 14.1.14	Tor 28.1.14	51;52	P;K;MF;SVZ
54	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Tor 28.1.14	Pet 7.2.14	53	K
55	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Pet 7.2.14	Sob 8.2.14	54	vlada
56	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Sob 8.2.14	Tor 18.2.14	55	vlada
57	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Tor 18.2.14	Tor 4.3.14	56	vlada
58	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Tor 4.3.14	Tor 18.3.14	57	
59	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3	Tor 18.2.14	Pet 21.2.14	56	vlada;K
60	Izdelava povzetka za javnost	5	Tor 18.2.14	Ned 23.2.14	56	IZ
61	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Tor 18.2.14	Čet 20.3.14	56;57KZ-14 dn	IZ
62	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5	Čet 20.3.14	Tor 25.3.14	61	K

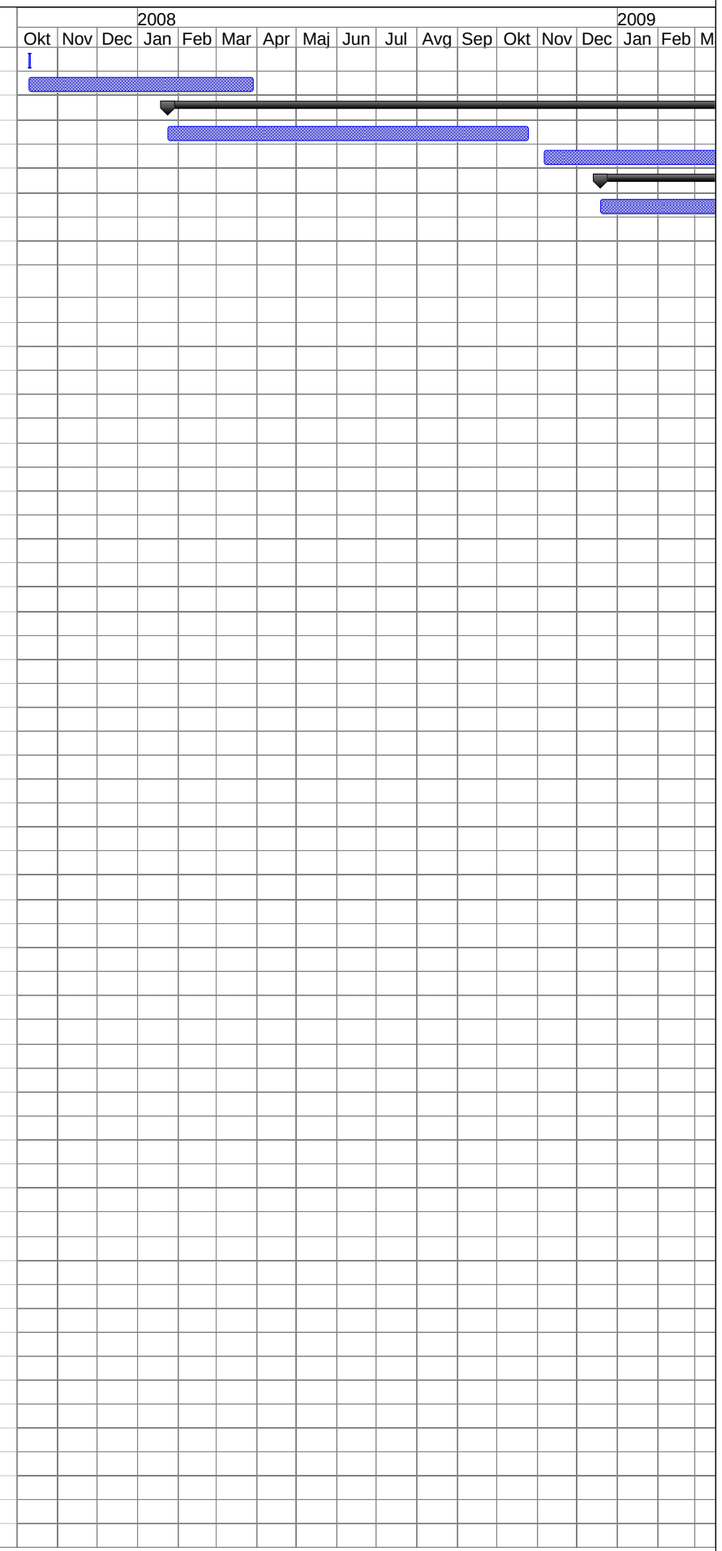

TP - plinovod Kalce-Vodice
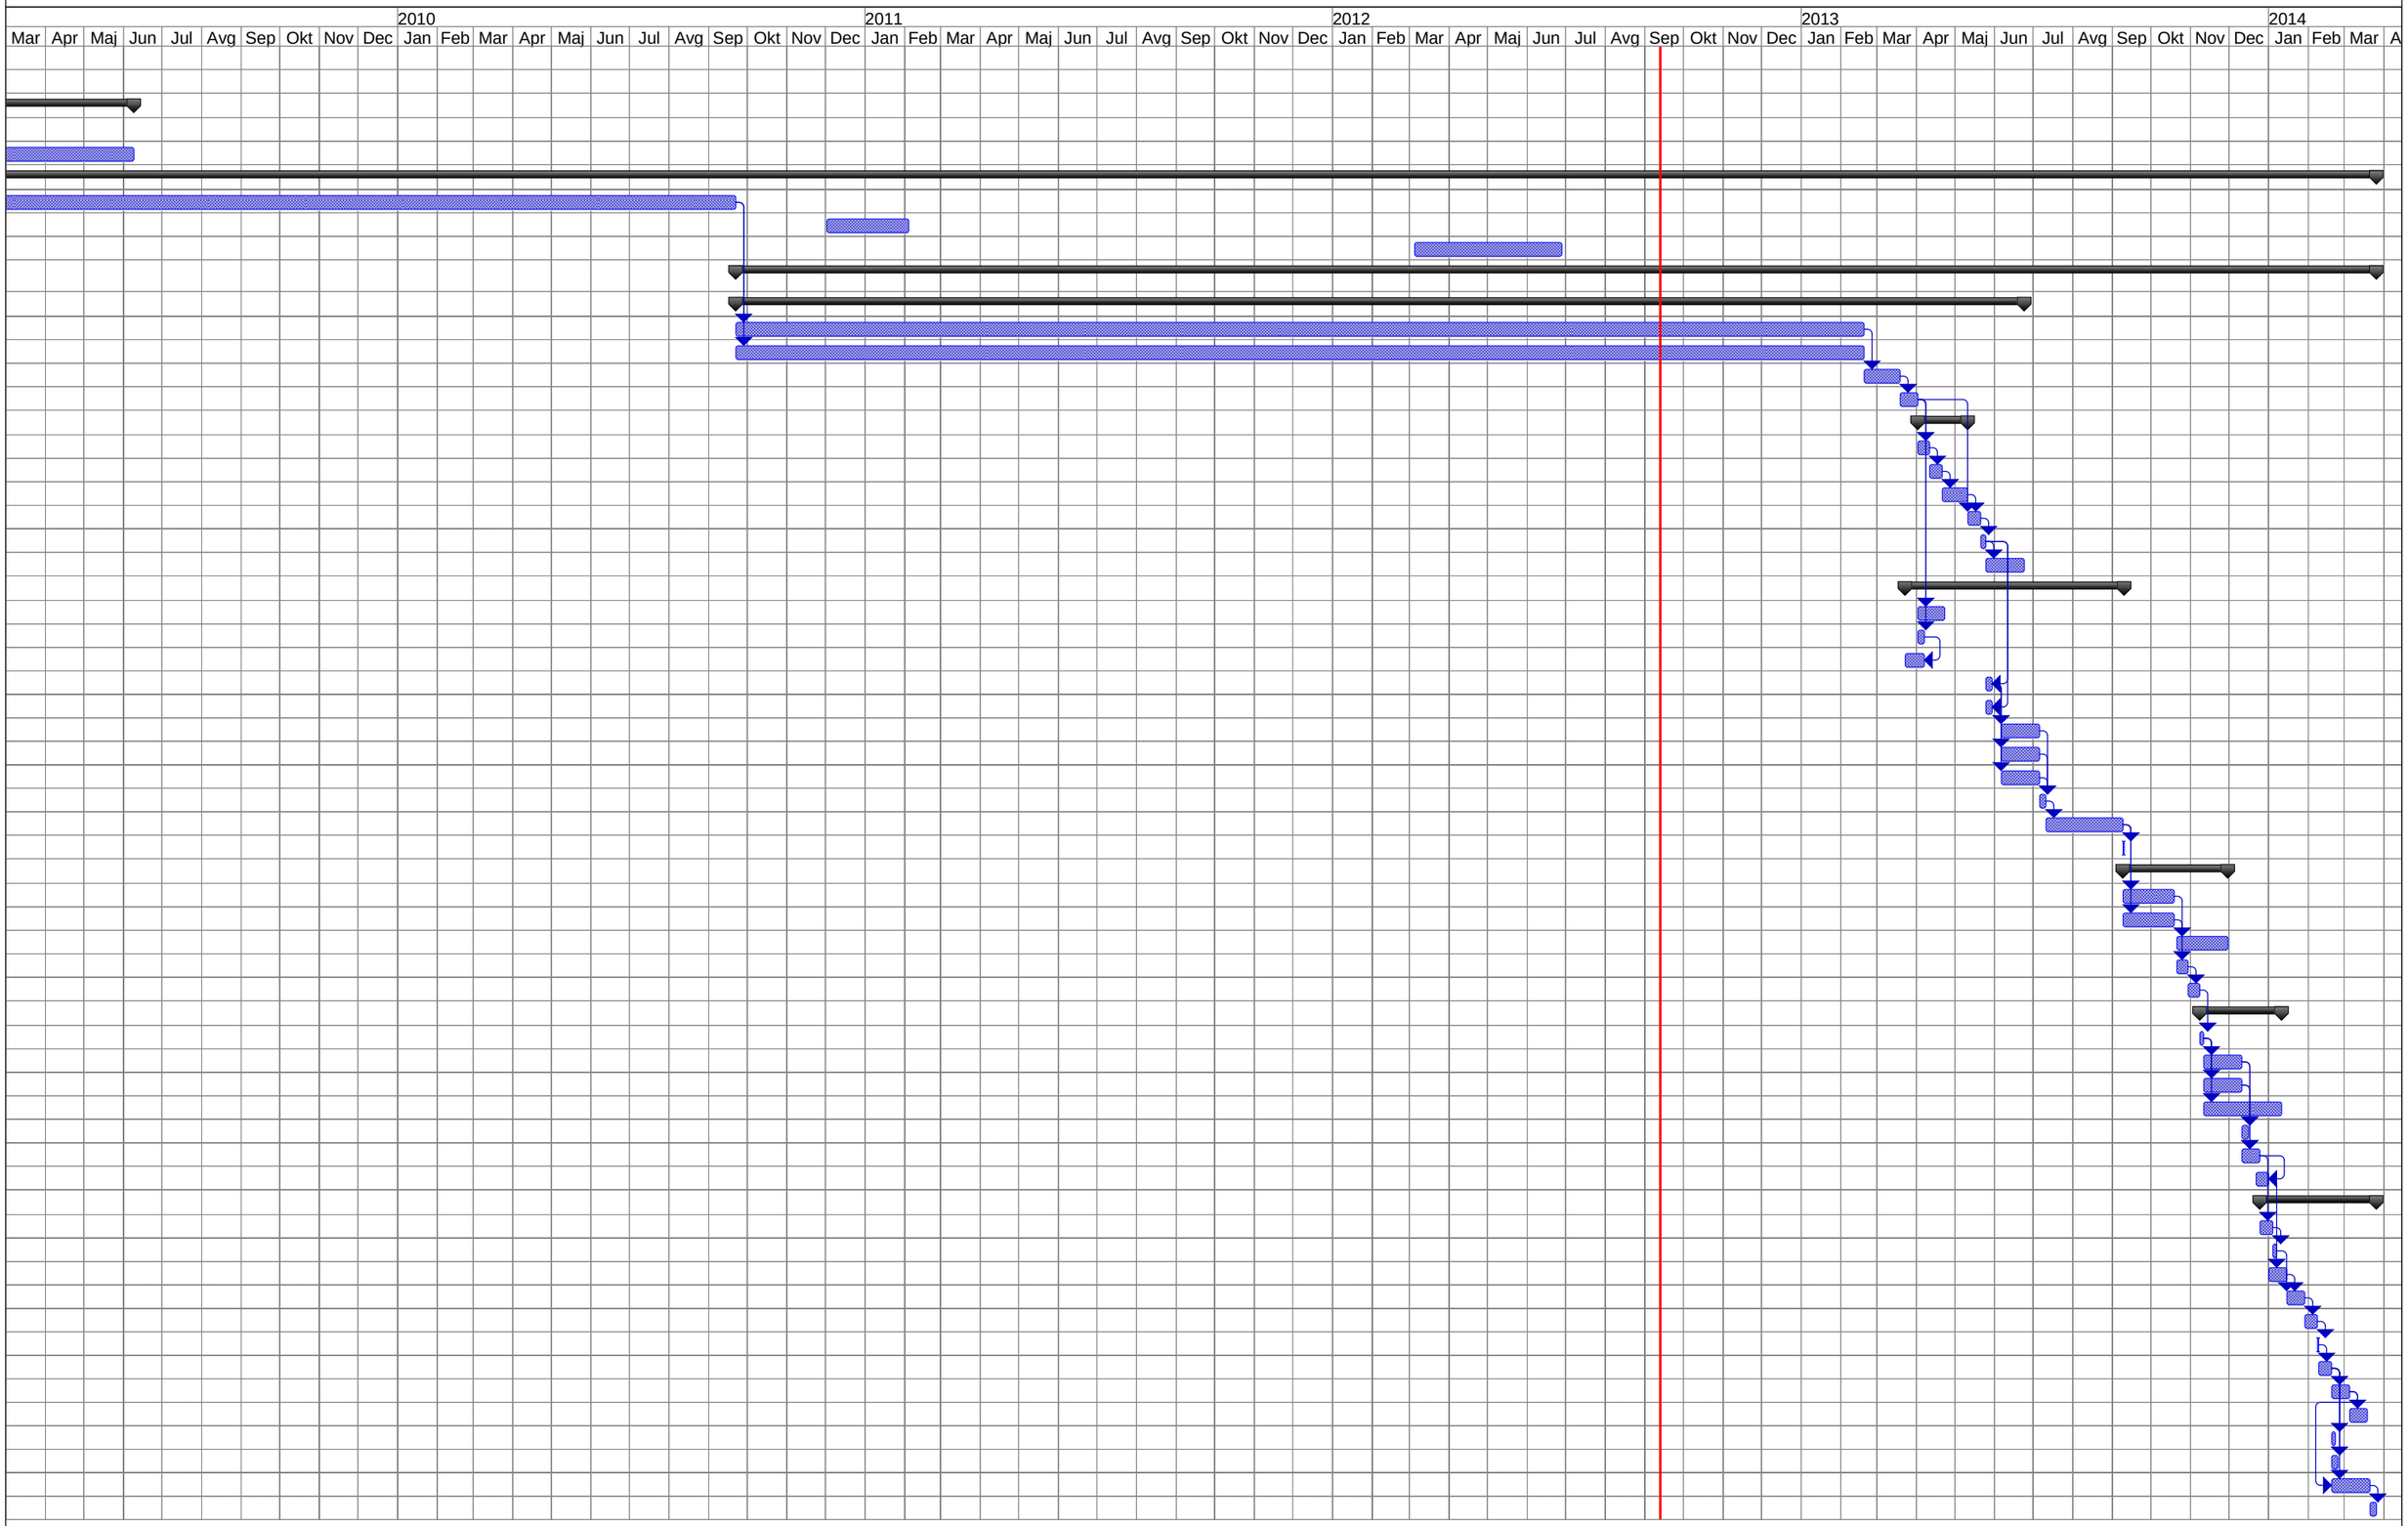
Datum: 10. 9. 2012
