TERMINSKI PLAN plinovod TROJANE - HRASTNIK

2.3.2012

ID	Faza postopka priprave DLN	Trajanje dni	Začetek	Zaključek	aveza	Nosilec
1	**POBUDE MINISTRA za okolje, prostor in energijo**	**1 d**	**Tor 7.9.04**	**Tor 7.9.04**		zainteresirani resorji
2	**PROGRAM PRIPRAVE**	**166 d**	**Čet 28.10.04**	**Pet 17.6.05**		
6	**UTEMELJITEV NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE**	**532,88 d**	**Čet 30.6.05**	**Sre 8.8.07**		
15	**DOPOLNITEV OSNUTKA DPN**	**120,13 d**	**Tor 8.1.08**	**Pon 30.6.08**		
32	**PREDLOG DPN**	**1139 d**	**Pet 6.6.08**	**Pon 3.12.12**		
33	**IZDELAVA PREDLOGA DPN (pDPN)**	**860 d**	**Pet 6.6.08**	**Pet 21.10.11**		
43	**MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA**	**279 d**	**Pet 21.10.11**	**Pon 3.12.12**		
44	Izdelava analize tveganja in kart poplavne in znjimi povezane nevarnosti	215 d	Pet 21.10.11	Pet 31.8.12	42	
45	Posredovanje gradiva za mnenja na MIP DzP	2 d	Pet 31.8.12	Tor 4.9.12	44	
46	Pridobitev mnenja NUP - Sektorja za vode	30 pd	Tor 4.9.12	Čet 4.10.12	45	MOP DP
47	Opredelitev do sprejemljivosti vplivov pDPN, posredovanje na MOP DO	30 pd	Čet 4.10.12	Sob 3.11.12	46	VM
48	Sklep o potrditvi pDPN	30 pd	Sob 3.11.12	Pon 3.12.12	47	MOP DO
49	Posredovanje mnenj NUP izdelovalcu DPN	30 d	Čet 27.9.12	Pon 12.11.12	Z-5 d	MOP DP
50	Uskladitev pDPN z mnenji NUP	20 d	Pon 5.11.12	Pet 30.11.12	Z+5 d	MOP DP;izdelovalec DPN
51	**SPREJEM DPN**	**53 d**	**Pon 3.12.12**	**Čet 21.2.13**		
52	Priprava gradiva za Vlado RS	2 d	Pon 3.12.12	Sre 5.12.12	48	MOP DP
53	Uskladitev gradiva z investitorjem	2 d	Sre 5.12.12	Pet 7.12.12	52	MOP DP;zainteresirani resorji
54	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14 pd	Pet 7.12.12	Pet 21.12.12	53	lektorska služba;MOP DP
55	Uskladitevz MF	14 pd	Pet 7.12.12	Pet 21.12.12	53	MF;MOP DP
56	Uskladitev gradiva s SVZ	14 pd	Pet 21.12.12	Pet 4.1.13	55;54	SVZ;MOP DP
57	Posredovanje pDPN v sprejem Vladi RS	2 d	Pet 4.1.13	Tor 8.1.13	56	MOP DP;MOP minister
58	Odbor Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	1 d	Tor 8.1.13	Sre 9.1.13	57	
59	Sprejem Uredbe o DPN	5 d	Sre 9.1.13	Sre 16.1.13	58	Vlada RS
60	Objava Uredbe o DPN v Uradnem listu RS	5 d	Sre 16.1.13	Sre 23.1.13	59	Vlada RS
61	Pravnomočnost Uredbe o DPN	15 pd	Sre 23.1.13	Čet 7.2.13	60	
62	Izdelava končnih elaboratov DPN	15 d	Sre 23.1.13	Čet 14.2.13	60	izdelovalec DPN
63	Izdelava povzetka za javnost	5 d	Sre 23.1.13	Sre 30.1.13	60	izdelovalec DPN
64	Posredovanje končnih elaboratov DLN občinam, UE, …	5 d	Čet 14.2.13	Čet 21.2.13	62	MOP DP

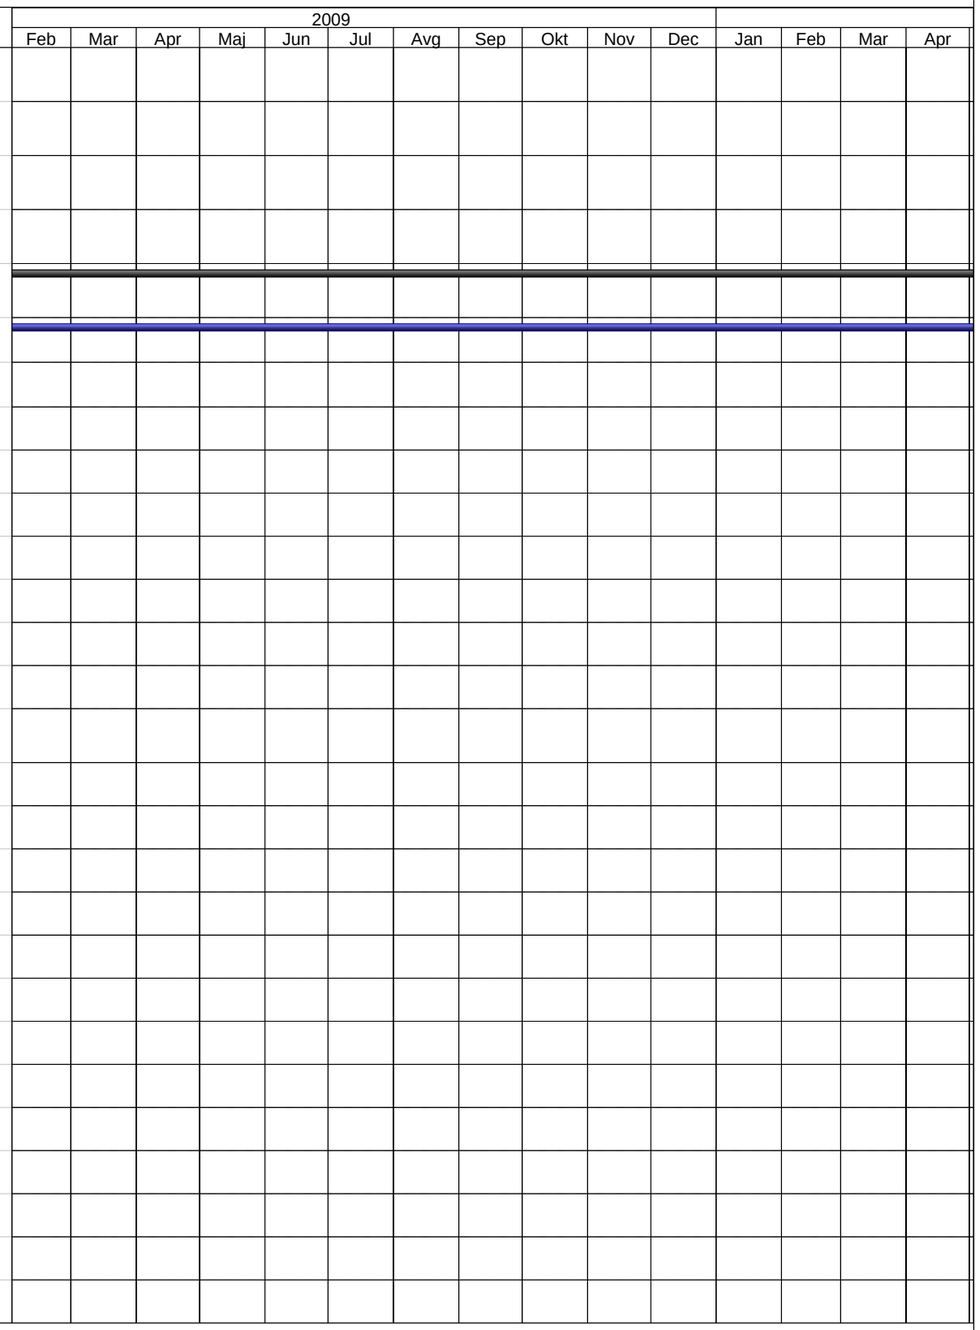

TERMINSKI PLAN plinovod TROJANE - HRASTNIK
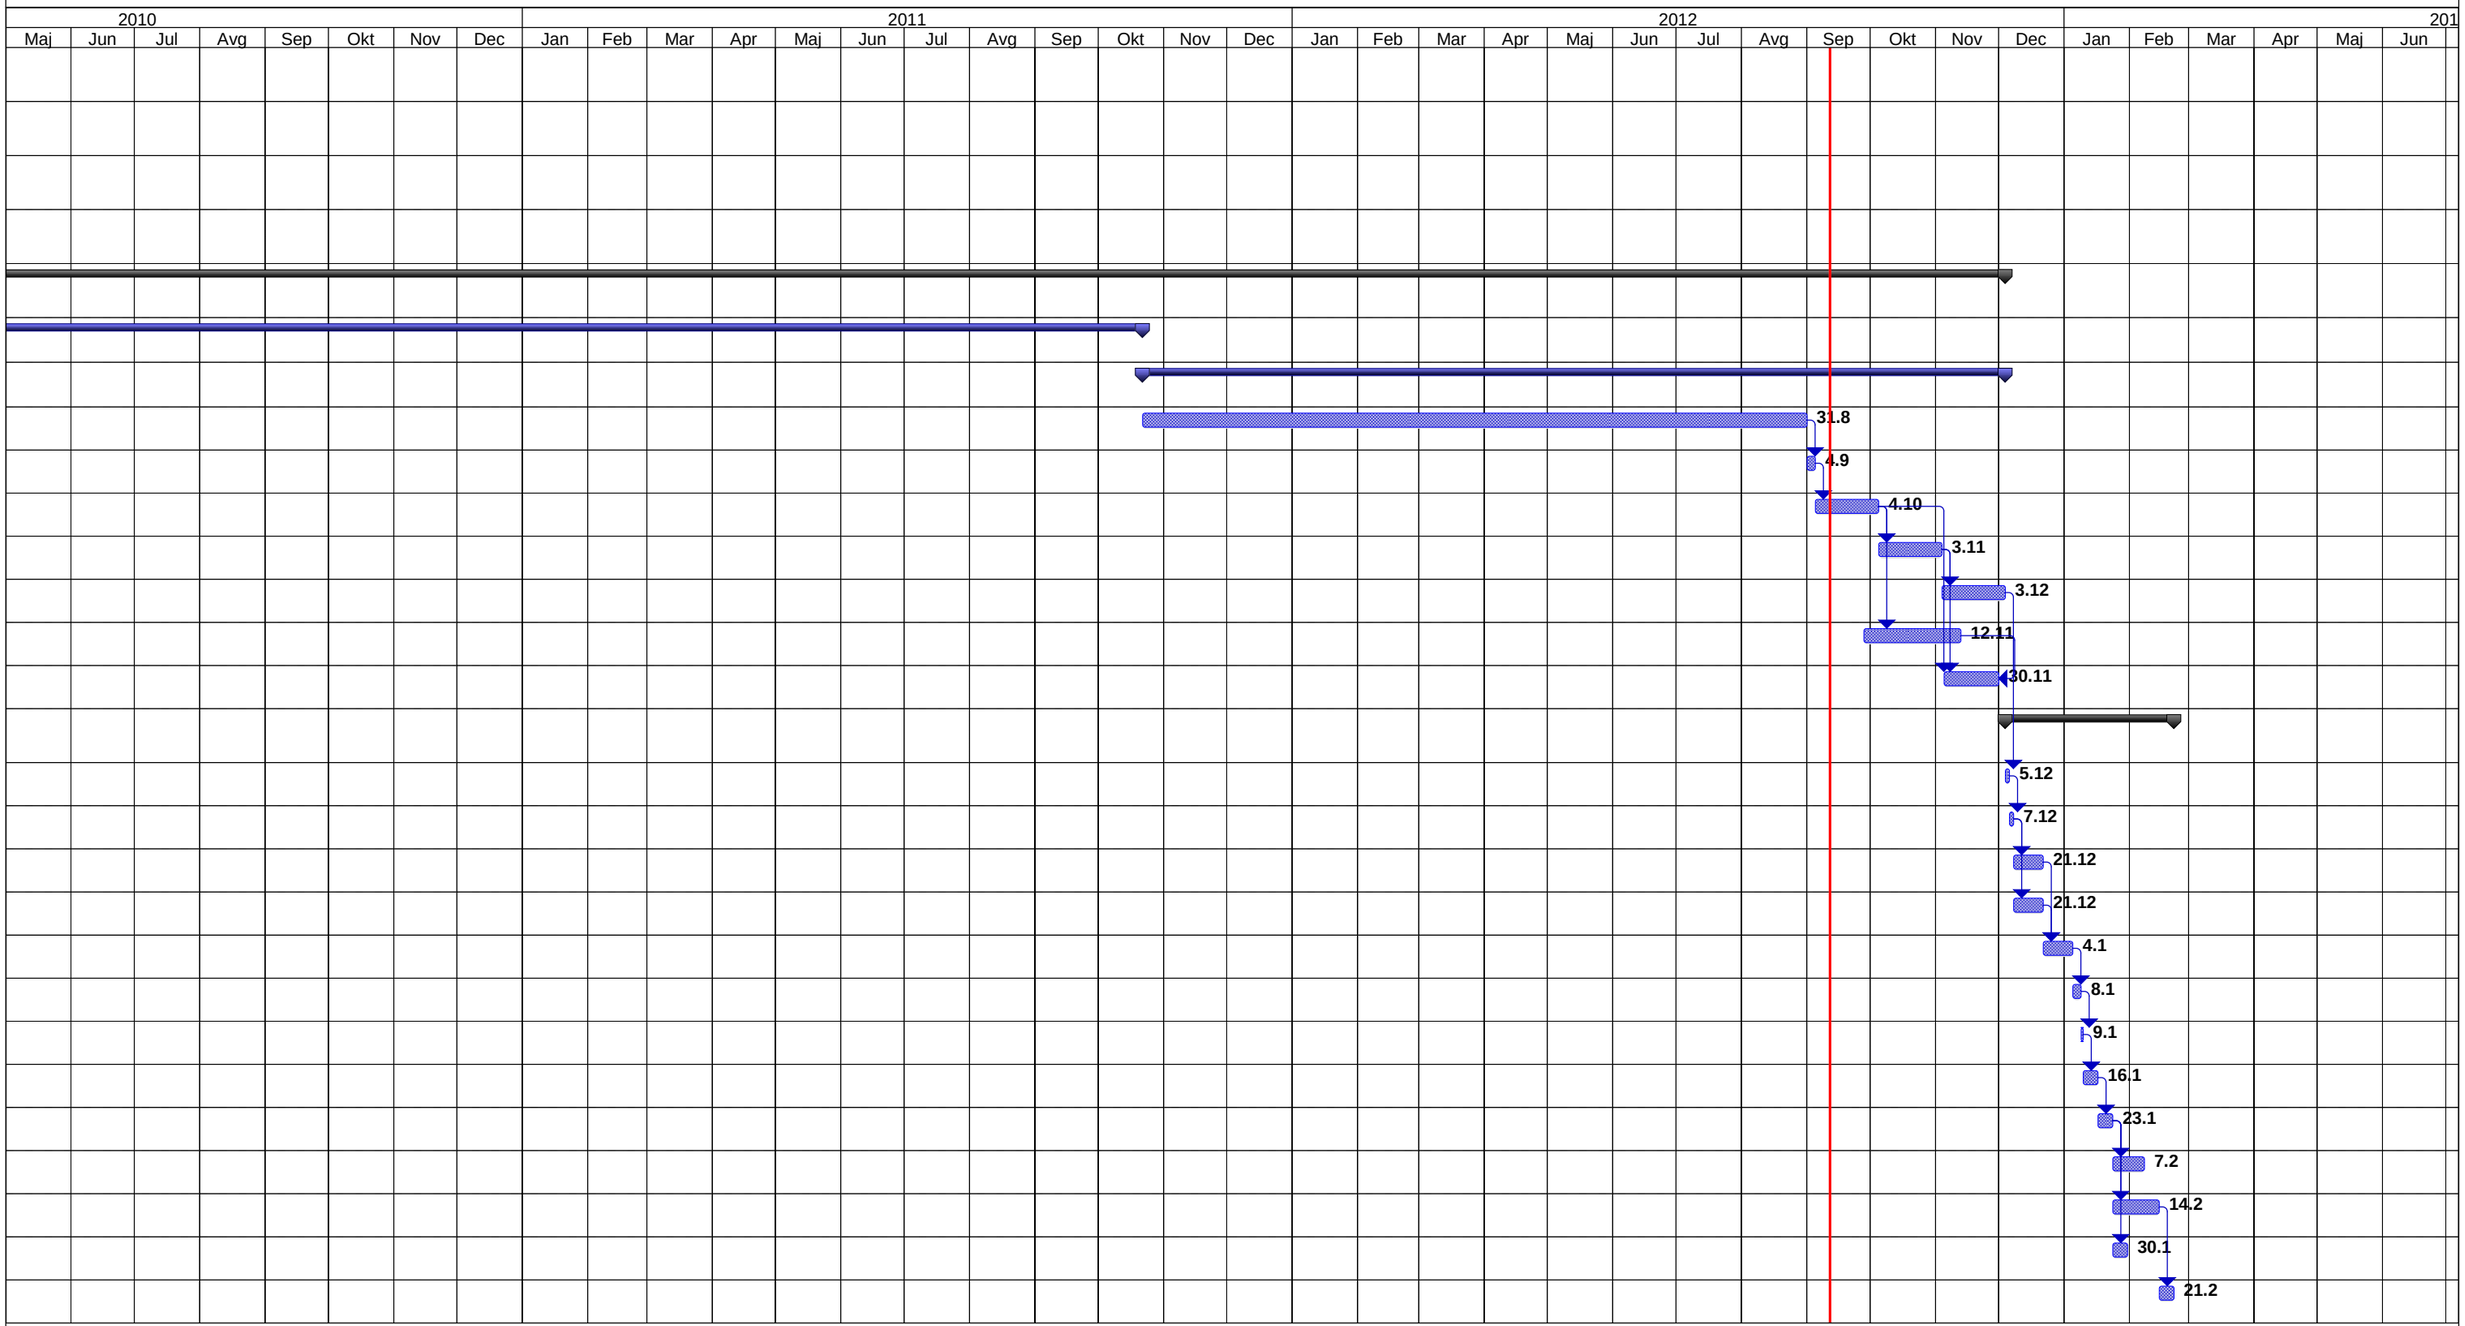
2.3.2012
