DPN za preureditev ŽP PRAGERSKO

20.7.2012
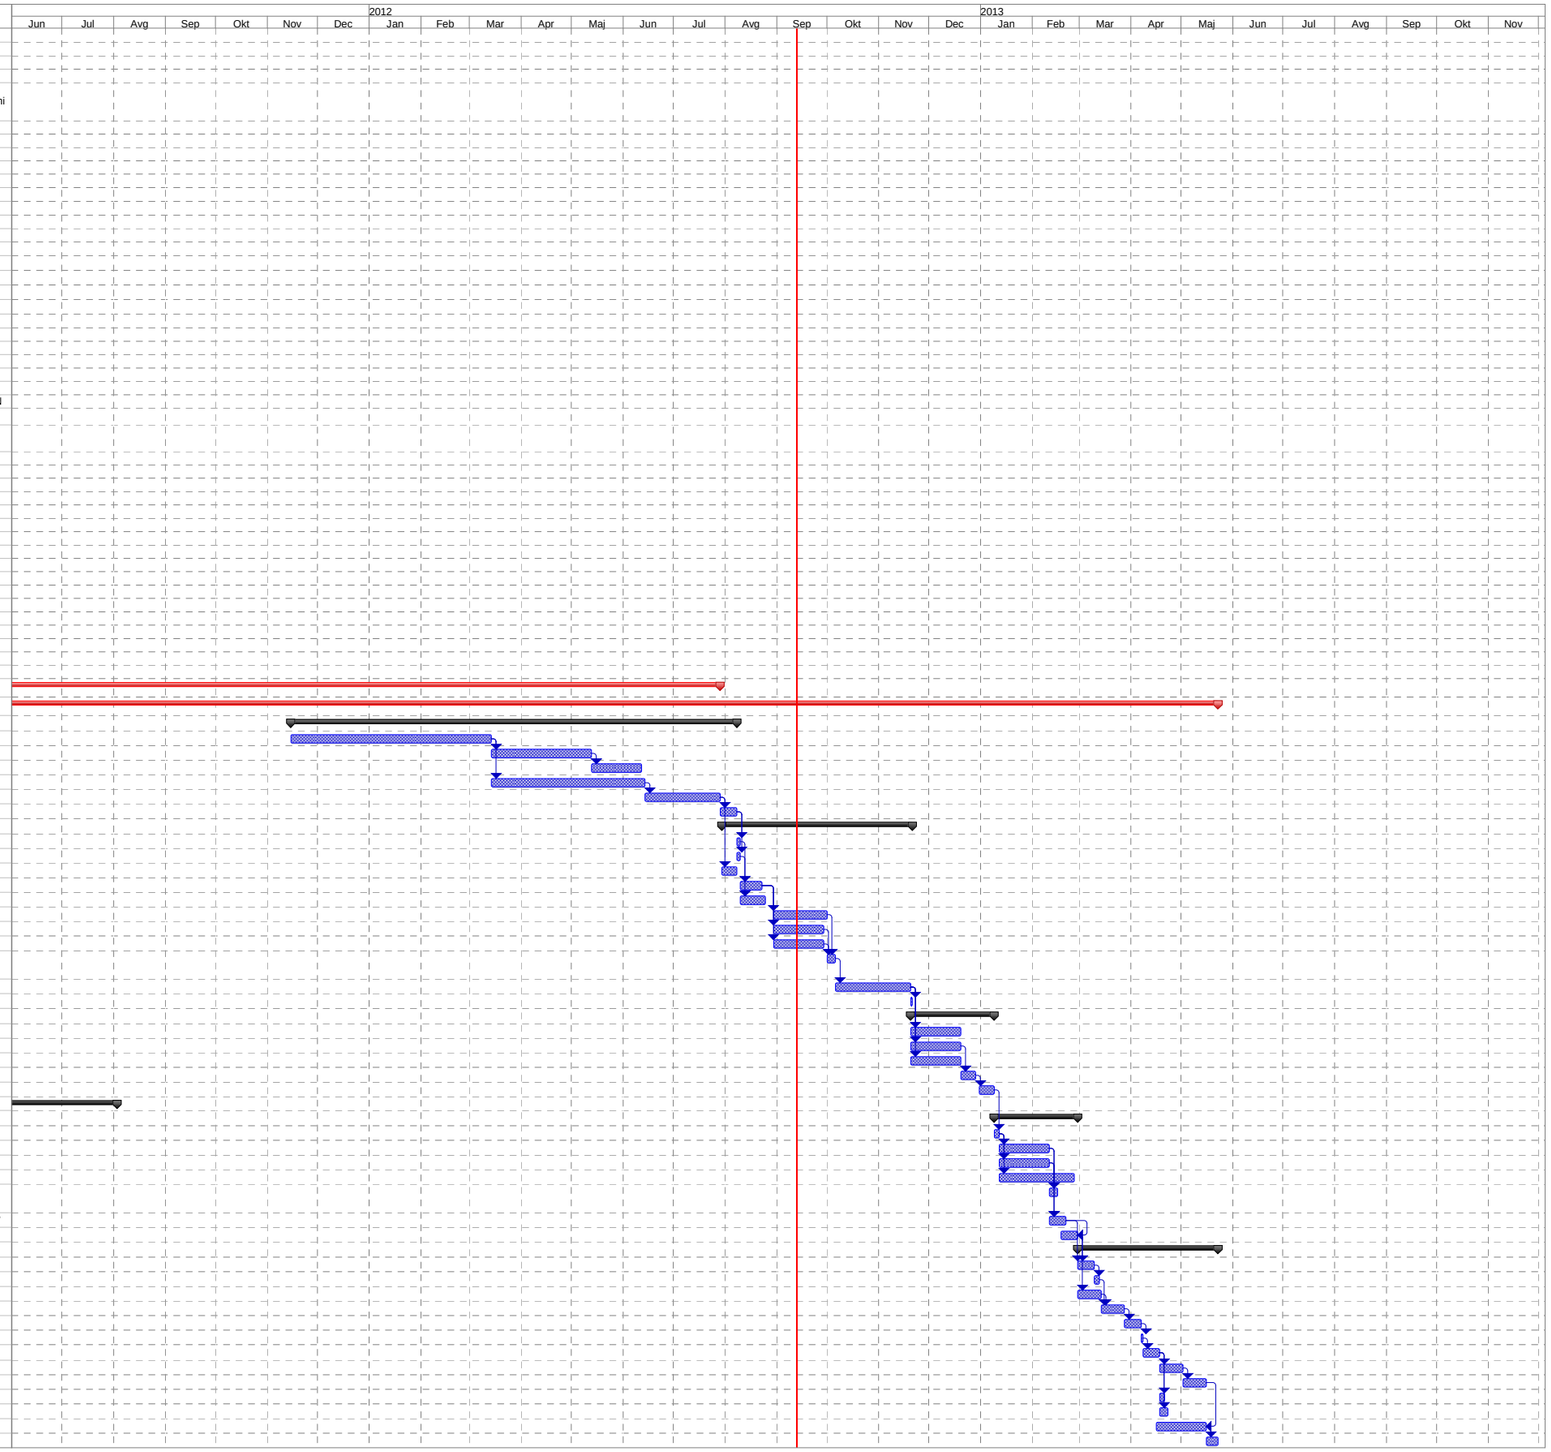
ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja	opravila	Imena virov
1	**POBUDA**	**405 dnevi**	**Tor 16.6.09**	**Pon 3.1.11**			
2	**USKLADITEV POBUDE IN DIIP**	**356 dnevi**	**Tor 16.6.09**	**Tor 26.10.10**			
3	Prejem osnutka pobude (in DIIP) in pregled	1 dan	Tor 16.6.09	Tor 16.6.09			K
4	Priprava osnutka Sklepa o pripravi DPN - gradivo za Vlado RS	91 dnevi	Sre 17.6.09	Sre 21.10.09	3		MOP DP
5	Uskladitev Sklepa - gradiva za Vlado RS - vsebinsko, z zainteresiranimi resorji	14	Sre 21.10.09	Sre 4.11.09	4		MOP DP;zainteresirani resorji
6	Uskladitev gradiva z MF	14	Sre 21.10.09	Sre 4.11.09	4		MOP DP;MF
7	Uskladitev gradiva s SVZ	14	Sre 21.10.09	Sre 4.11.09	4		SVZ;MOP DP
8	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10 dnevi	Čet 5.11.09	Sre 18.11.09	7		MOP DP
9	Obravnava in sprejem Sklepa na Vladi RS	21 dnevi	Čet 19.11.09	Čet 17.12.09	8		Vlada RS
10	Objava Sklepa na spletni strani MOP	1 dan	Pet 18.12.09	Pet 18.12.09	9		MOP DP
11	**OSNUTEK DPN**	**222 dnevi**	**Pet 18.12.09**	**Tor 26.10.10**	10		
12	**IZDELAVA OSNUTKA DPN (oDPN)**	**36 dnevi**	**Pet 18.12.09**	**Pon 8.2.10**			
13	Seznanitev s sklepom in pridobitev razvojnih potreb	30	Pet 18.12.09	Ned 17.1.10	9		MOP DP
14	Priprava osnutka DPN	36 dnevi	Pon 21.12.09	Pon 8.2.10	9		izdelovalec
15	**IZBOR IZDELOVALCA DPN**	**111 dnevi**	**Sre 20.1.10**	**Sre 23.6.10**			
16	Priprava osnutka projektne naloge	15 dnevi	Sre 20.1.10	Tor 9.2.10	14	KZ-14 dnevi	pobudnik
17	Uskladitev in potrditev projektne naloge - vsebinsko, z zainteresiranimi resorji	18 dnevi	Sre 10.2.10	Pet 5.3.10	16		pobudnik
18	Izbor izdelovalca DPN: javna naročila	60 dnevi	Pon 8.3.10	Pet 28.5.10	17		pobudnik
19	Izbor izdelovalca DPN: podpis pogodb	18 dnevi	Pon 31.5.10	Sre 23.6.10	18		pobudnik
20	**SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (NUP)**	**179 dnevi**	**Sre 17.2.10**	**Tor 26.10.10**			
21	Pridobitev smernic NUP	60	Sre 17.2.10	Ned 18.4.10	14	KZ+7 dnevi	MOP DP
22	Odločba o CPVO	30	Sre 17.2.10	Pet 19.3.10	14	KZ+7 dnevi	MOP DO
23	Posredovanje smernic izdelovalcu DPN	25 dnevi	Pon 19.4.10	Pet 21.5.10	21		MOP DP
24	Formalni pregled in dopolnitev smernic	40 dnevi	Čet 18.3.10	Sre 12.5.10	21	SS+20 dnevi	MOP DP
25	Posredovanje dopolnjenih smernic izdelovalcu DPN	25 dnevi	Čet 29.4.10	Sre 2.6.10	24	KZ-10 dnevi	MOP DP
26	Vsebinski pregled in analiza smernic	30 dnevi	Čet 24.6.10	Sre 4.8.10	19,25	ZZ+30 dnevi	izdelovalec DPN
27	**UVELJAVITEV ZUPUDPP**	**1 dan**	**Tor 26.10.10**	**Tor 26.10.10**			
28	**SPREJEM UREDBE O (PRENEHANJU VELJAVNOSTI) ZAČASNEM UKREPU - ZUKR (opcija)**	**0 dnevi**	**Pon 3.1.11**	**Pon 3.1.11**			
29	Prejem gradiva	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11			K
30	Pregled gradiva, pripombe na gradivo	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	29		K
31	Dopolnitev gradiva	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	30		P;IN
32	Priprava osnutka uredbe o ZUKR	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	31		K
33	Priprava gradiva za vlado	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	32		K
34	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	33		K;IN
35	Lektoriranje predloga uredbe o ZUKR	0	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	34		lektorji
36	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	0	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	35		K;SVZ;P;MF
37	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	0	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	36		K
38	Odbor Vlade RS za GTR	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	37		vlada
39	Seja Vlade RS - sprejem/razveljavitev uredbe o ZUKR	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	38		vlada
40	Objava uredbe o ZUKR v Uradnem listu RS	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	39		vlada
41	Uveljavitev uredbe o ZUKR	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	40		
42	Izdelava končnih elaboratov	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	40		IZ
43	Posredovanje elaboratov UE, občinam,…	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	42		K
44	Vpis/izbris v/iz ZK	0 dnevi	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11	40		K;ZK
45							
46	**ŠTUDIJA VARIANT - UTEMELJITEV VARIANTE**	**477 dnevi**	**Pet 1.10.10**	**Sob 28.7.12**			
58	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**535 dnevi**	**Čet 5.5.11**	**Sre 22.5.13**			
59	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**191 dnevi**	**Pon 14.11.11**	**Tor 7.8.12**			
60	Izdelava podrobnih strokovnih podlag (IdP)	120	Pon 14.11.11	Tor 13.3.12	50	KZ+12 dnevi	IZ
61	Recenzija strokovnih podlag	60	Tor 13.3.12	Sob 12.5.12	60		
62	Popravki strokovnih podlag po recenziji	30	Sob 12.5.12	Pon 11.6.12	61		
63	Izdelava osnutka DPN	92	Tor 13.3.12	Sre 13.6.12	60		IZ
64	Recenzija (pregled) osnutka DPN	45	Sre 13.6.12	Sob 28.7.12	63		K;recenzent
65	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji in OP	10	Sob 28.7.12	Tor 7.8.12	64		IZ
66	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + MNENJE OBČIN**	**82 dnevi**	**Pon 30.7.12**	**Tor 20.11.12**			
67	Organizacija JR in JO	2 dnevi	Sre 8.8.12	Čet 9.8.12	65		K;občine
68	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	2 dnevi	Sre 8.8.12	Čet 9.8.12	65		K;IN
69	Izdelava povzetka za javnost	7 dnevi	Pon 30.7.12	Tor 7.8.12	64		IZ
70	Objava javnega naznanila	9 dnevi	Pet 10.8.12	Sre 22.8.12	67		K;izbran medij
71	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	11 dnevi	Pet 10.8.12	Pet 24.8.12	68		K
72	JR in JO	32	Sre 29.8.12	Ned 30.9.12	70	KZ+7	K
73	Pripombe in predlogi javnosti	30	Sre 29.8.12	Pet 28.9.12	70	KZ+7	javnost
74	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Sre 29.8.12	Pet 28.9.12	70	KZ+7	LNUP
75	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalcu	5	Ned 30.9.12	Pet 5.10.12	72;74;73		K
76	Priprava, uskladitev do pripomb in predlogov	45	Pet 5.10.12	Pon 19.11.12	75		K;IZ;IN;P
77	Podpis in objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Pon 19.11.12	Tor 20.11.12	76		K
78	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**36 dnevi**	**Pon 19.11.12**	**Tor 8.1.13**			
79	Dopolnitev strokovnih podlag	30	Pon 19.11.12	Sre 19.12.12	76		IZ
80	Izdelava predloga DPN	30	Pon 19.11.12	Sre 19.12.12	76		IZ
81	Dopolnitev OP	30	Pon 19.11.12	Sre 19.12.12	76		OP
82	Pregled (recenzija) predloga DPN	7 dnevi	Čet 20.12.12	Pet 28.12.12	80		K;(recenzent)
83	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	7 dnevi	Pon 31.12.12	Tor 8.1.13	82		IZ
84	**IZDELAVA INVESTICIJSKE ZASNOVE (opcija)**	**64 dnevi**	**Čet 5.5.11**	**Sre 3.8.11**			
87	**PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP**	**36 dnevi**	**Sre 9.1.13**	**Sre 27.2.13**			
88	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Sre 9.1.13	Pet 11.1.13	83		K
89	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pet 11.1.13	Ned 10.2.13	88		DNUP
90	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pet 11.1.13	Ned 10.2.13	88		DNUP
91	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	45	Pet 11.1.13	Pon 25.2.13	88		SCPVO
92	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Ned 10.2.13	Pet 15.2.13	89;90		K
93	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10	Ned 10.2.13	Sre 20.2.13	89;90		K;IZ;DNUP;IN;P
94	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Ned 17.2.13	Sre 27.2.13	93	ZZ+5 dnevi	IZ;K
95	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**60 dnevi**	**Sre 27.2.13**	**Sre 22.5.13**			
96	Priprava gradiva za vlado	10	Sre 27.2.13	Sob 9.3.13	94;93		K
97	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Sob 9.3.13	Tor 12.3.13	96		K;IN
98	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Sre 27.2.13	Sre 13.3.13	94		lektorji
99	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sre 13.3.13	Sre 27.3.13	97;98		P;K;MF;SVZ
100	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Sre 27.3.13	Sob 6.4.13	99		vlada
101	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Sob 6.4.13	Ned 7.4.13	100		vlada
102	**Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN**	**10**	**Ned 7.4.13**	**Sre 17.4.13**	**101**		**vlada**
103	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Sre 17.4.13	Sre 1.5.13	102		vlada
104	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Sre 1.5.13	Sre 15.5.13	103		
105	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3	Sre 17.4.13	Sob 20.4.13	102		vlada;K
106	Izdelava povzetka za javnost	5	Sre 17.4.13	Pon 22.4.13	102		IZ
107	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Pon 15.4.13	Sre 15.5.13	104	ZZ	IZ
108	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5 dnevi	Čet 16.5.13	Sre 22.5.13	107		K
