ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek
1	**SKLEP**	**39 dnevi**	**Sre 1.8.12**	**Pon 24.9.12**
2	**SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN**	**39 dnevi**	**Sre 1.8.12**	**Pon 24.9.12**
3	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	18 dnevi	Sre 1.8.12	Pet 24.8.12
4	Ponovna medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF	5 dnevi	Pon 27.8.12	Pet 31.8.12
5	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Pet 31.8.12	Pon 10.9.12
6	Odbor Vlade RS	1 potdni	Pon 10.9.12	Tor 11.9.12
7	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10	Tor 11.9.12	Pet 21.9.12
8	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3	Pet 21.9.12	Pon 24.9.12
9	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Pet 21.9.12	Pon 24.9.12
10	**ŠTUDIJA VARIANT**	**559 dnevi**	**Tor 10.7.12**	**Ned 31.8.14**
11	Izbor izdelovalca ŠV/PIZ	110 dnevi	Tor 10.7.12	Pon 10.12.12
12	Priprava in uskladitev PN	60	Tor 10.7.12	Sob 8.9.12
13	Izbor izdelovalca: javna naročila	60	Pet 21.9.12	Tor 20.11.12
14	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Tor 20.11.12	Pon 10.12.12
15	Izdelava strokovnih podlag za načrtovanje variant (IdZ)	180	Pon 10.12.12	Sob 8.6.13
16	Izdelava strokovnih podlag za ŠV/PIZ	117 dnevi	Sre 24.4.13	Ned 6.10.13
17	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	120	Sre 24.4.13	Čet 22.8.13
18	Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidik) vključno z oceno sprejemljivosti v lokalnem okolju	120	Sre 24.4.13	Čet 22.8.13
19	Izdelava okoljskega elaborata (varstveni vidik) - OP brez ocene sprejemljivosti plana	120	Sre 24.4.13	Čet 22.8.13
20	Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik)	120	Sob 8.6.13	Ned 6.10.13
21	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	60	Pet 6.9.13	Tor 5.11.13
22	Izdelava okoljskega poročila (OP) - zaključek	60 dnevi	Čet 29.8.13	Sre 20.11.13
23	Recenzija (pregled) ŠV/PIZ	7	Sre 20.11.13	Sre 27.11.13
24	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	10 dnevi	Čet 28.11.13	Sre 11.12.13
25	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Sre 11.12.13	Pet 10.1.14
26	**JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV IN OP + 1. MNENJE OBČIN**	**121 dnevi**	**Čet 28.11.13**	**Čet 15.5.14**
27	Organizacija JR in JO	10 dnevi	Čet 28.11.13	Sre 11.12.13
28	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	8 dnevi	Sre 4.12.13	Sob 14.12.13
29	Izdelava povzetka za javnost	10	Sre 4.12.13	Sob 14.12.13
30	Objava javnega naznanila	5 dnevi	Pon 16.12.13	Pet 20.12.13
31	Predstavitev SV/PIZ, PNV in OP občinam in predstavnikom javnosti	1 potdni	Sob 14.12.13	Ned 15.12.13
32	Posredovanje ŠV/PIZ in PNV ter OP občinam	5 dnevi	Pon 16.12.13	Pet 20.12.13
33	JR in JO	30	Pet 27.12.13	Ned 26.1.14
34	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pet 27.12.13	Ned 26.1.14
35	Pripombe in predlogi občin + 1. mnenje občin	30	Pet 27.12.13	Ned 26.1.14
36	Posredovanje pripomb in predlogov + 1. mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sektorju za CPVO	30	Sre 1.1.14	Pet 31.1.14
37	Priprava in uskladitev stališč do pripomb	60	Čet 16.1.14	Pon 17.3.14
38	Podpis in objava stališč do pripomb na spletu ter posredovanje občinam	1 potdni	Pon 17.3.14	Tor 18.3.14
39	**Dopolnitev strokovnih podlag in ŠV/PIZ s PNV**	**54 dnevi**	**Sob 15.2.14**	**Čet 1.5.14**
40	Dopolnitev strokovnih podlag	60	Sob 15.2.14	Sre 16.4.14
41	Dopolnitev ŠV/PIZ	30	Tor 1.4.14	Čet 1.5.14
42	Dopolnitev OP	45	Pon 31.3.14	Čet 15.5.14
43	**PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV**	**47 dnevi**	**Čet 15.5.14**	**Pon 21.7.14**
44	Posredovanje vseh vlog	3	Čet 15.5.14	Ned 18.5.14
45	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30	Ned 18.5.14	Tor 17.6.14
46	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30	Ned 18.5.14	Tor 17.6.14
47	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV	45	Ned 18.5.14	Sre 2.7.14
48	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	5	Sre 2.7.14	Pon 7.7.14
49	Uskladitev ŠV/PIZ in PNV z mnenji	30	Sob 21.6.14	Pon 21.7.14
50	**SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI PNV (opcija - vezati tudi na 110)**	**34 dnevi**	**Pon 14.7.14**	**Ned 31.8.14**
51	Priprava osnutka sklepa o potrditvi PNV in vsebinska uskladitev s P in I	10	Pon 14.7.14	Čet 24.7.14
52	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Čet 24.7.14	Čet 7.8.14
53	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Čet 7.8.14	Ned 17.8.14
54	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Ned 17.8.14	Pon 18.8.14
55	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	10	Pon 18.8.14	Čet 28.8.14
56	Posredovanje sklepa koordinatroju, pobudniku, investiroju, vsem NUP	3	Čet 28.8.14	Ned 31.8.14
57	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Čet 28.8.14	Ned 31.8.14
58	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**560 dnevi**	**Čet 8.5.14**	**Čet 30.6.16**
59	**IZBOR IZDELOVALCEV STROKOVNIH PODLAG, DPN, PVO,...**	**86 dnevi**	**Čet 8.5.14**	**Ned 7.9.14**
60	Priprava osnutka projektne naloge	15	Čet 8.5.14	Pet 23.5.14
61	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in DzP	7	Pet 23.5.14	Pet 30.5.14
62	Izbor izdelovalca: javna naročila	80	Pet 30.5.14	Pon 18.8.14
63	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Pon 18.8.14	Ned 7.9.14
64	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**250 dnevi**	**Čet 28.8.14**	**Čet 13.8.15**
65	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	240	Čet 28.8.14	Sob 25.4.15
66	Izdelava osnutka poročila o vplivih na okolje (PVO)	60	Sob 25.4.15	Sre 24.6.15
67	Izdelava osnutka DPN	60	Sob 25.4.15	Sre 24.6.15
68	Pregled osnutka DPN	5 dnevi	Čet 25.6.15	Sre 1.7.15
69	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Sre 1.7.15	Sob 11.7.15
70	Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	3	Sob 11.7.15	Tor 14.7.15
71	Pridobitev osnutka OVS	30	Tor 14.7.15	Čet 13.8.15
72	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN**	**74 dnevi**	**Pet 24.7.15**	**Sre 4.11.15**
73	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Pet 24.7.15	Čet 13.8.15
74	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Čet 13.8.15	Tor 18.8.15
75	Izdelava povzetka za javnost	10	Sob 8.8.15	Tor 18.8.15
76	Objava javnega naznanila	5	Tor 18.8.15	Ned 23.8.15
77	Predstavitev oDPN, SP, PVO in osnutka OVS občinam in predstavnikom javnosti	1 potdni	Tor 18.8.15	Sre 19.8.15
78	Posredovanje osnutka DPN, PVO in osnutka OVS občinam	30	Sre 19.8.15	Pet 18.9.15
79	JR in JO	30	Ned 30.8.15	Tor 29.9.15
80	Pripombe in predlogi javnosti	30	Ned 30.8.15	Tor 29.9.15
81	Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Ned 30.8.15	Tor 29.9.15
82	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS (opcija)	1 potdni	Ned 30.8.15	Pon 31.8.15
83	Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalcu ter Sektorju za PVO	30	Pet 4.9.15	Ned 4.10.15
84	Priprava in uskladitev stališč do pripomb	45	Sob 19.9.15	Tor 3.11.15
85	Podpis in objava stališč do pripomb na spletu ter posredovanje občinam	1 potdni	Tor 3.11.15	Sre 4.11.15
86	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**43 dnevi**	**Sre 4.11.15**	**Pet 1.1.16**
87	Dopolnitev strokovnih podlag	30 dnevi	Sre 4.11.15	Tor 15.12.15
88	Izdelava predloga DPN	30	Ned 15.11.15	Tor 15.12.15
89	Preveritev PVO	30	Ned 15.11.15	Tor 15.12.15
90	Pregled predloga DPN	5 dnevi	Sre 16.12.15	Tor 22.12.15
91	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	10	Tor 22.12.15	Pet 1.1.16
92	**IZDELAVA INVESTICIJSKE ZASNOVE (opcija)**	**103 dnevi**	**Tor 17.11.15**	**Pet 8.4.16**
93	Izdelava investicijske zasnove (IZ)	60	Tor 17.11.15	Sob 16.1.16
94	Potrditev IZ na Komisiji za potrjevanje investicijske dokumentacije	60 dnevi	Pon 18.1.16	Pet 8.4.16
95	**PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS**	**69 dnevi**	**Pet 1.1.16**	**Čet 7.4.16**
96	Posredovanje vseh vlog	3	Pet 1.1.16	Pon 4.1.16
97	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pon 4.1.16	Sre 3.2.16
98	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pon 4.1.16	Sre 3.2.16
99	Pridobitev odločbe o OVS	30	Sre 3.2.16	Pet 4.3.16
100	Pravnomočnost odločbe o OVS	14	Pet 4.3.16	Pet 18.3.16
101	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Sre 3.2.16	Pon 8.2.16
102	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	20	Pet 18.3.16	Čet 7.4.16
103	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Pon 28.3.16	Čet 7.4.16
104	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**67 dnevi**	**Sre 30.3.16**	**Čet 30.6.16**
105	Priprava in uskladitev gradiva za vlado	10 dnevi	Sre 30.3.16	Tor 12.4.16
106	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Čet 7.4.16	Čet 21.4.16
107	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Čet 21.4.16	Čet 5.5.16
108	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Čet 5.5.16	Ned 15.5.16
109	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Ned 15.5.16	Pon 16.5.16
110	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Pon 16.5.16	Čet 26.5.16
111	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Čet 26.5.16	Čet 9.6.16
112	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Čet 9.6.16	Čet 23.6.16
113	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3	Čet 26.5.16	Ned 29.5.16
114	Izdelava povzetka za javnost	5	Čet 26.5.16	Tor 31.5.16
115	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Čet 26.5.16	Sob 25.6.16
116	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5	Sob 25.6.16	Čet 30.6.16

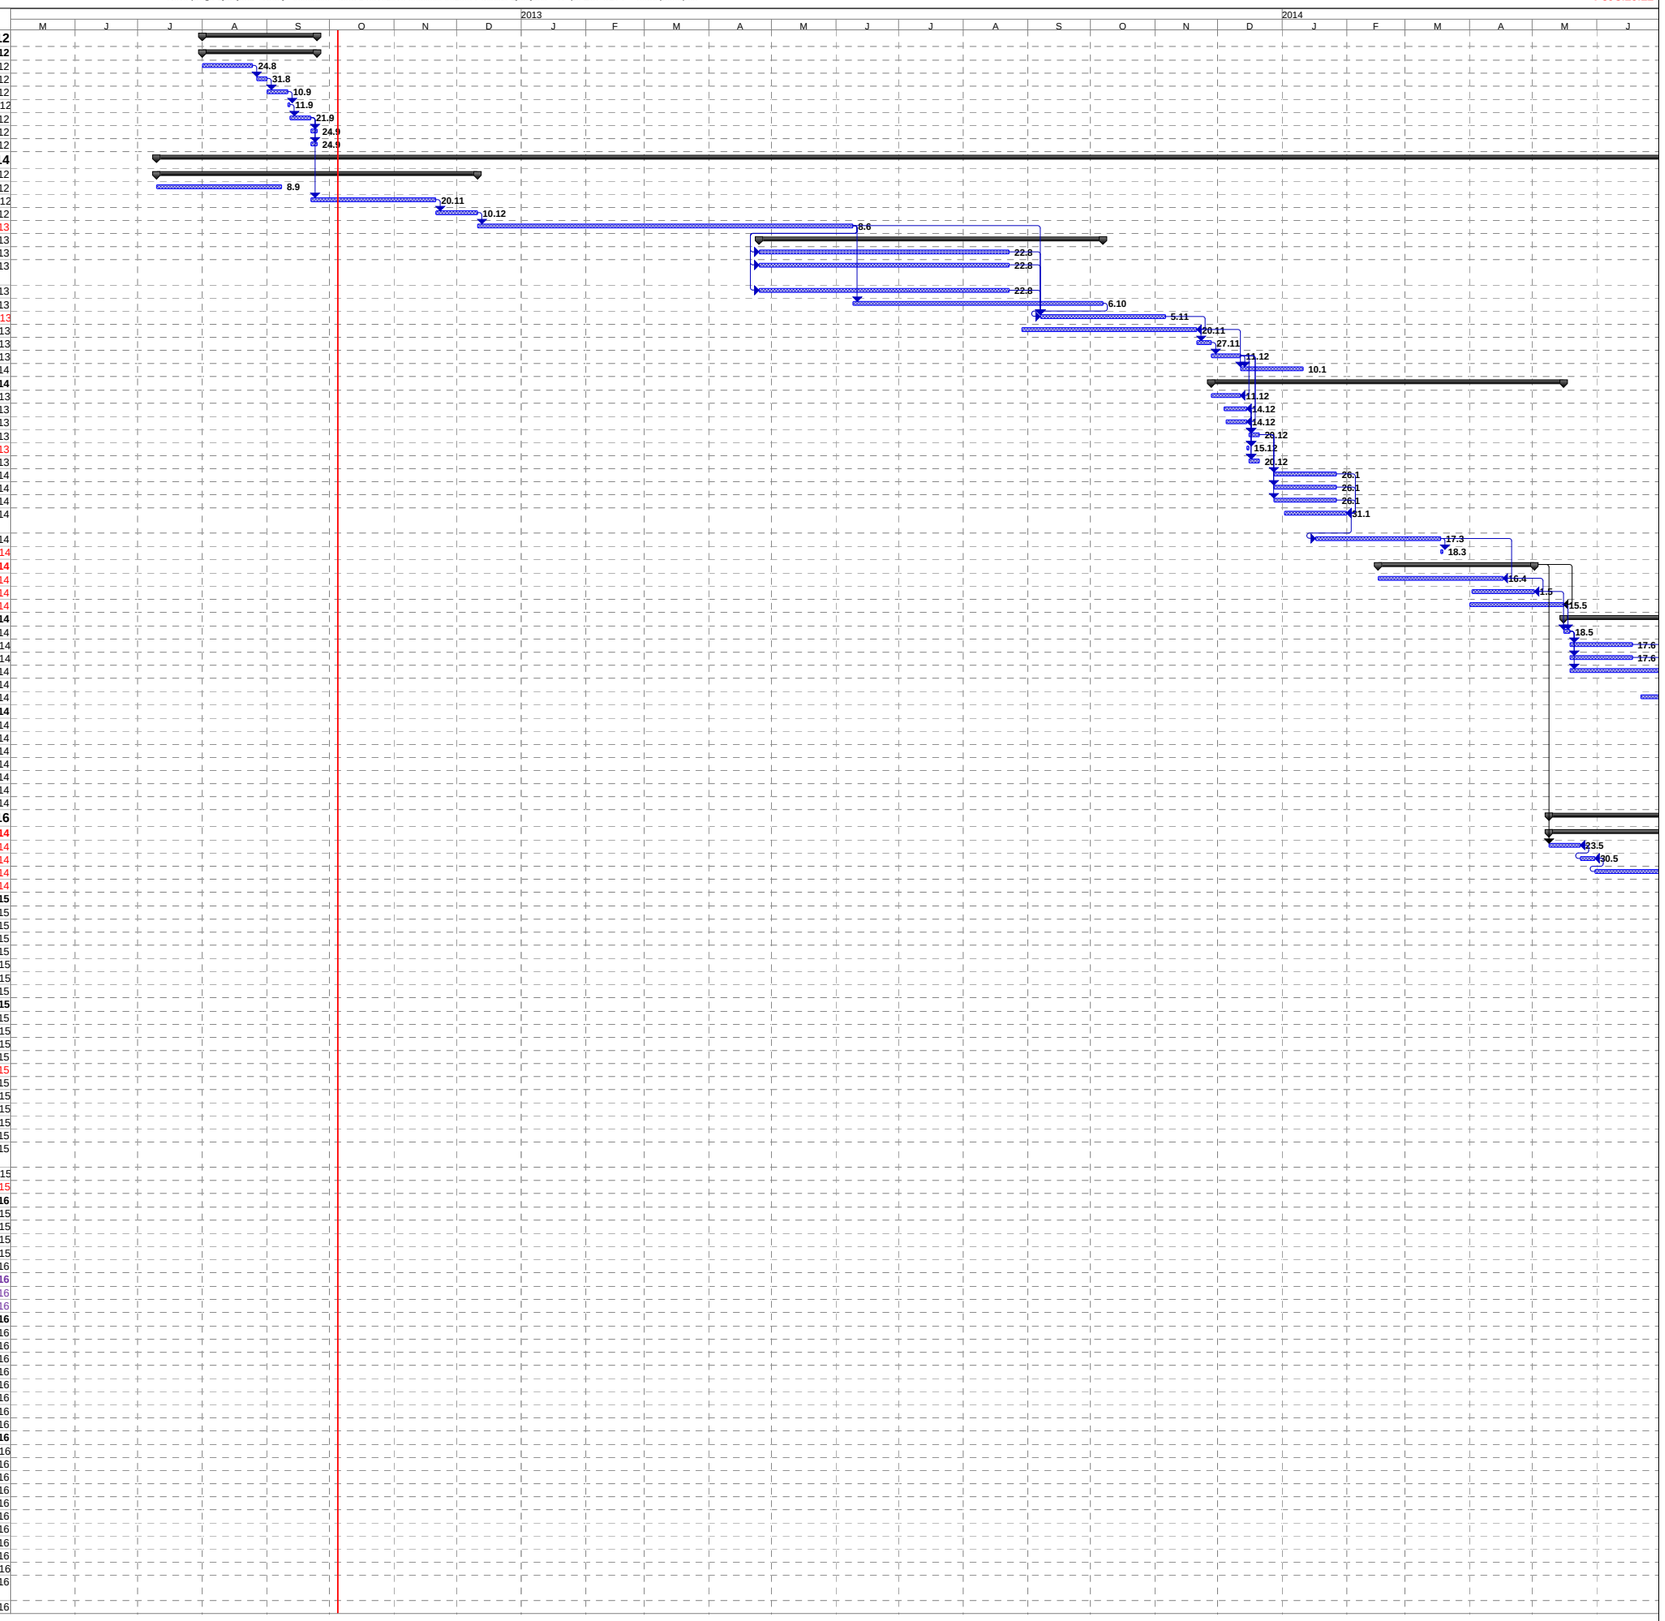

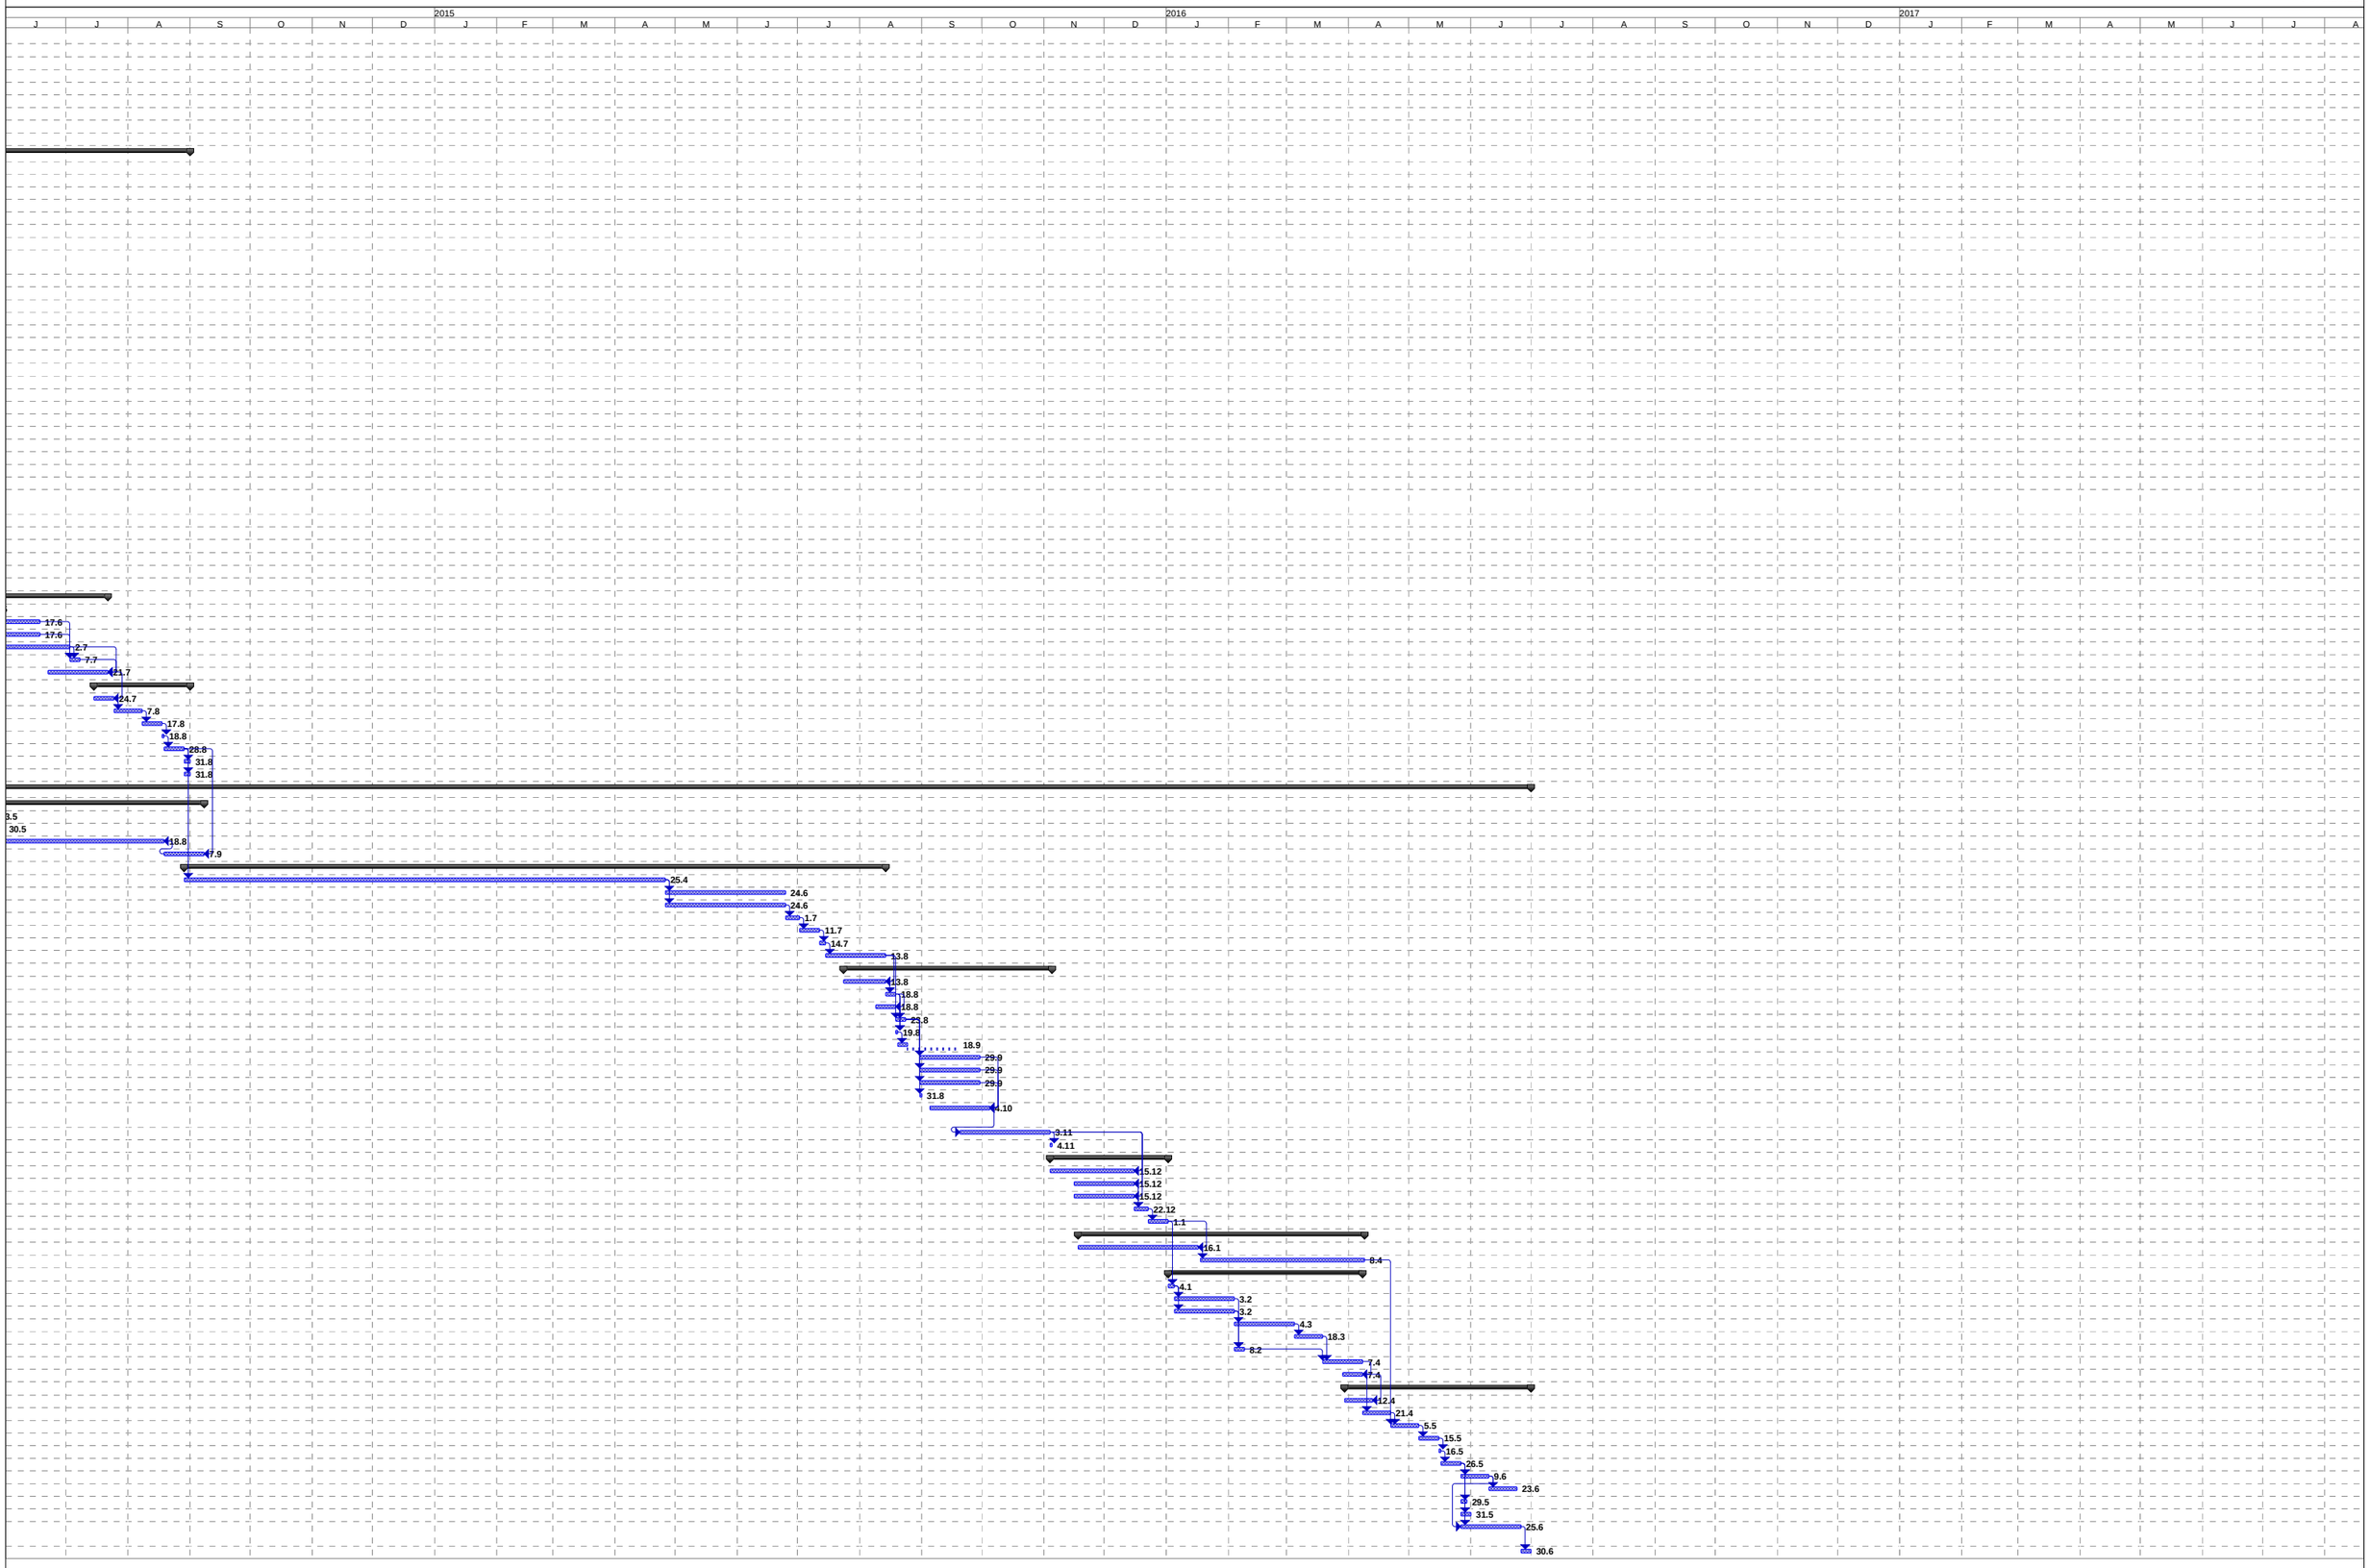
2015
2016
2017
J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A
17.6
17.6
2.7
7.7
21.7
24.7
7.8
17.8
18.8
28.8
31.8
31.8
8.5
30.5
18.8
7.9
25.4
24.6
24.6
1.7
11.7
14.7
13.8
13.8
18.8
18.8
23.8
19.8
18.9
29.9
29.9
29.9
31.8
4.10
3.11
4.11
15.12
15.12
15.12
22.12
1.1
16.1
8.4
4.1
3.2
3.2
4.3
18.3
8.2
7.4
7.4
12.4
21.4
5.5
15.5
16.5
26.5
9.6
23.6
29.5
31.5
25.6
30.6
