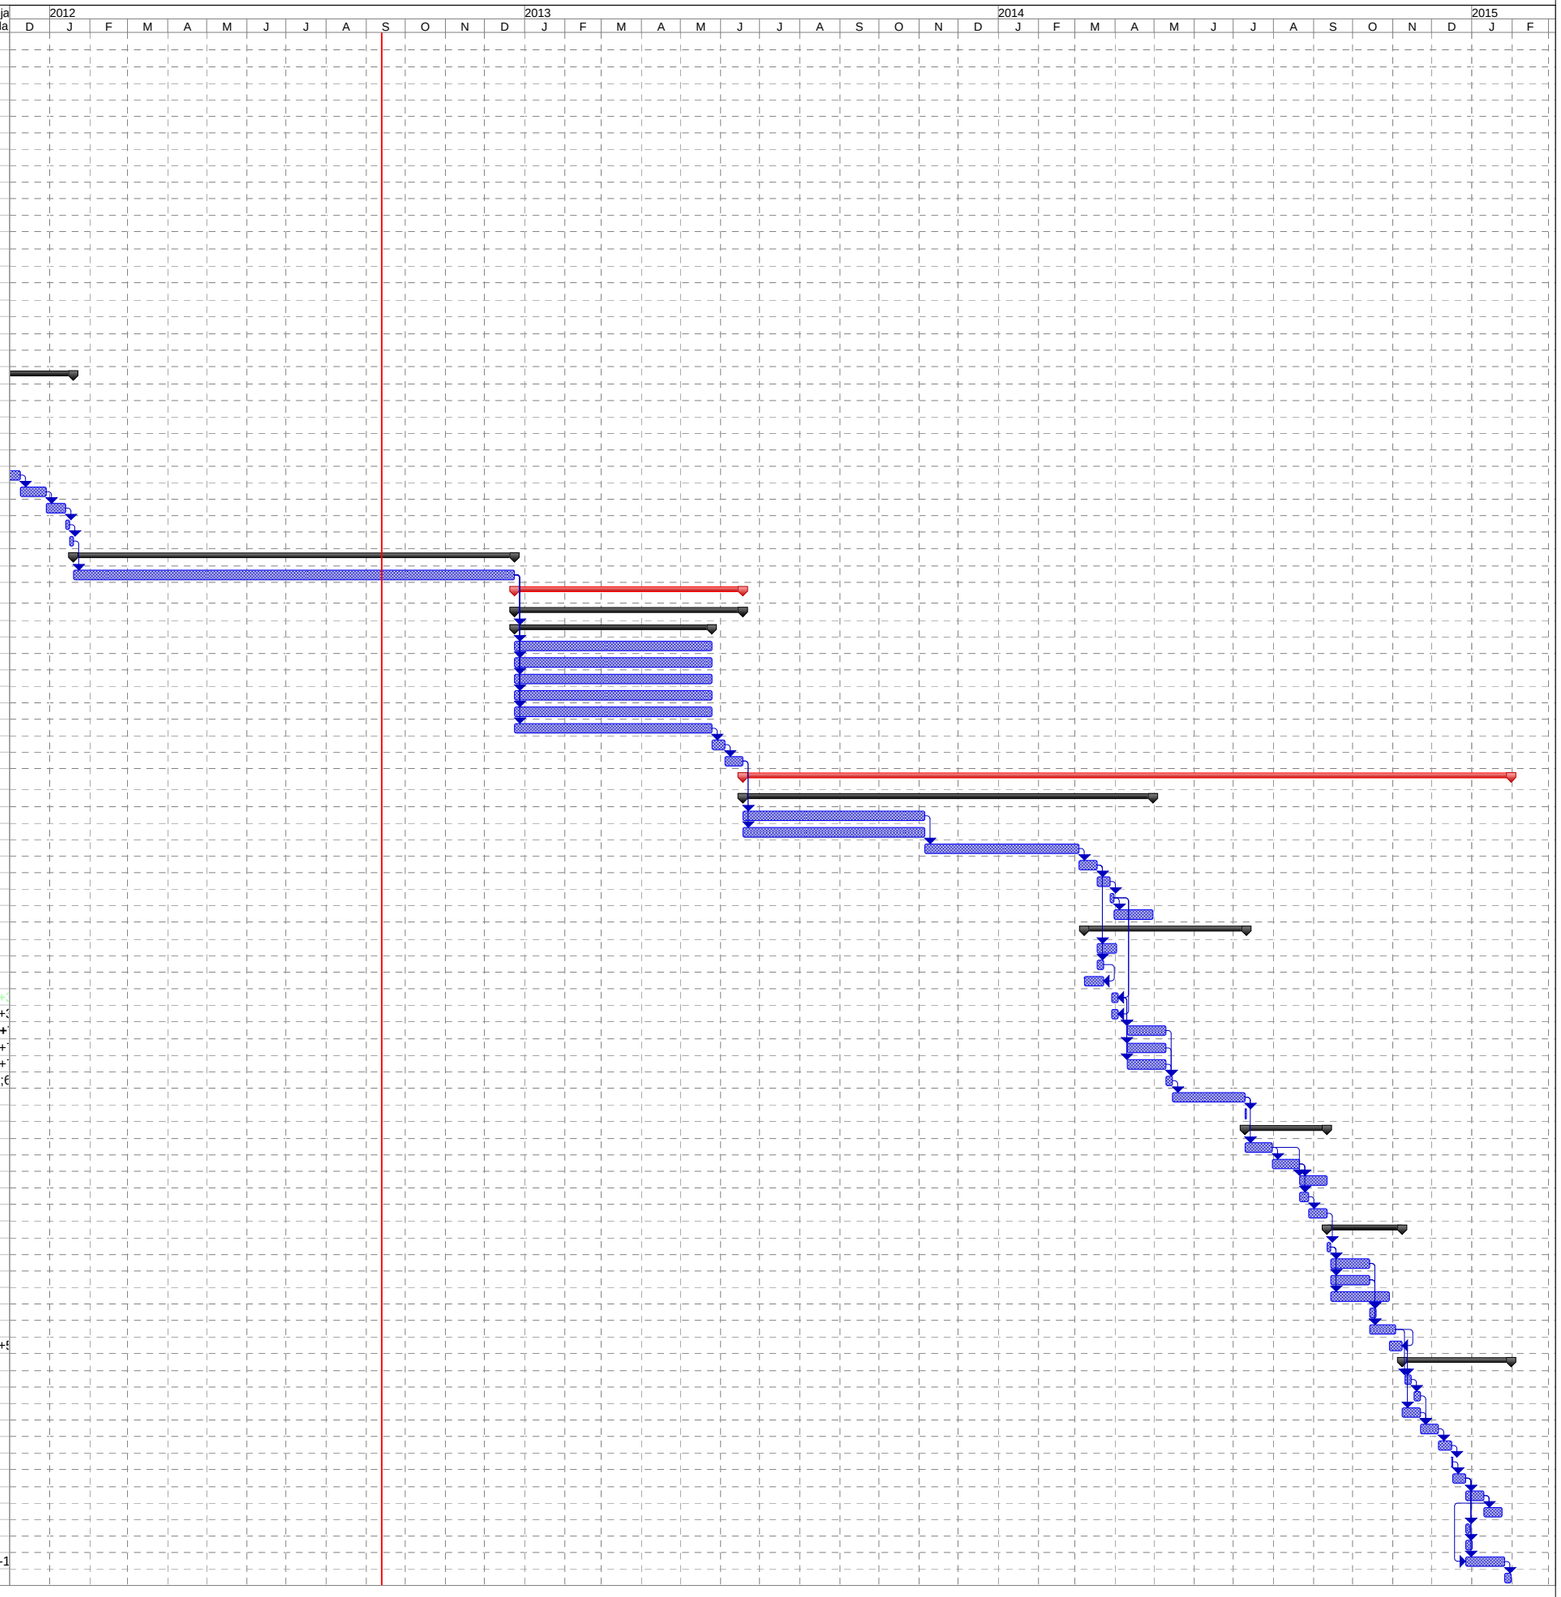ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila
1	**POBUDA MINISTRA ZA GOSPODARSTVO**	**1 dan**	**Pon 18.1.10**	**Pon 18.1.10**	
2	**SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (D**	**144 dnevi**	**Tor 19.1.10**	**Sob 7.8.10**	
3	Presoja pobude	50 dnevi	Tor 19.1.10	Pon 29.3.10	1
4	Priprava osnutka Sklepa o začetku priprave DPN - gradivo za Vlado RS	29	Pon 29.3.10	Tor 27.4.10	3
5	Uskladitev Sklepa - gradiva za Vlado RS - vsebinsko, z investitorjem, zainteres	19	Sre 21.4.10	Pon 10.5.10	
6	Uskladitev s pobudnikom	21	Pon 10.5.10	Pon 31.5.10	5
7	Uskladitev gradiva z MF	32	Pon 10.5.10	Pet 11.6.10	5
8	Uskladitev gradiva s SVZ	32	Pon 10.5.10	Pet 11.6.10	5
9	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	16 dnevi	Pet 11.6.10	Pet 2.7.10	8
10	Obravnava in sprejem Sklepa na Vladi RS	6	Pet 2.7.10	Čet 8.7.10	9
11	Objava Sklepa na spletni strani MOP	2 dnevi	Pet 9.7.10	Pon 12.7.10	10
12	Seznanitev s sklepom in pridobitev razvojnih potreb RRA	30	Čet 8.7.10	Sob 7.8.10	10
13	**OSNUTEK DPN**	**170 dnevi**	**Sob 7.8.10**	**Čet 31.3.11**	
14	**IZDELAVA OSNUTKA DPN (oDPN)**	**54 dnevi**	**Sob 7.8.10**	**Čet 21.10.10**	
15	Izdelava osnutka DPN	75	Sob 7.8.10	Čet 21.10.10	12
16	**SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (NUP)**	**116 dnevi**	**Čet 21.10.10**	**Čet 31.3.11**	
17	Pridobitev smernic NUP in Odločbe o CPVO	126	Čet 21.10.10	Čet 24.2.11	15
18	**ZUPUDPP**	**1 dan**	**Sre 27.10.10**	**Sre 27.10.10**	
19	posredovanje smernic izdelovalcu DPN	5	Čet 24.2.11	Tor 1.3.11	17
20	pregled in pridobitev dopolnitev smernic	30	Tor 1.3.11	Čet 31.3.11	19
21	**NOV SKLEP O PRIPRAVI DPN**	**209 dnevi**	**Pet 1.4.11**	**Sre 18.1.12**	
22	Analiza smernic in usmeritve za prostorsko načrtovanje	196	Pet 1.4.11	Pet 14.10.11	20
23	Priprava osnutka Sklepa o pripravi DPN - gradivo za Vlado RS	6	Pet 14.10.11	Čet 20.10.11	22
24	Prostorska konferenca - 21.10.2011	1 dan	Pet 21.10.11	Pet 21.10.11	23
25	Dopolnitev osnutka Sklepa o pripravi DPN	27	Pet 21.10.11	Čet 17.11.11	24
26	Prostorska konferenca - 18.11.2011	1 potdni	Čet 17.11.11	Pet 18.11.11	25
27	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14 dnevi	Pon 21.11.11	Čet 8.12.11	26
28	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	14 dnevi	Pet 9.12.11	Sre 28.12.11	27
29	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	15	Sre 28.12.11	Čet 12.1.12	28
30	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3	Čet 12.1.12	Ned 15.1.12	29
31	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Ned 15.1.12	Sre 18.1.12	30
32	**IZBOR IZDELOVALCA**	**242 dnevi**	**Sre 18.1.12**	**Ned 23.12.12**	
33	Izbor izdelovalca: PN, javna naročila, podpis pogodbe	340	Sre 18.1.12	Ned 23.12.12	31
34	**ŠTUDIJA VARIANT**	**126 dnevi**	**Pon 24.12.12**	**Pon 17.6.13**	
35	**IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)**	**126 dnevi**	**Pon 24.12.12**	**Pon 17.6.13**	
36	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	110 dnevi	Pon 24.12.12	Pet 24.5.13	33
37	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	110 dnevi	Pon 24.12.12	Pet 24.5.13	33
38	Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik)	110 dnevi	Pon 24.12.12	Pet 24.5.13	33
39	Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidik)	110 dnevi	Pon 24.12.12	Pet 24.5.13	33
40	Izdelava okoljskega elaborata (varstveni vidik)	110 dnevi	Pon 24.12.12	Pet 24.5.13	33
41	Izdelava ocene sprejemljivosti v lokalnem okolju	110 dnevi	Pon 24.12.12	Pet 24.5.13	33
42	Izdelava okoljskega poročila (OP)	110 dnevi	Pon 24.12.12	Pet 24.5.13	33
43	Pregled ŠV/PIZ	10	Pet 24.5.13	Pon 3.6.13	42
44	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	10 dnevi	Tor 4.6.13	Pon 17.6.13	43
45	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**424 dnevi**	**Tor 18.6.13**	**Pet 30.1.15**	
46	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**226 dnevi**	**Tor 18.6.13**	**Tor 29.4.14**	
47	Izdelava strokovnih podlag	100 dnevi	Tor 18.6.13	Pon 4.11.13	44
48	Dopolnitev OP	100 dnevi	Tor 18.6.13	Pon 4.11.13	44
49	Izdelava osnutka DPN	85 dnevi	Tor 5.11.13	Pon 3.3.14	47
50	Pregled osnutka DPN	14	Pon 3.3.14	Pon 17.3.14	49
51	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Pon 17.3.14	Čet 27.3.14	50
52	Vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti OP	3	Čet 27.3.14	Ned 30.3.14	51
53	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Ned 30.3.14	Tor 29.4.14	52
54	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + 2. MNENJE OBČIN**	**89 dnevi**	**Pet 7.3.14**	**Čet 10.7.14**	
55	Organizacija JR in JO	15	Pon 17.3.14	Tor 1.4.14	50
56	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Pon 17.3.14	Sob 22.3.14	50
57	Izdelava povzetka za javnost	15	Pet 7.3.14	Sob 22.3.14	56ZZ
58	Objava javnega naznanila	5	Pet 28.3.14	Sre 2.4.14	52ZZ+
59	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	5	Pet 28.3.14	Sre 2.4.14	52ZZ+
60	**JR in JO**	**30**	**Sre 9.4.14**	**Pet 9.5.14**	**58KZ+**
61	Pripombe in predlogi javnosti	30	Sre 9.4.14	Pet 9.5.14	58KZ+
62	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Sre 9.4.14	Pet 9.5.14	58KZ+
63	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, invsetitorju in izdel	5	Pet 9.5.14	Sre 14.5.14	62;60;6
64	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	40 dnevi	Čet 15.5.14	Sre 9.7.14	63
65	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Sre 9.7.14	Čet 10.7.14	64
66	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**45 dnevi**	**Čet 10.7.14**	**Sre 10.9.14**	
67	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	15 dnevi	Čet 10.7.14	Sre 30.7.14	64
68	Izdelava predloga DPN	15 dnevi	Čet 31.7.14	Sre 20.8.14	67
69	Preveritev/dopolnitev OP	15 dnevi	Čet 21.8.14	Sre 10.9.14	68;67
70	Pregled predloga DPN	5 dnevi	Čet 21.8.14	Sre 27.8.14	68
71	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	10 dnevi	Čet 28.8.14	Sre 10.9.14	70
72	**PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI**	**42 dnevi**	**Sre 10.9.14**	**Pet 7.11.14**	
73	Posredovanje vseh vlog	3	Sre 10.9.14	Sob 13.9.14	71
74	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Sob 13.9.14	Pon 13.10.14	73
75	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Sob 13.9.14	Pon 13.10.14	73
76	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	45	Sob 13.9.14	Tor 28.10.14	73
77	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Pon 13.10.14	Sob 18.10.14	74;75
78	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	20	Pon 13.10.14	Ned 2.11.14	74;75
79	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Tor 28.10.14	Pet 7.11.14	78ZZ+5
80	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**60 dnevi**	**Pet 7.11.14**	**Pet 30.1.15**	
81	Priprava gradiva za vlado	5 dnevi	Pon 10.11.14	Pet 14.11.14	79;78
82	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Pon 17.11.14	Pet 21.11.14	81
83	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 7.11.14	Pet 21.11.14	79
84	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 21.11.14	Pet 5.12.14	82;83
85	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Pet 5.12.14	Pon 15.12.14	84
86	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Pon 15.12.14	Tor 16.12.14	85
87	**Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN**	**10**	**Tor 16.12.14**	**Pet 26.12.14**	**86**
88	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Pet 26.12.14	Pet 9.1.15	87
89	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Pet 9.1.15	Pet 23.1.15	88
90	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3	Pet 26.12.14	Pon 29.12.14	87
91	Izdelava povzetka za javnost	5	Pet 26.12.14	Sre 31.12.14	87
92	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Pet 26.12.14	Ned 25.1.15	88KZ-1
93	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5	Ned 25.1.15	Pet 30.1.15	92
