TERMINSKI PLAN priprave DPN za AC Postojna/Divača-Jelšane

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
1	**POBUDA**	**408 dnevi**	**Sre 20.4.11**	**Pet 9.11.12**		
2	**USKLADITEV POBUDE IN DIIP**	**46 dnevi**	**Sre 20.4.11**	**Sre 22.6.11**		
3	Prejem usklajene pobude	1 dan	Sre 20.4.11	Sre 20.4.11		K
4	Potrditev DIIP in posredovanje DIPP koordinatorju	29 dnevi	Čet 21.4.11	Tor 31.5.11	3	
5	dopolnitev gradiva (pobude)	11 dnevi	Sre 1.6.11	Sre 15.6.11	4	
6	Objava pobude (in DIIP) na spletni strani MOP	5 dnevi	Čet 16.6.11	Sre 22.6.11	5	K
7	**PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI**	**273 dnevi**	**Čet 23.6.11**	**Pon 9.7.12**		
8	Posredovanje vseh vlog	4 dnevi	Čet 23.6.11	Tor 28.6.11	6	K
9	Pridobitev mnenj javnosti	30	Tor 28.6.11	Čet 28.7.11	8	javnost
10	Pridobitev smernic, usmeritev, podatov NUP	81 dnevi	Sre 29.6.11	Sre 19.10.11	8	DNUP;
11	Posredovanje smernic pobudniku, investitorju in izdelovalcu	5 dnevi	Čet 20.10.11	Sre 26.10.11	10	K
12	Vsebinski pregled in analiza smernic	20 dnevi	Čet 27.10.11	Sre 23.11.11	11	K;P;IN;IZ
13	Uskladitev z NUP in pridobitev dopolnitve smernic	80 dnevi	Čet 24.11.11	Sre 14.3.12	11;12	K
14	Uskladitev predloga variant za vrednotenje v ŠV	14 dnevi	Čet 15.3.12	Tor 3.4.12	12;13	
15	Vključevanje javnosti	15 dnevi	Sre 4.4.12	Tor 24.4.12		
16	Organizacija 1. regionalnega posveta	14 dnevi	Sre 4.4.12	Pon 23.4.12	14	K
17	Izvedba 1. reginalnega posveta	1 dan	Tor 24.4.12	Tor 24.4.12	16	P;K;IN;IZ
18	*Izdelava elaborata analize smernic, podatkov in predlogov javnosti*	110	Sre 14.3.12	*Pon 2.7.12*	13	IZ
19	Priprava osnutka sklepa o pripravi DPN	7	Pon 25.6.12	Pon 2.7.12	18ZZ	K
20	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	7	Pon 2.7.12	Pon 9.7.12	19	K;IN
21	**IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE**	**53 dnevi**	**Tor 10.7.12**	**Čet 20.9.12**		
22	Posredovanje osn. sklepa + elaborata analize semernic članom prostorske	7 dnevi	Tor 10.7.12	Sre 18.7.12	20	K
23	Izvedba seje prostorske konference	1 dan	Čet 19.7.12	Čet 19.7.12	22	K
24	Uskladitev predloga variant za vrednotenje v ŠV s pobudnikom	32 dnevi	Pet 20.7.12	Pon 3.9.12	23	
25	Dopolnitev analize smernic	10	Pon 3.9.12	Čet 13.9.12	24	
26	Obravnava gradiva na naslednji PK	7	Čet 13.9.12	Čet 20.9.12	24;25	
27	**SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN**	**45 dnevi**	**Pon 10.9.12**	**Pet 9.11.12**		
28	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Pon 10.9.12	Pet 21.9.12	26ZZ+1 dan	K
29	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3 dnevi	Pon 24.9.12	Sre 26.9.12	28	K;IN
30	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sre 26.9.12	Sre 10.10.12	29	K;MF;P;SVZ
31	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Sre 10.10.12	Sob 20.10.12	30	K
32	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 22.10.12	Pon 22.10.12	31	vlada
33	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10	Pon 22.10.12	Čet 1.11.12	32	vlada
34	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3 dnevi	Pet 2.11.12	Tor 6.11.12	33	vlada
35	Objava sklepa na spletni strani MOP	3 dnevi	Sre 7.11.12	Pet 9.11.12	34	K
36	**ŠTUDIJA VARIANT**	**568 dnevi**	**Tor 17.4.12**	**Pet 20.6.14**		
37	**IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)**	**423 dnevi**	**Tor 17.4.12**	**Sob 30.11.13**		
38	**IZBOR IZDELOVALCA STROKOVNIH PODLAG, OP in ŠV/PIZ**	**108 dnevi**	**Tor 17.4.12**	**Pet 14.9.12**		
39	Priprava osnutka projektne naloge	15	Tor 17.4.12	Sre 2.5.12	40ZK	IN
40	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	15	Sre 2.5.12	Čet 17.5.12	41ZK	IN;P;K
41	Izbor izdelovalca: javna naročila	100	Čet 17.5.12	Sob 25.8.12	42ZK	IN
42	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Sob 25.8.12	Pet 14.9.12		IN
43	Izdelava strokovnih podlag za ŠV/PIZ	192 dnevi	Čet 20.9.12	Tor 18.6.13		
44	Priprava osnutka projektne naloge	15	Čet 20.9.12	Pet 5.10.12	26	IN
45	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	7	Pet 5.10.12	Pet 12.10.12	44	IN;P;K
46	Izbor izdelovalca: javna naročila	100	Pet 12.10.12	Ned 20.1.13	45	IN
47	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Ned 20.1.13	Sob 9.2.13	33KZ+20 dnevi;4	IN
48	Izdelava SP (HHA, speleološko ekspertno mnenje, dodatek za varovana območja)	90	Sob 9.2.13	Pet 10.5.13	47	
49	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	120	Pon 18.2.13	Tor 18.6.13	48KZ-60 dnevi	IZ
50	Izdelava prometno-ekonomskega elaborata	120	Pon 18.2.13	Tor 18.6.13	48KZ-60 dnevi	IZ
51	Izdelava prostorsko-razvojnega elaborata (prostorski vidik)	120	Pon 18.2.13	Tor 18.6.13	48KZ-60 dnevi	IZ
52	Izdelava okoljskega poročila brez ocene sprejemljivosti plana	120	Pon 18.2.13	Tor 18.6.13	48KZ-60 dnevi	IZ
53	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	90	Tor 18.6.13	Pon 16.9.13	49;50;51;52	IZ
54	Izdelava okoljskega poročila (OP) - zaključek	15	Pon 16.9.13	Tor 1.10.13	53	IZ
55	pregled ŠV/PIZ	15	Pon 16.9.13	Tor 1.10.13	53	K;recenzent;P
56	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	30	Tor 1.10.13	Čet 31.10.13	55	IZ
57	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Čet 31.10.13	Sob 30.11.13	56;54	SCPVO
58	**JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV IN OP + 1. MNENJE OBČIN**	**121 dnevi**	**Pon 16.9.13**	**Pon 3.3.14**		
59	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Čet 10.10.13	Čet 31.10.13	56ZZ	
60	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Čet 31.10.13	Tor 5.11.13	59	K;IZ;IN

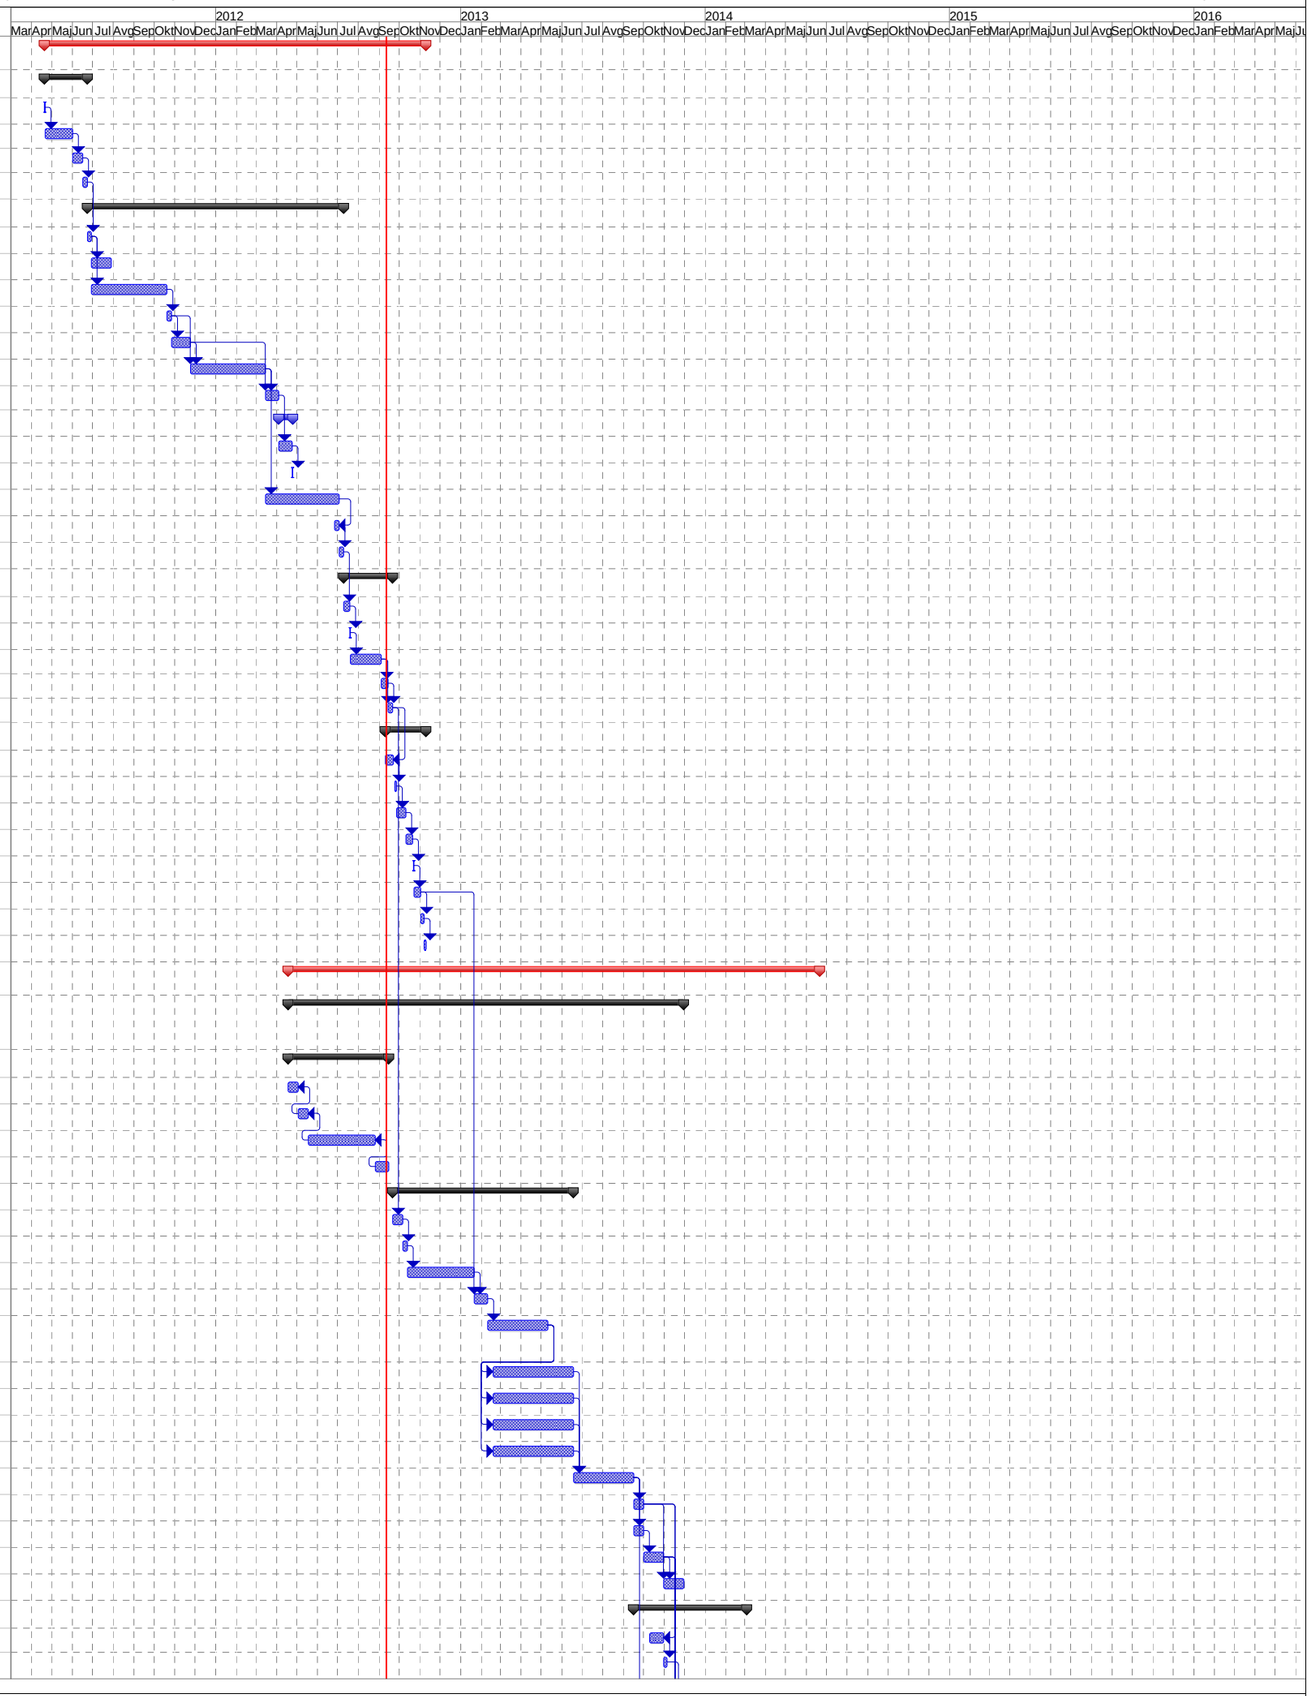

TERMINSKI PLAN priprave DPN za AC Postojna/Divača-Jelšane

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
61	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Tor 29.10.13	Tor 5.11.13	60ZZ	IZ
62	Objava javnega naznanila	5	Sob 26.10.13	Čet 31.10.13	56ZZ;54ZZ	K;izbran medij
63	Predstavitev variant občinam in predstavnikom javnosti	1 dan	Pon 16.9.13	Pon 16.9.13	53	P:K;IN:IZ
64	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	15	Pon 16.9.13	Tor 1.10.13	63	P:K;IN:IZ
65	Posredovanje ŠV/PIZ in PNV ter OP občinam	1 potdni	Sre 30.10.13	Čet 31.10.13	56ZZ;54ZZ	K
66	JR in JO	30	Čet 7.11.13	Sob 7.12.13	62KZ+7	K
67	Pripombe in predlogi javnosti	30	Čet 7.11.13	Sob 7.12.13	62KZ+7	javnost
68	Pripombe in predlogi občin + 1. mnenje občin	30	Čet 7.11.13	Sob 7.12.13	62KZ+7	LNUP
69	Posredovanje pripomb in predlogov + 1. mnenj pobudniku, investitorju in i:	30	Sre 13.11.13	Pet 13.12.13	68ZZ+5 dnevi;66	K
70	Priprava in uskladitev stališč do pripomb	45	Čet 28.11.13	Ned 12.1.14	69KZ-15	K;P;IN;IZ
71	Podpis stališč, objava stališč na spletu in posredovanje občinam	3 dnevi	Pon 13.1.14	Sre 15.1.14	70	K
72	**Dopolnitev strokovnih podlag in ŠV/PIZ s PNV**	**36 dnevi**	**Ned 5.1.14**	**Pon 24.2.14**		**IZ**
73	Dopolnitev strokovnih podlag	30	Ned 5.1.14	Tor 4.2.14	71KZ-10	IZ
74	Dopolnitev ŠV/PIZ	20	Tor 4.2.14	Pon 24.2.14	73	IZ
75	Dopolnitev OP	30	Sob 1.2.14	Pon 3.3.14	72ZZ+7	
76	**PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV**	**38 dnevi**	**Tor 4.3.14**	**Pet 25.4.14**		
77	Posredovanje vseh vlog	1 dan	Tor 4.3.14	Tor 4.3.14	75;74	K
78	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30	Tor 4.3.14	Čet 3.4.14	77	K
79	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30	Tor 4.3.14	Čet 3.4.14	77	K
80	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV	30	Tor 4.3.14	Čet 3.4.14	77	K
81	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	30	Ned 9.3.14	Tor 8.4.14	78ZZ+5 ;79ZZ+5	K
82	Uskladitev strokovnih podlag,ŠV/PIZ s PNV in OP z mnenji	30	Sre 26.3.14	Pet 25.4.14	81KZ-10 dnevi	IN;IZ
83	**Potrditev ŠV/PIZ na Komisji za potrjevanje investicijske dokumentacije**	30	Pet 25.4.14	Ned 25.5.14	82	P
84	**SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI PNV**	**45 dnevi**	**Sob 19.4.14**	**Pet 20.6.14**		
85	Priprava osnutka sklepa o potrditvi PNV	10	Sob 19.4.14	Tor 29.4.14	82ZZ+3 dnevi	K
86	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem) - opc	3 dnevi	Sre 30.4.14	Pet 2.5.14	85	K;P;IN
87	Priprava gradiva za vlado	10	Tor 22.4.14	Pet 2.5.14	86ZZ	K
88	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5	Pet 2.5.14	Sre 7.5.14	87ZZ+3 dnevi	K;IN
89	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sre 7.5.14	Sre 21.5.14	88	K;MF;SVZ;P
90	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Sre 21.5.14	Sob 31.5.14	89	K
91	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 2.6.14	Pon 2.6.14	90	vlada
92	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	10	Pon 2.6.14	Čet 12.6.14	91	vlada
93	Posredovanje sklepa koordinatroju, pobudniku, investiroju, vsem NUP	3 dnevi	Pet 13.6.14	Tor 17.6.14	92	vlada
94	Objava sklepa na spletni strani MOP	3 dnevi	Sre 18.6.14	Pet 20.6.14	93	K
95	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**1293 dnevi?**	**Sre 20.4.11**	**Pet 1.4.16**		
96	**IZBOR IZDELOVALCA podrobnih strokovnih podlag, PVO in DPN**	**102 dnevi**	**Pon 10.3.14**	**Sre 30.7.14**		
97	Priprava osnutka projektne naloge	15	Pon 10.3.14	Tor 25.3.14	98ZK	IN
98	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	7	Tor 25.3.14	Tor 1.4.14	99ZK	IN;P;K
99	Izbor izdelovalca: javna naročila	100	Tor 1.4.14	Čet 10.7.14	100ZK	IN
100	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Čet 10.7.14	Sre 30.7.14	88ZZ;92KZ+20 c	IN
101	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**252 dnevi**	**Sre 30.7.14**	**Sob 18.7.15**		
102	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	175	Sre 30.7.14	Sre 21.1.15	100	IZ
103	Recenzija strokovnih podlag	45	Sre 21.1.15	Sob 7.3.15	102	
104	Popravki strokovnih podlag po recenziji	20	Sob 7.3.15	Pet 27.3.15	103	
105	Izdelava poročila o vplivih na okolje (PVO)	45	Pet 27.3.15	Pon 11.5.15	104	IZ
106	Izdelava osnutka DPN	30	Pet 27.3.15	Ned 26.4.15	104	IZ
107	Recenzija poročila o vplivih na okolje (PVO)	20	Pon 11.5.15	Ned 31.5.15	105	IN[50%];recenzent[50%]
108	Ppregled osnutka DPN	10	Ned 26.4.15	Sre 6.5.15	106	K
109	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	15	Sre 6.5.15	Čet 21.5.15	108	IZ
110	Dopolnitev poročila o vplivih na okolje (PVO) po recenziji	15	Ned 31.5.15	Pon 15.6.15	107	IZ
111	Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	3 dnevi	Tor 16.6.15	Čet 18.6.15	110;109	IN
112	Pridobitev osnutka OVS	30	Čet 18.6.15	Sob 18.7.15	111	SPVO
113	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN**	**100 dnevi**	**Ned 10.5.15**	**Ned 27.9.15**		
114	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Tor 16.6.15	Pon 6.7.15	105ZZ;106ZZ;11	K;občine
115	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5 dnevi	Tor 7.7.15	Pon 13.7.15	114	K;IN
116	Izdelava povzetka za javnost	15 dnevi	Pet 26.6.15	Čet 16.7.15	115ZZ+3 dnevi	IZ

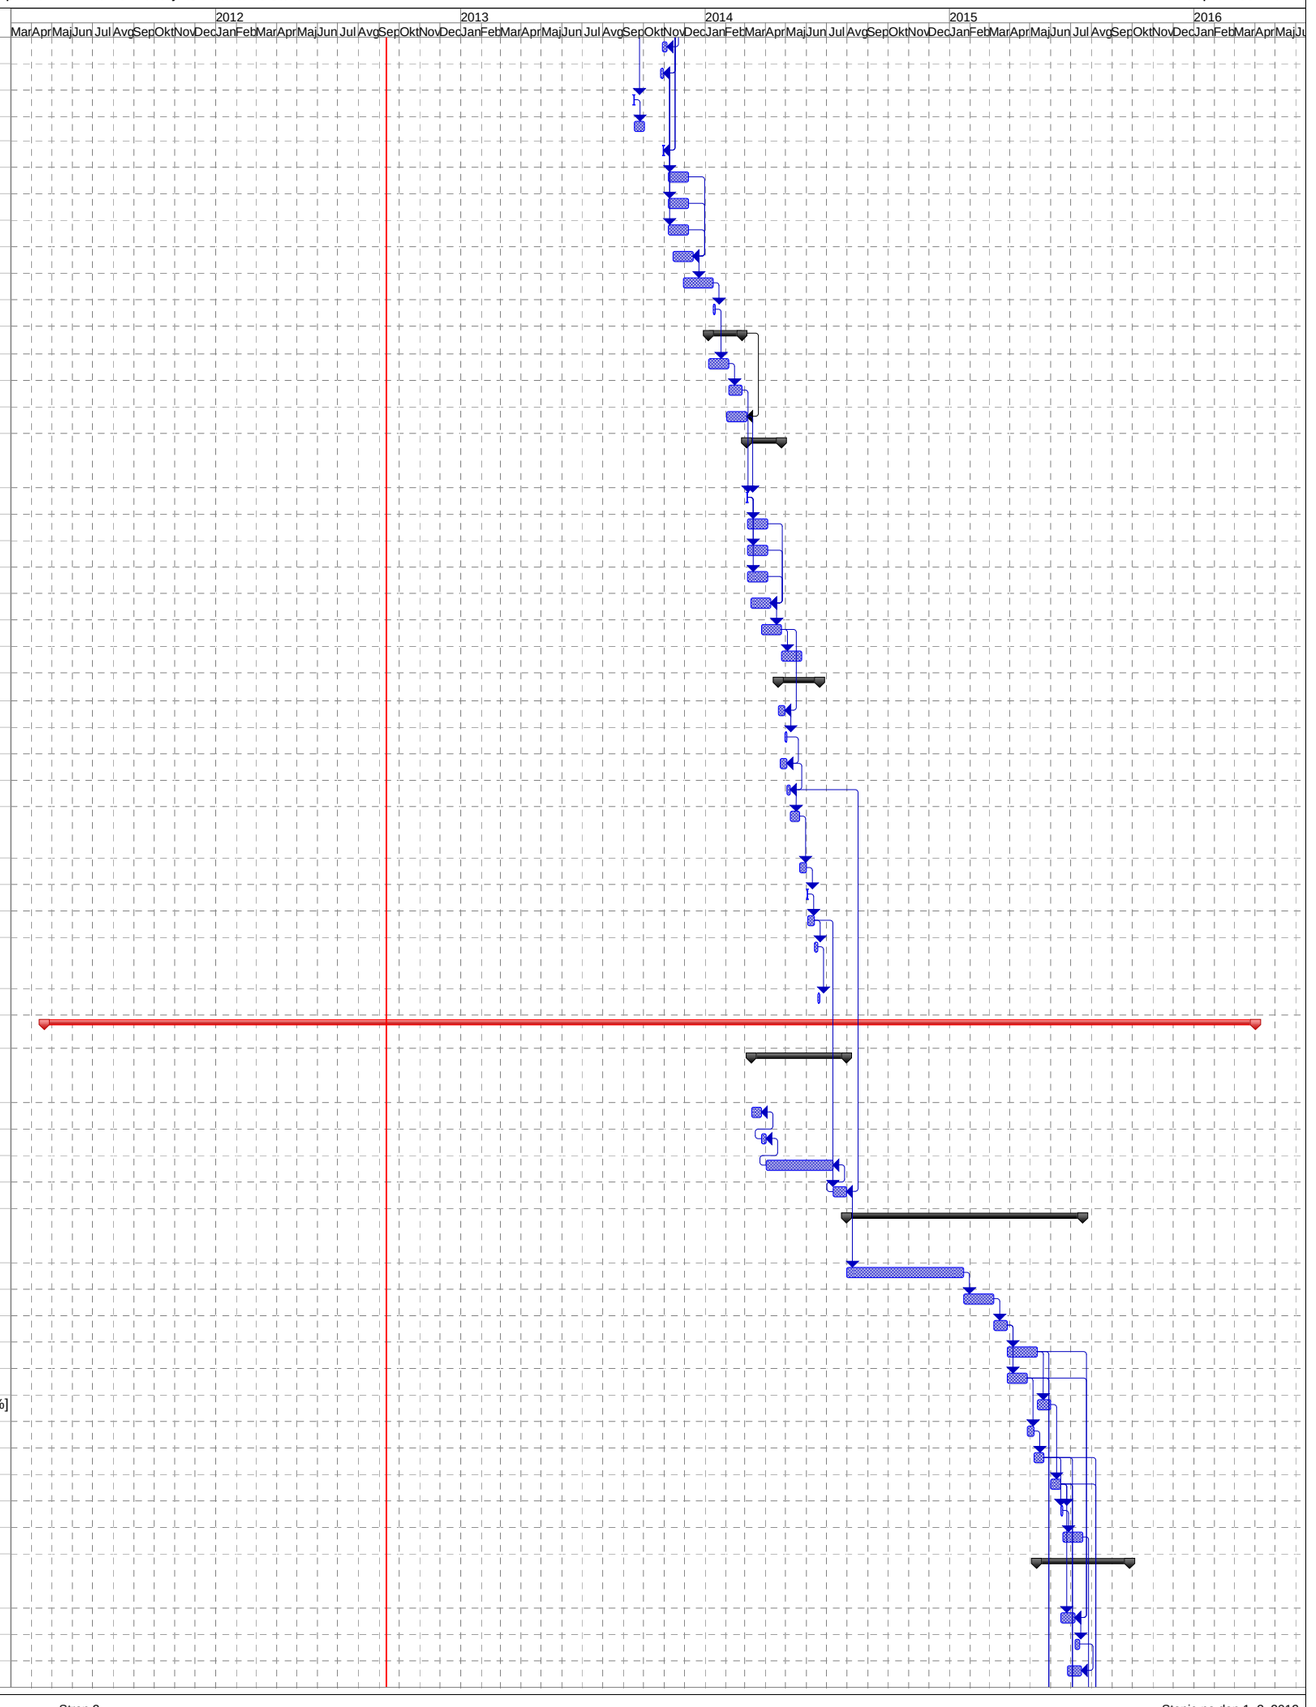

TERMINSKI PLAN priprave DPN za AC Postojna/Divača-Jelšane
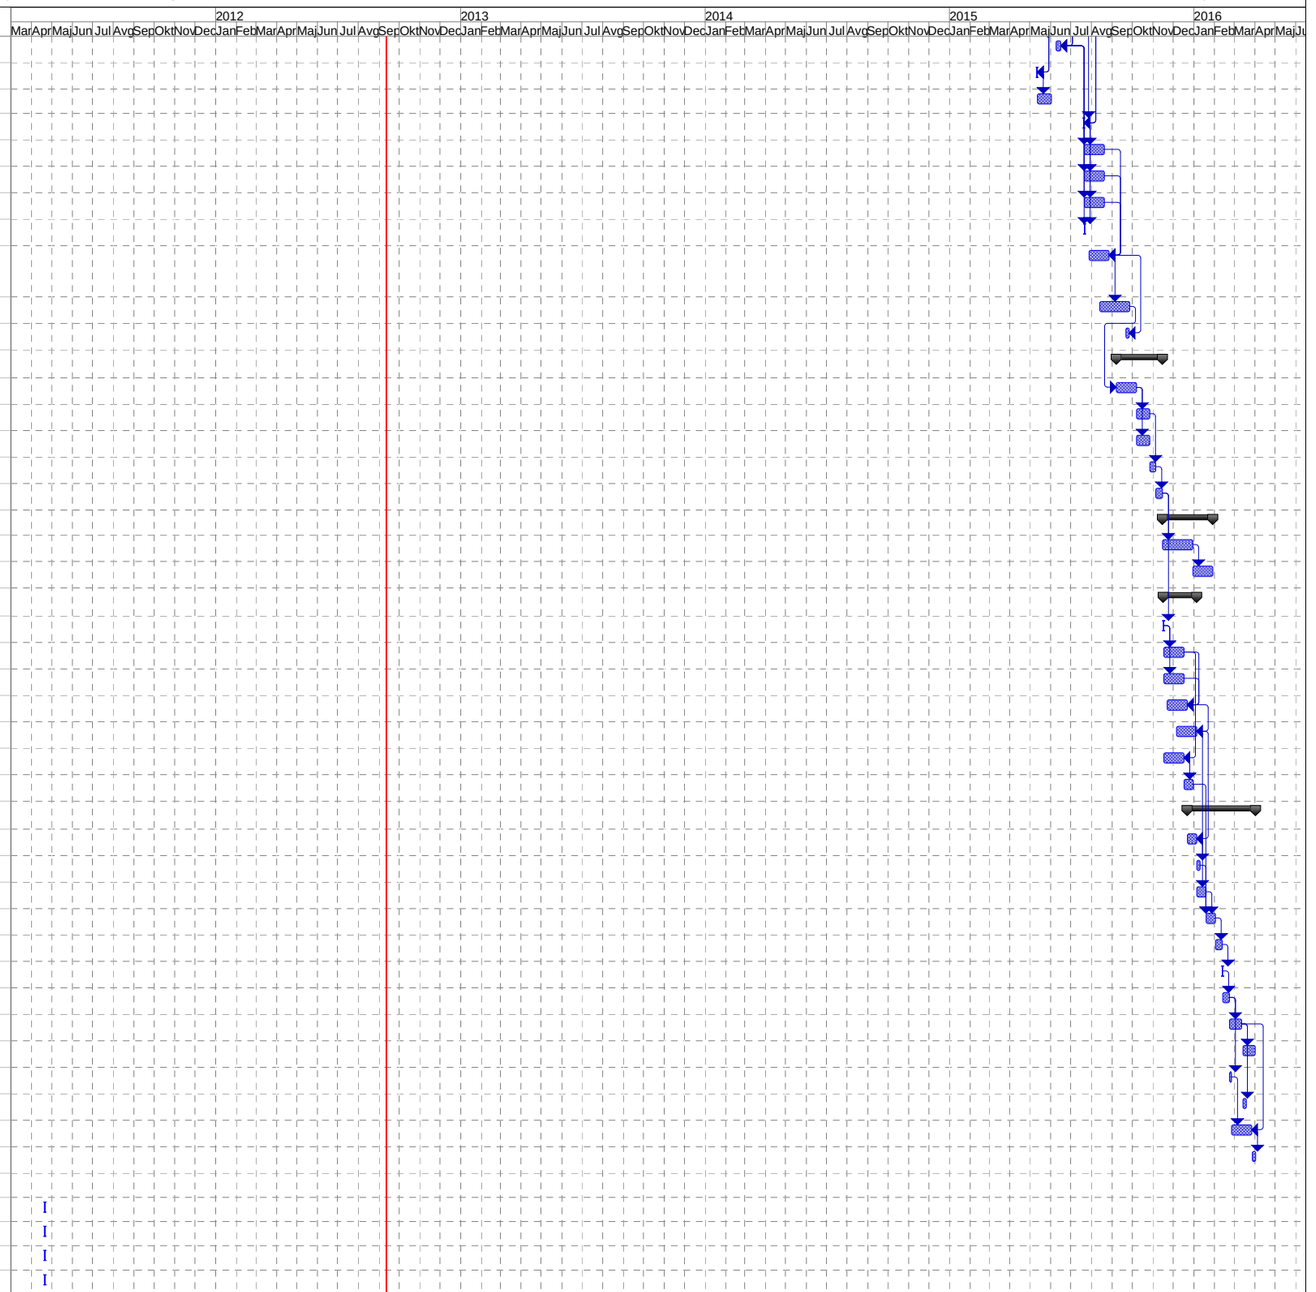
ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
117	Objava javnega naznanila	5 dnevi	Tor 9.6.15	Pon 15.6.15	109ZZ;110ZZ	K;izbran medij
118	Predstavitev rešitve občinam in predstavnikom javnosti	1 potdni	Ned 10.5.15	Pon 11.5.15	105ZZ;106ZZ	P;K;IN;IZ
119	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	15 dnevi	Tor 12.5.15	Pon 1.6.15	118	P;K;IN;IZ
120	Posredovanje osnutka DPN, PVO in osnutka OVS občinam	1 dan	Pon 20.7.15	Pon 20.7.15	109ZZ;110ZZ;11	K
121	JR in JO	30	Pon 20.7.15	Sre 19.8.15	117KZ+7 ;120	K
122	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pon 20.7.15	Sre 19.8.15	117KZ+7 ;120	javnost
123	Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Pon 20.7.15	Sre 19.8.15	117KZ+7 ;120	LNUP
124	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS (opcija)	1 dan	Tor 21.7.15	Tor 21.7.15	117KZ+7 ;120	javnost
125	Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalcu ter Sektorju za PVO	30	Pon 27.7.15	Sre 26.8.15	123ZZ+5 dnevi;121ZZ+5 dnevi;122ZZ+5	K
126	Priprava in uskladitev stališč do pripomb in predlogov	45	Čet 13.8.15	Ned 27.9.15	125KZ-10 dnevi	K;IZ;IN;P
127	Podpis in objava stališč na spletu in posredovanje občinam	5 dnevi	Pon 21.9.15	Pet 25.9.15	125ZZ+30	K
128	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**50 dnevi**	**Pon 7.9.15**	**Sob 14.11.15**		
129	Dopolnitev strokovnih podlag	30	Pon 7.9.15	Sre 7.10.15	126KZ-15 dnevi	IZ
130	Izdelava predloga DPN	20	Sre 7.10.15	Tor 27.10.15	129	IZ
131	Dopolnitev PVO	20	Sre 7.10.15	Tor 27.10.15	129	SPVO
132	Pregled predloga DPN	7 dnevi	Tor 27.10.15	Sre 4.11.15	130	K
133	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	10	Sre 4.11.15	Sob 14.11.15	132	IZ
134	**IZDELAVA INVESTICIJSKE ZASNOVE (opcija)**	**54 dnevi**	**Sob 14.11.15**	**Čet 28.1.16**		
135	Izdelava investicijske zasnove (IZ)	45	Sob 14.11.15	Tor 29.12.15	133	IZ
136	Potrditev IZ na Komisji za potrjevanje investicijske dokumentacije	30	Tor 29.12.15	Čet 28.1.16	135	P
137	**PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS**	**36 dnevi**	**Pon 16.11.15**	**Pon 4.1.16**		
138	Posredovanje vseh vlog	1 dan	Pon 16.11.15	Pon 16.11.15	133	K
139	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pon 16.11.15	Sre 16.12.15	138	DNUP
140	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pon 16.11.15	Sre 16.12.15	138	DNUP
141	Posredovanje mnenj NUP investitorju	30	Sob 21.11.15	Pon 21.12.15	139ZZ+3 dnevi;1	K
142	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	30	Sob 5.12.15	Pon 4.1.16	141ZZ+10 dnevi	K;IZ;DNUP;IN;P
143	Pridobitev odločbe o OVS	30	Pon 16.11.15	Sre 16.12.15	139ZZ	SPVO
144	Pravnomočnost odločbe o OVS	14	Sre 16.12.15	Sre 30.12.15	143	
145	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**74 dnevi**	**Tor 22.12.15**	**Pet 1.4.16**		
146	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Tor 22.12.15	Pon 4.1.16	142ZZ	K
147	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5	Pon 4.1.16	Sob 9.1.16	146	K;IN
148	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pon 4.1.16	Pon 18.1.16	142	lektorji
149	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pon 18.1.16	Pon 1.2.16	147;148;144	P;K;MF;SVZ
150	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Pon 1.2.16	Čet 11.2.16	149	K
151	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pet 12.2.16	Pet 12.2.16	150	vlada
152	**Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN**	10	Pet 12.2.16	**Pon 22.2.16**	151	vlada
153	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Tor 23.2.16	Pet 11.3.16	152	vlada
154	Uveljavitev uredbe o DPN	14 dnevi	Pon 14.3.16	Čet 31.3.16	153	
155	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3 dnevi	Tor 23.2.16	Čet 25.2.16	152	vlada;K
156	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Pon 14.3.16	Pet 18.3.16	153	IZ
157	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Čet 25.2.16	Sob 26.3.16	153ZZ;155	IZ
158	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5 dnevi	Pon 28.3.16	Pet 1.4.16	157	K
159						
160	*Roki iz terminskega plana, ki se nanašajo na aktivnosti oziroma faze,	1 dan?	Sre 20.4.11	Sre 20.4.11		
161	za katere DARS d.d. zagotavlja potrebno dokumentacijo so izvedljivi ob	1 dan?	Sre 20.4.11	Sre 20.4.11		
162	pogoju, da se nemudoma reši vprašanje financiranja nalog s področja	1 dan?	Sre 20.4.11	Sre 20.4.11		
163	prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor med RS in DARS d.d..	1 dan?	Sre 20.4.11	Sre 20.4.11
