ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila
1	**POBUDA**	**424 dnevi**	**Pon 3.1.11**	**Čet 16.8.12**	
69	**ŠTUDIJA VARIANT**	**463 dnevi**	**Pon 21.3.11**	**Sre 26.12.12**	
70	**IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)**	**83 dnevi**	**Pon 21.3.11**	**Sre 13.7.11**	
71	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	1 dan	Pon 21.3.11	Pon 21.3.11	
72	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	1 dan	Pon 21.3.11	Pon 21.3.11	
73	Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik)	1 dan	Pon 21.3.11	Pon 21.3.11	
74	Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidik)	1 dan	Pon 21.3.11	Pon 21.3.11	
75	Izdelava okoljskega elaborata (varstveni vidik)	1 dan	Pon 21.3.11	Pon 21.3.11	
76	Izdleava ocene sprejemljivosti v lokalnem okolju	1 dan	Pon 21.3.11	Pon 21.3.11	
77	Izdelava okoljskega poročila (OP)	1 dan	Pon 21.3.11	Pon 21.3.11	
78	Recenzija (pregled) ŠV/PIZ	45	Pon 21.3.11	Čet 5.5.11	71
79	Vključevanje javnosti	27 dnevi	Pet 6.5.11	Pon 13.6.11	
83	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	10 dnevi	Tor 31.5.11	Pon 13.6.11	81;78
84	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Pon 13.6.11	Sre 13.7.11	83;77
85	**JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV IN OP + 1. MNENJE OBČIN**	**295 dnevi**	**Čet 14.7.11**	**Sre 29.8.12**	
86	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Čet 14.7.11	Sre 3.8.11	84
87	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5 dnevi	Čet 4.8.11	Sre 10.8.11	86
88	Izdelava povzetka za javnost	15 dnevi	Čet 11.8.11	Sre 31.8.11	86;87
89	Objava javnega naznanila	5 dnevi	Čet 11.8.11	Sre 17.8.11	87
90	Posredovanje ŠV/PIZ in PNV ter OP občinam	5 dnevi	Čet 1.9.11	Sre 7.9.11	87;88
91	JR in JO	30	Pon 18.6.12	Sre 18.7.12	89
92	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pon 18.6.12	Sre 18.7.12	91SS
93	Pripombe in predlogi občin + 1. mnenje občin	30	Pon 18.6.12	Sre 18.7.12	91SS
94	Posredovanje pripomb in predlogov + 1. mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sektorju za Cl	3 dnevi	Sre 18.7.12	Pet 20.7.12	93;91;92
95	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb	30	Pet 20.7.12	Ned 19.8.12	94
96	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Pon 20.8.12	Pon 20.8.12	95
97	Dopolnitev ŠV/PIZ in PNV ter OP	30	Pon 30.7.12	Sre 29.8.12	95SS+10
98	**PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV**	**60 dnevi**	**Čet 30.8.12**	**Sre 21.11.12**	
99	Posredovanje vseh vlog	1 dan	Čet 30.8.12	Čet 30.8.12	97
100	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30	Pon 3.9.12	Sre 3.10.12	99KZ+2 dnevi
101	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30	Pon 3.9.12	Sre 3.10.12	100SS
102	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV	45	Pon 3.9.12	Čet 18.10.12	100SS
103	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	3 dnevi	Pet 19.10.12	Tor 23.10.12	100;101;102
104	Uskladitev ŠV/PIZ in PNV z mnenji	21 dnevi	Pet 19.10.12	Pet 16.11.12	100;101;102
105	Priprava osnutka sklepa o potrditvi PNV	10 dnevi	Tor 6.11.12	Pon 19.11.12	104ZZ+1 dan
106	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem) - opcija	2 dnevi	Tor 20.11.12	Sre 21.11.12	105
107	**IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE (opcija)**	**0 dnevi**	**Sre 21.11.12**	**Sre 21.11.12**	
112	**SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI PNV**	**31 dnevi**	**Sre 14.11.12**	**Sre 26.12.12**	
113	Priprava gradiva za vlado	5 dnevi	Sre 14.11.12	Tor 20.11.12	105ZZ+1 dan
114	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	2 dnevi	Sre 21.11.12	Čet 22.11.12	105;113
115	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Čet 22.11.12	Čet 6.12.12	114
116	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	5 dnevi	Pet 7.12.12	Čet 13.12.12	115
117	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pet 14.12.12	Pet 14.12.12	116
118	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	7	Pet 14.12.12	Pet 21.12.12	117
119	Posredovanje sklepa koordinatroju, pobudniku, investiroju, vsem NUP	3 dnevi	Pon 24.12.12	Sre 26.12.12	118
120	Objava sklepa na spletni strani MzIP	1 dan	Sre 26.12.12	Sre 26.12.12	119ZZ
121	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**280 dnevi**	**Čet 27.12.12**	**Sre 22.1.14**	
122	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**93 dnevi**	**Čet 27.12.12**	**Pon 6.5.13**	
123	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	50 dnevi	Čet 27.12.12	Sre 6.3.13	120
124	Izdelava osnutka DPN	40	Sre 6.3.13	Pon 15.4.13	123
125	Recenzija (pregled) osnutka DPN	14	Pon 15.4.13	Pon 29.4.13	124
126	Vključevanje javnosti	0 dnevi	Pon 29.4.13	Pon 29.4.13	

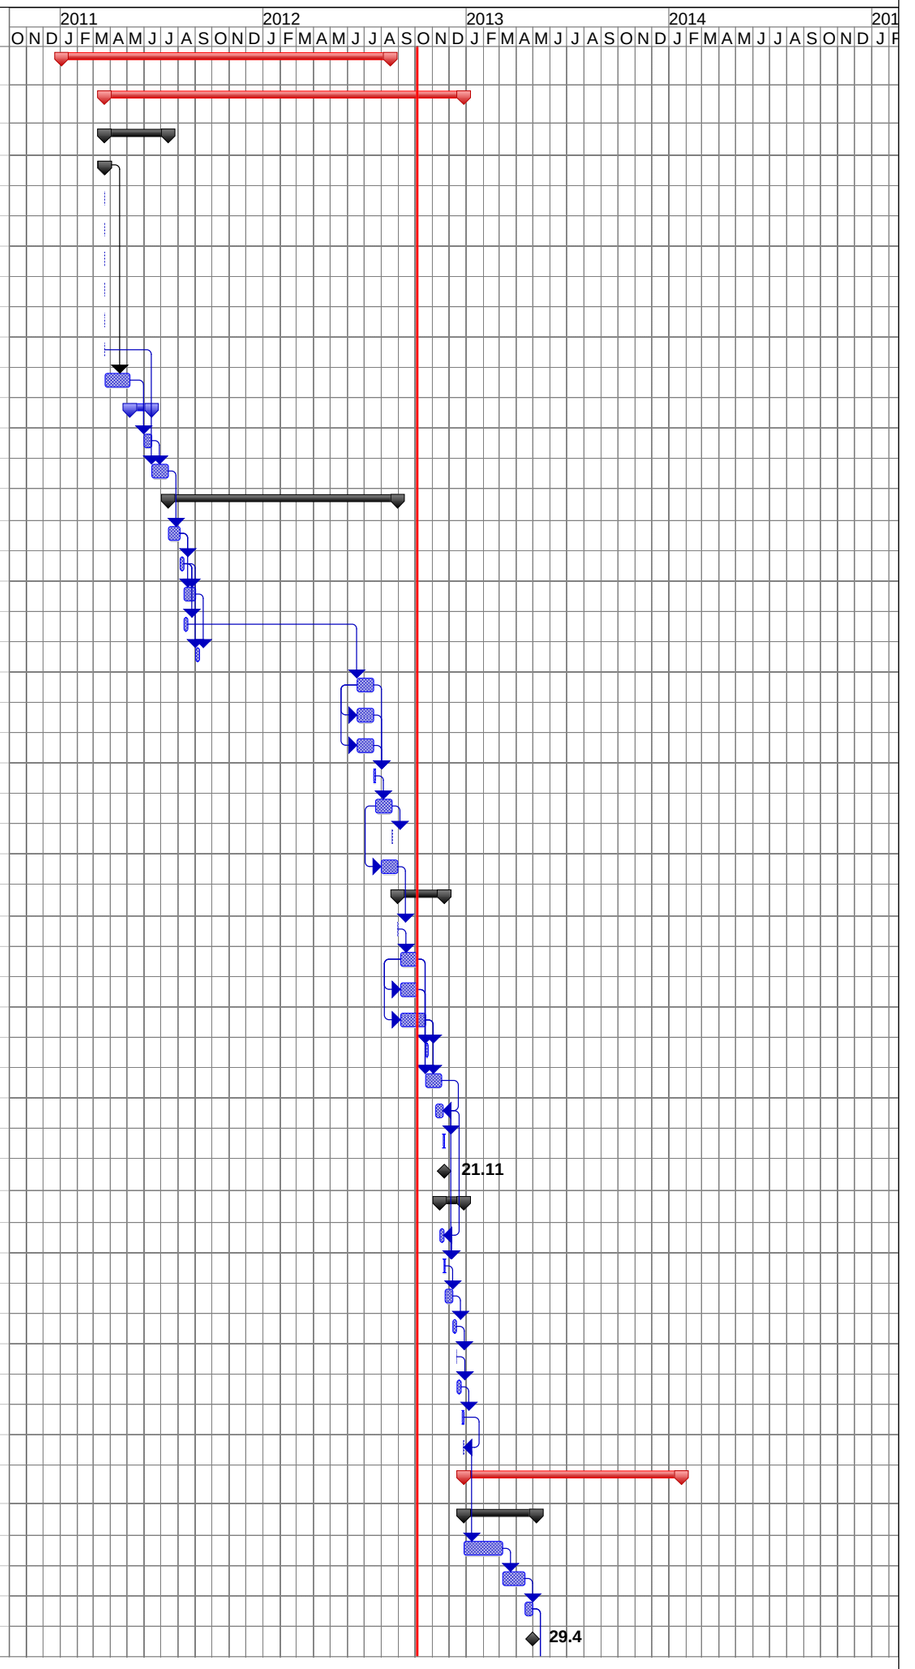
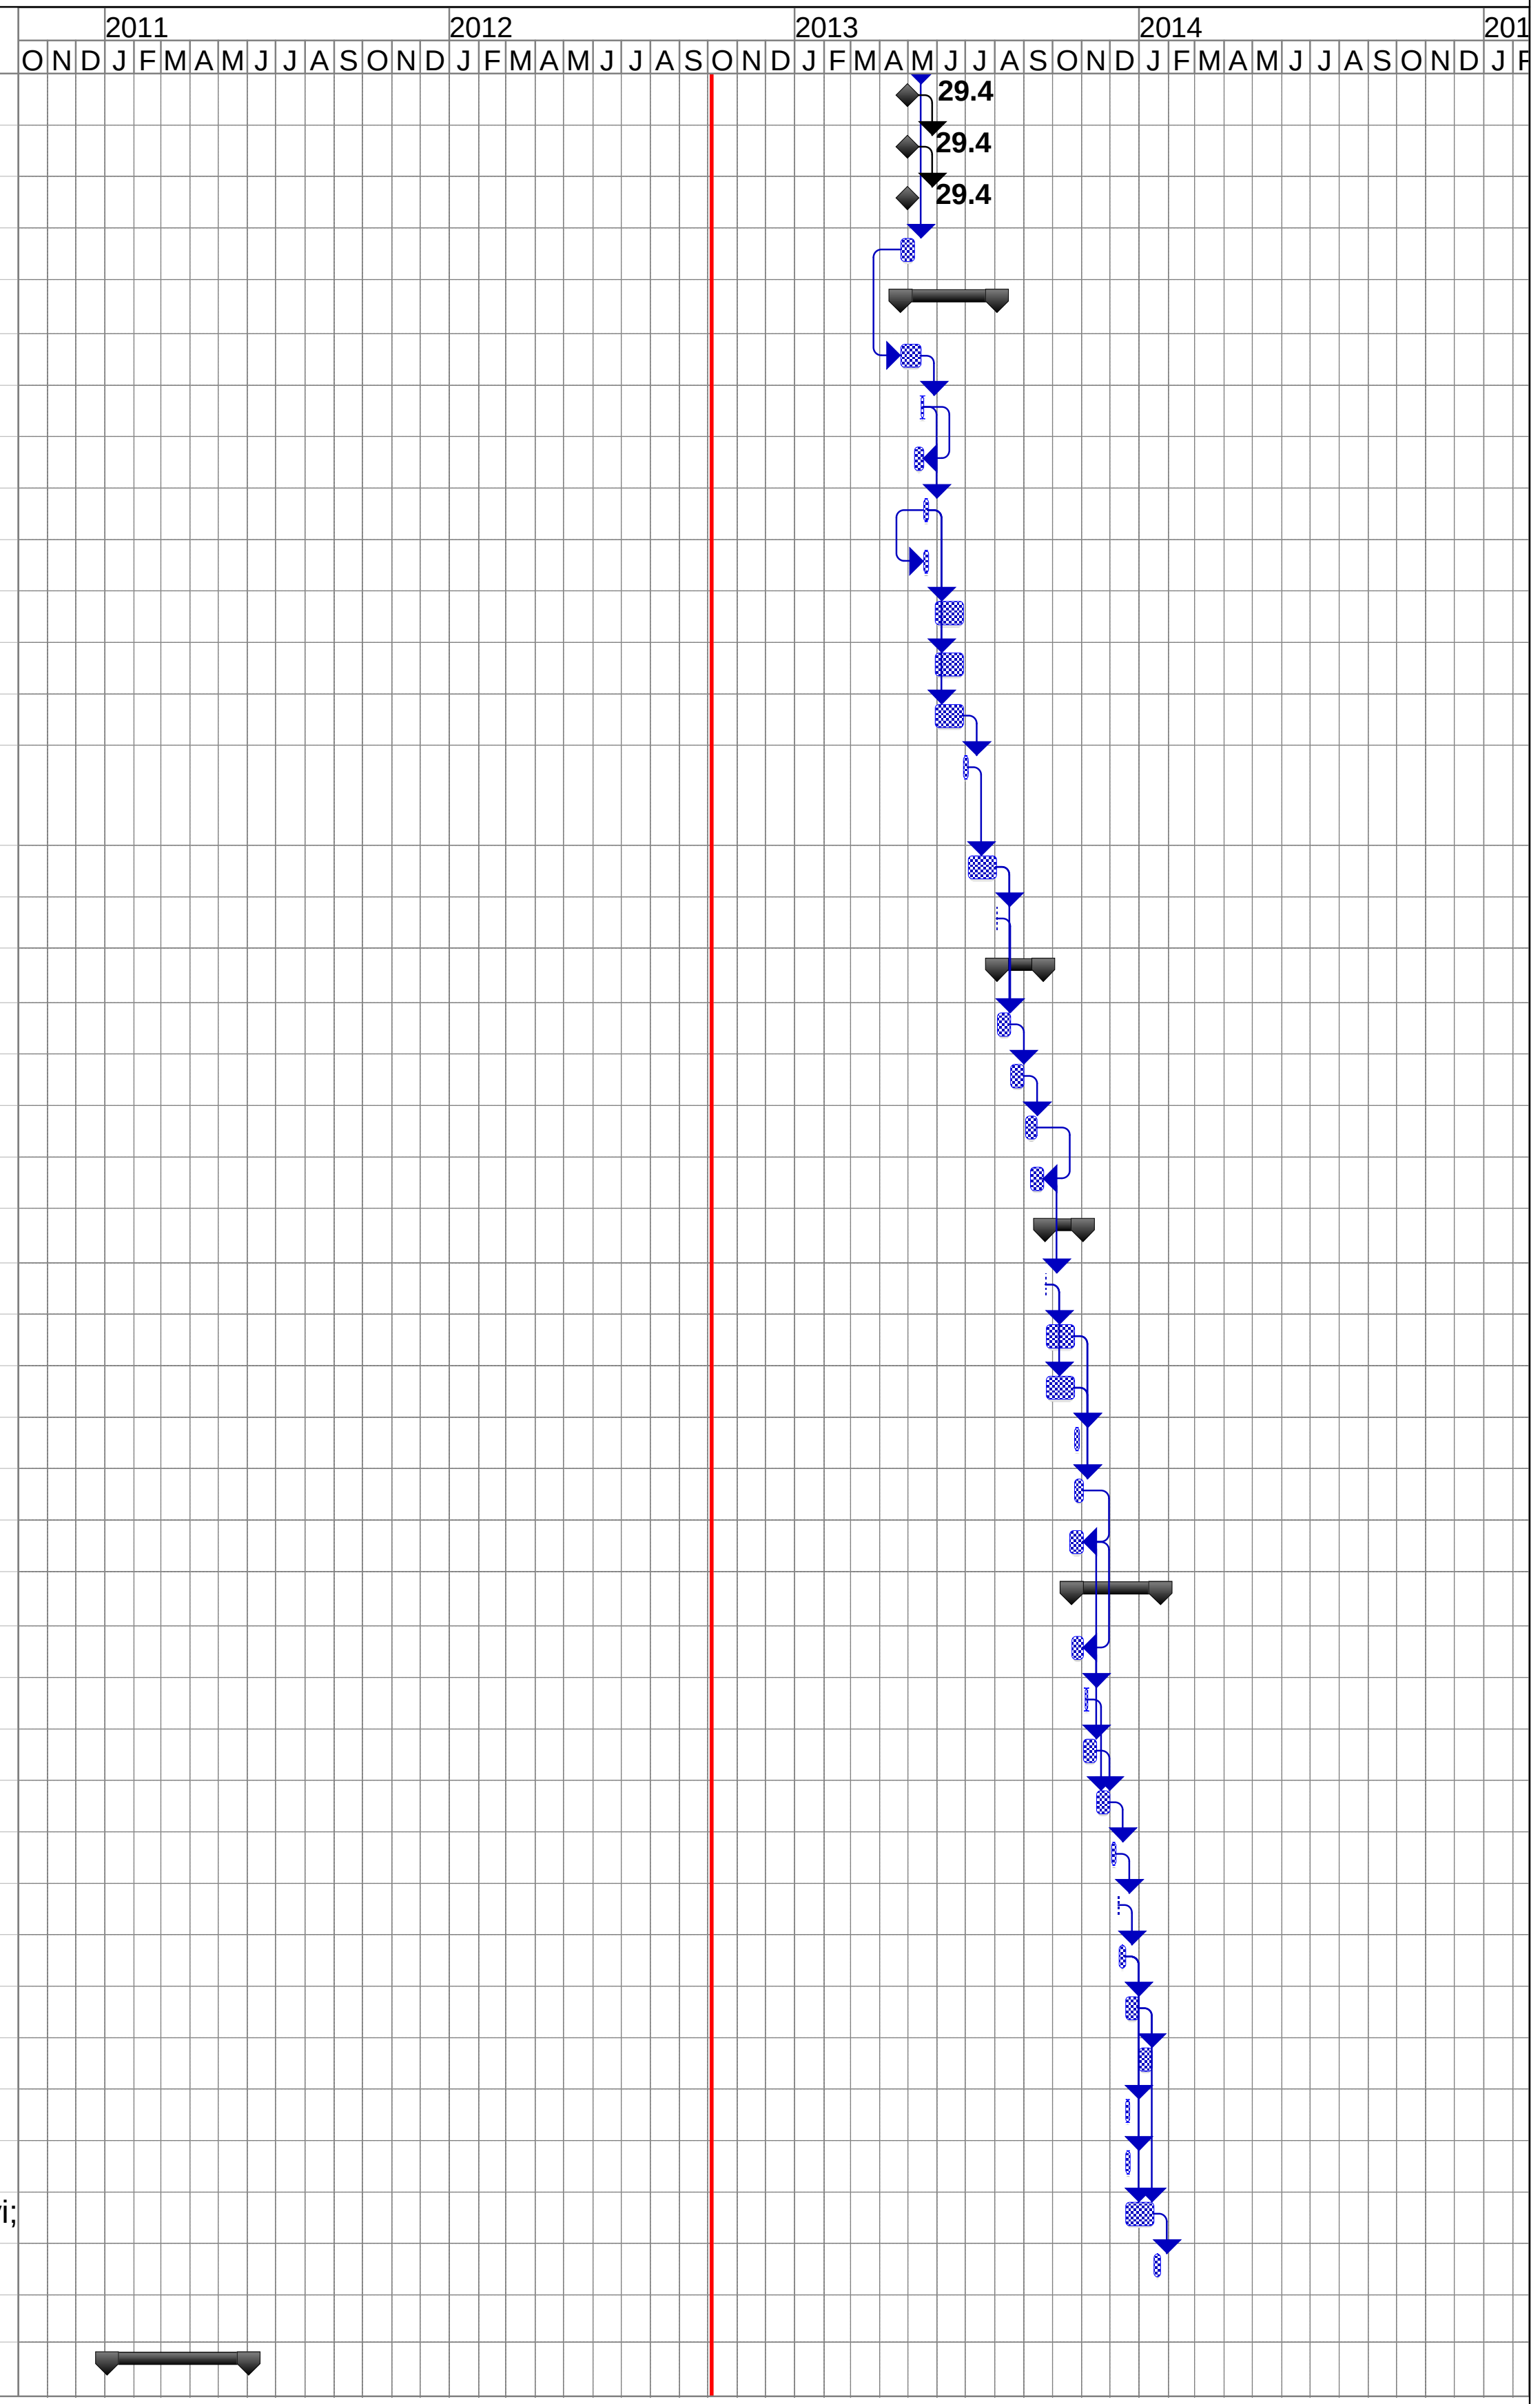
ID		Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila
127		Predstavitev rešitve občinam in predstavnikom javnosti	0 dnevi	Pon 29.4.13	Pon 29.4.13	125
128		Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	0 dnevi	Pon 29.4.13	Pon 29.4.13	127
129		Dopolnitev osnutka v skladu s sprejetimi pripombami občin in javnosti	0 dnevi	Pon 29.4.13	Pon 29.4.13	128
130		Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	14	Pon 22.4.13	Pon 6.5.13	125KZ-7
131		**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN**	**74 dnevi**	**Tor 23.4.13**	**Pet 2.8.13**	
132		Organizacija JR in JO	15 dnevi	Tor 23.4.13	Pon 13.5.13	130SS
133		Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	3 dnevi	Tor 14.5.13	Čet 16.5.13	132
134		Izdelava povzetka za javnost	10	Pon 6.5.13	Čet 16.5.13	133ZZ
135		Objava javnega naznanila	3 dnevi	Pet 17.5.13	Tor 21.5.13	133
136		Posredovanje osnutka DPN občinam	5	Pet 17.5.13	Sre 22.5.13	135SS
137		JR in JO	30	Tor 28.5.13	Čet 27.6.13	135KZ+7
138		Pripombe in predlogi javnosti	30	Tor 28.5.13	Čet 27.6.13	135KZ+7
139		Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Tor 28.5.13	Čet 27.6.13	135KZ+7
140		Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalcu ter Sektorju za PVO	3 dnevi	Pet 28.6.13	Tor 2.7.13	139
141		Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	30	Tor 2.7.13	Čet 1.8.13	140
142		Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Pet 2.8.13	Pet 2.8.13	141
143		**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**35 dnevi**	**Pet 2.8.13**	**Pet 20.9.13**	
144		Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	14	Pet 2.8.13	Pet 16.8.13	142;141
145		Izdelava predloga DPN	14	Pet 16.8.13	Pet 30.8.13	144
146		Pregled (recenzija) predloga DPN	10 dnevi	Pon 2.9.13	Pet 13.9.13	145
147		Dopolnitev predloga DPN po pregledu	14	Pet 6.9.13	Pet 20.9.13	146ZZ+5 dnevi
148		**PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS**	**30 dnevi**	**Pon 23.9.13**	**Pet 1.11.13**	
149		Posredovanje vseh vlog	1 dan	Pon 23.9.13	Pon 23.9.13	147
150		Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pon 23.9.13	Sre 23.10.13	149
151		Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pon 23.9.13	Sre 23.10.13	149
152		Posredovanje mnenj NUP investitorju	3 dnevi	Čet 24.10.13	Pon 28.10.13	150;151
153		Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	7 dnevi	Čet 24.10.13	Pet 1.11.13	150;151
154		Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	14	Pet 18.10.13	Pet 1.11.13	153ZZ
155		**SPREJEM UREDBE O DPN**	**68 dnevi**	**Pon 21.10.13**	**Sre 22.1.14**	
156		Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Pon 21.10.13	Pet 1.11.13	154ZZ
157		Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3 dnevi	Pon 4.11.13	Sre 6.11.13	156
158		Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 1.11.13	Pet 15.11.13	154
159		Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 15.11.13	Pet 29.11.13	157;158
160		Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	5 dnevi	Pon 2.12.13	Pet 6.12.13	159
161		Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 9.12.13	Pon 9.12.13	160
162		Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	7	Pon 9.12.13	Pon 16.12.13	161
163		Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Pon 16.12.13	Pon 30.12.13	162
164		Uveljavitev uredbe o DPN	14	Pon 30.12.13	Pon 13.1.14	163
165		Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	4 dnevi	Tor 17.12.13	Pet 20.12.13	162
166		Izdelava povzetka za javnost	5	Pon 16.12.13	Sob 21.12.13	162
167		Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Pon 16.12.13	Sre 15.1.14	163KZ-14 dnevi;
168		Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5 dnevi	Čet 16.1.14	Sre 22.1.14	167
169						
170		**IZBOR IZDELOVALCA**	**108 dnevi**	**Pon 3.1.11**	**Čet 2.6.11**
