TP - plinovod Ajdovščina-Šempeter pri Gorici

Datum: 10. 9. 2012

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
1	POBUDE MINISTROV ZAINTERESIRANIH RESORJEV (NUP z razvojnimi potrebami)	1 dan	Sre 10.10.07	Sre 10.10.07		zainteresirani resorji
2	SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	123 dnevi	Sre 10.10.07	Pet 28.3.08		
3	**OSNUTEK DPN**	**450 dnevi?**	**Čet 24.1.08**	**Sre 14.10.09**		
4	IZBOR IZDELOVALCA IN IZDELAVA OSNUTKA DPN	197 dnevi?	Čet 24.1.08	Pet 24.10.08		
5	SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (NUP)	232 dnevi	Tor 25.11.08	Sre 14.10.09		
6	**DOPOLNITEV OSNUTKA DPN**	**1351 dnevi**	**Čet 8.1.09**	**Sre 12.3.14**		
7	UTEMELJITEV PREDLAGANEGA KORIDORJA	365 dnevi	Čet 8.1.09	Sre 2.6.10		
8	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**986 dnevi**	**Čet 3.6.10**	**Sre 12.3.14**		
9	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**788 dnevi**	**Čet 3.6.10**	**Pet 7.6.13**		
10	Izdelava strokovnih podlag	700 dnevi	Čet 3.6.10	Tor 5.2.13	7	IZ
11	Izdelava okoljskega poročila (OP)	700 dnevi	Čet 3.6.10	Tor 5.2.13	7	IZ
12	Izdelava osnutka DPN	20 dnevi	Sre 6.2.13	Tor 5.3.13	10	IZ
13	Pregled osnutka DPN	14	Tor 5.3.13	Tor 19.3.13	12	K
14	**Vključevanje javnosti**	**27 dnevi**	**Tor 19.3.13**	**Čet 25.4.13**		
15	Predstavitev rešitve občinam in predstavnikom javnosti	7	Tor 19.3.13	Tor 26.3.13	13	P;K;IN;IZ
16	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10	Tor 26.3.13	Pet 5.4.13	15	P;K;IN;IZ
17	Dopolnitev osnutka v skladu s sprejetimi pripombami občin in javnosti	20	Pet 5.4.13	Čet 25.4.13	16	IN;IZ
18	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Čet 25.4.13	Ned 5.5.13	13;17	IZ
19	Vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti OP	3	Ned 5.5.13	Sre 8.5.13	18	K
20	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Sre 8.5.13	Pet 7.6.13	19	SPVO
21	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + MNENJE OBČIN**	**120 dnevi**	**Sob 9.3.13**	**Sob 24.8.13**		
22	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Sre 20.3.13	Tor 9.4.13	13	K;občine
23	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Tor 19.3.13	Ned 24.3.13	13	K;IN
24	Izdelava povzetka za javnost	15	Sob 9.3.13	Ned 24.3.13	23ZZ	IZ
25	Objava javnega naznanila	5	Sre 8.5.13	Pon 13.5.13	19ZZ+3 dr	K;izbran medij
26	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	5	Sre 8.5.13	Pon 13.5.13	19ZZ+3 dr	K
27	JR in JO	30	Pon 20.5.13	Sre 19.6.13	25KZ+7	K
28	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pon 20.5.13	Sre 19.6.13	25KZ+7	javnost
29	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Pon 20.5.13	Sre 19.6.13	25KZ+7	LNUP
30	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalcu ter Sekt	5	Sre 19.6.13	Pon 24.6.13	27;28;29	K
31	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Pon 24.6.13	Pet 23.8.13	30	K;IZ;IN;P
32	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Pet 23.8.13	Sob 24.8.13	31	K
33	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**60 dnevi**	**Pon 26.8.13**	**Pet 15.11.13**		
34	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	30 dnevi	Pon 26.8.13	Pet 4.10.13	31	IZ
35	Izdelava predloga DPN	30 dnevi	Pon 26.8.13	Pet 4.10.13	31	IZ
36	Preveritev/dopolnitev OP	30 dnevi	Pon 7.10.13	Pet 15.11.13	34;35	SPVO
37	Pregled predloga DPN	7 dnevi	Pon 7.10.13	Tor 15.10.13	35	K
38	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	10	Tor 15.10.13	Pet 25.10.13	37	IZ
39	**PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV**	**46 dnevi**	**Pet 25.10.13**	**Pon 30.12.13**		
40	Posredovanje vseh vlog	3	Pet 25.10.13	Pon 28.10.13	38	K
41	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pon 28.10.13	Sre 27.11.13	40	DNUP
42	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pon 28.10.13	Sre 27.11.13	40	DNUP
43	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	45 dnevi	Tor 29.10.13	Pon 30.12.13	40	SPVO
44	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Sre 27.11.13	Pon 2.12.13	41;42	K
45	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10 dnevi	Čet 28.11.13	Sre 11.12.13	41;42	K;IZ;DNUP;IN;P
46	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Ned 8.12.13	Sre 18.12.13	45ZZ+5 dr	IZ;K
47	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**60 dnevi**	**Sre 18.12.13**	**Sre 12.3.14**		
48	Priprava gradiva za vlado	10	Sre 18.12.13	Sob 28.12.13	46;45	K
49	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Sob 28.12.13	Tor 31.12.13	48	K;IN
50	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Sre 18.12.13	Sre 1.1.14	46	lektorji
51	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sre 1.1.14	Sre 15.1.14	49;50	P;K;MF;SVZ
52	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Sre 15.1.14	Sob 25.1.14	51	K
53	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Sob 25.1.14	Ned 26.1.14	52	vlada
54	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Ned 26.1.14	Sre 5.2.14	53	vlada
55	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Sre 5.2.14	Sre 19.2.14	54	vlada
56	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Sre 19.2.14	Sre 5.3.14	55	
57	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3	Sre 5.2.14	Sob 8.2.14	54	vlada;K
58	Izdelava povzetka za javnost	5	Sre 5.2.14	Pon 10.2.14	54	IZ
59	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Sre 5.2.14	Pet 7.3.14	54;55KZ-1	IZ
60	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5	Pet 7.3.14	Sre 12.3.14	59	K

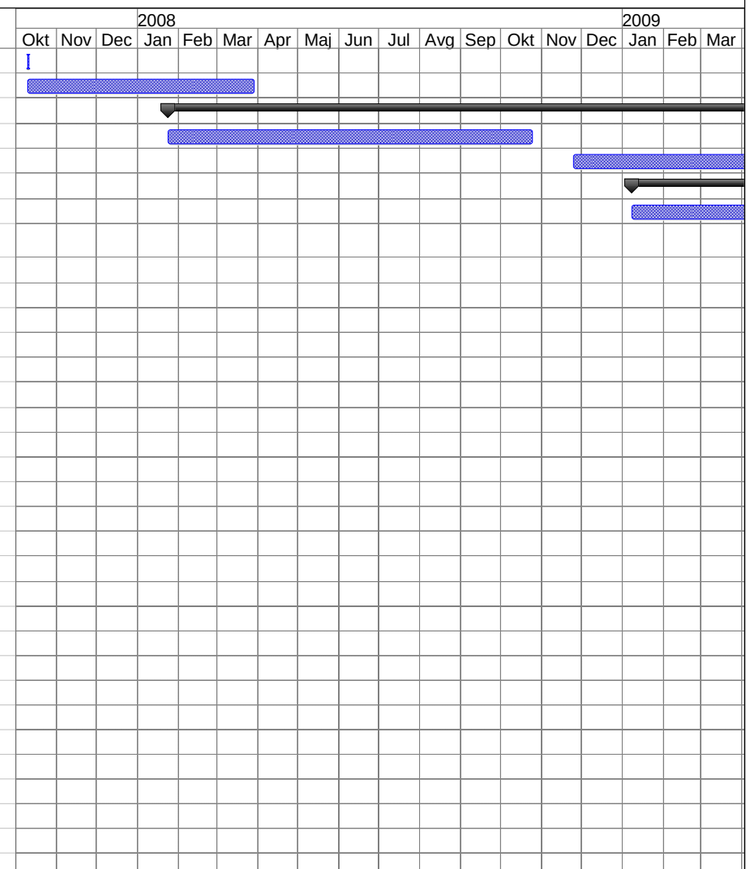
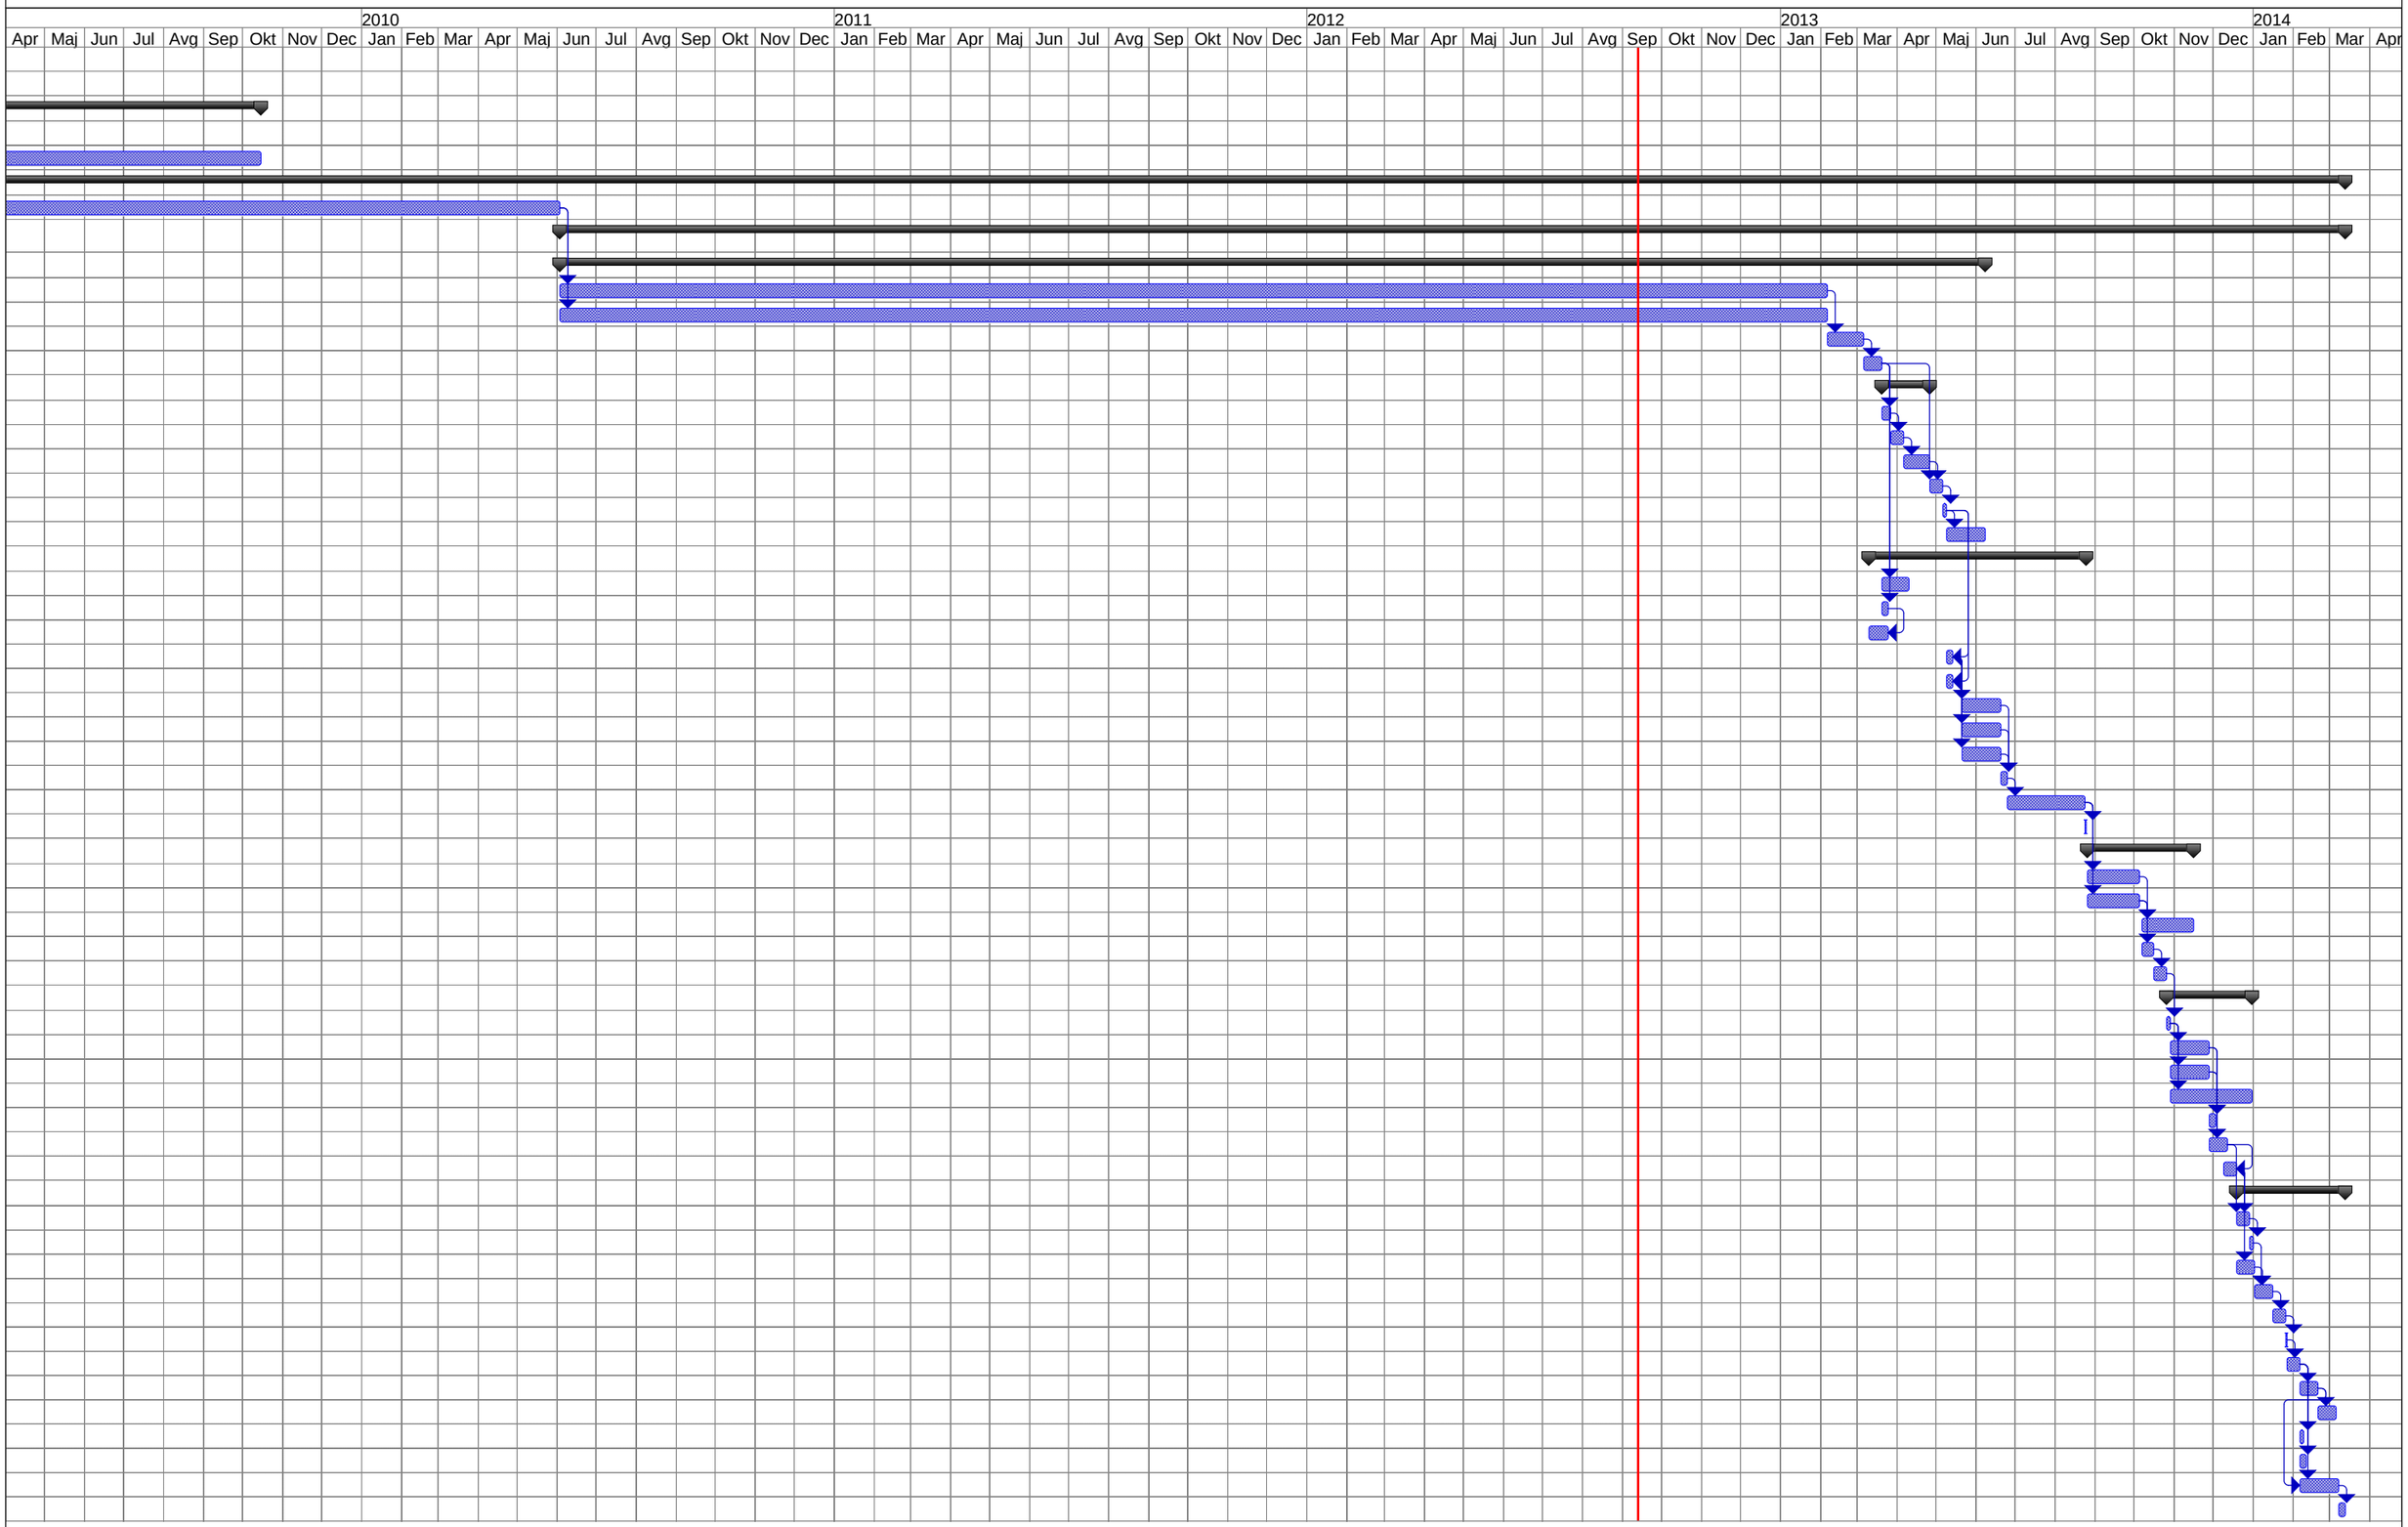
TP - plinovod Ajdovščina-Šempeter pri Gorici **Datum: 10. 9. 2012**
