ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
1	**POBUDA MINISTRA ZA GOSPODARSTVO**	**1 dan**	**Tor 5.1.10**	**Tor 5.1.10**		**zainteresi**
2	**SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (D**	**150 dnevi**	**Pon 11.1.10**	**Sob 7.8.10**		
3	Presoja pobude	50 dnevi	Pon 11.1.10	Pet 19.3.10	1	MOP DP[1
4	Priprava osnutka Sklepa o začetku priprave DPN - gradivo za Vlado RS	29	Tor 23.3.10	Sre 21.4.10	3	MOP DP
5	Uskladitev Sklepa - gradiva za Vlado RS - vsebinsko, z investitorjem, zaintere	19	Sre 21.4.10	Pon 10.5.10	4	MOP DP;z
6	Uskladitev s pobudnikom	21	Pon 10.5.10	Pon 31.5.10	5	
7	Uskladitev gradiva z MF	32	Pon 10.5.10	Pet 11.6.10	5	MOP DP;M
8	Uskladitev gradiva s SVZ	32	Pon 10.5.10	Pet 11.6.10	5	SVZ;MOP
9	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	16 dnevi	Pet 11.6.10	Pet 2.7.10	8	MOP DP
10	Obravnava in sprejem Sklepa na Vladi RS	6	Pet 2.7.10	Čet 8.7.10	9	Vlada RS
11	Objava Sklepa na spletni strani MOP	2 dnevi	Pet 9.7.10	Pon 12.7.10	10	MOP DP
12	Seznanitev s sklepom in pridobitev razvojnih potreb RRA	30	Čet 8.7.10	Sob 7.8.10	10	Vlada RS
13	**OSNUTEK DPN**	**143 dnevi**	**Pon 9.8.10**	**Čet 24.2.11**		
14	**IZDELAVA OSNUTKA DPN (oDPN)**	**52 dnevi**	**Pon 9.8.10**	**Sre 20.10.10**		
15	Izdelava osnutka DPN	72	Pon 9.8.10	Sre 20.10.10	12	izdelovalec
16	**SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (NUP)**	**91 dnevi**	**Čet 21.10.10**	**Čet 24.2.11**		
17	Pridobitev smernic NUP in Odločbe o CPVO	82	Čet 21.10.10	Tor 11.1.11	15	MOP DP
18	**ZUPUDPP**	**1 dan**	**Sre 27.10.10**	**Sre 27.10.10**		
19	posredovanje smernic izdelovalcu DPN	14	Tor 11.1.11	Tor 25.1.11	17	
20	pregled in pridobitev dopolnitev smernic	30	Tor 25.1.11	Čet 24.2.11	19	
21	**NOV SKLEP O PRIPRAVI DPN**	**416 dnevi**	**Čet 24.2.11**	**Sre 26.9.12**		
22	Analiza smernic in usmeritve za prostorsko načrtovanje	22	Čet 24.2.11	Pet 18.3.11	20	
23	Dopolnitev Analize smernic in usmeritve za prostorsko načrtovanje	210	Pet 18.3.11	Pet 14.10.11	22	
24	Priprava osnutka Sklepa o pripravi DPN - gradivo za Vlado RS	63	Pet 14.10.11	Pet 16.12.11	23	
25	Prostorska konferenca - 16.12.2011	1 dan	Pet 16.12.11	Pet 16.12.11	24	
26	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	75	Pet 16.12.11	Sre 29.2.12	25	
27	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS - v kabinet minstra v podpis	97	Sre 29.2.12	Tor 5.6.12	26	
28	Priprava novega osnutka Sklepa o pripravi DPN - gradivo za Vlado RS	24	Tor 5.6.12	Pet 29.6.12	27	
29	**ZUPUDPP-A**	**1 dan**	**Sob 28.7.12**	**Sob 28.7.12**	**28**	
30	Priprava novega osnutka Sklepa o pripravi DPN - gradivo za Vlado RS	7 dnevi	Pon 30.7.12	Tor 7.8.12	29	
31	Medresorska uskladitev gradiva z MF in SVZ	17 dnevi	Sre 8.8.12	Čet 30.8.12	30	
32	Medresorska uskladitev gradiva za vlado s pobudnikom	17 dnevi	Sre 8.8.12	Čet 30.8.12	30	
33	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Čet 30.8.12	Ned 9.9.12	32	K
34	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Ned 9.9.12	Pon 10.9.12	33	vlada
35	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10	Pon 10.9.12	Čet 20.9.12	34	vlada
36	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3	Čet 20.9.12	Ned 23.9.12	35	vlada
37	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Ned 23.9.12	Sre 26.9.12	35;36	K
38	**IZBOR IZDELOVALCA**	**107 dnevi**	**Sre 26.9.12**	**Sob 23.2.13**		
39	Priprava osnutka projektne naloge	15	Sre 26.9.12	Čet 11.10.12	37	IN
40	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	15	Čet 11.10.12	Pet 26.10.12	39	IN;P;K
41	Izbor izdelovalca: javna naročila	100	Pet 26.10.12	Ned 3.2.13	40	IN
42	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Ned 3.2.13	Sob 23.2.13	41	IN
43	**ŠTUDIJA VARIANT**	**106 dnevi**	**Pon 25.2.13**	**Pon 22.7.13**		
44	**IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)**	**106 dnevi**	**Pon 25.2.13**	**Pon 22.7.13**		
45	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	90 dnevi	Pon 25.2.13	Pet 28.6.13	42	IZ
46	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	90 dnevi	Pon 25.2.13	Pet 28.6.13	42	IZ
47	Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik)	90 dnevi	Pon 25.2.13	Pet 28.6.13	42	IZ
48	Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidik)	90 dnevi	Pon 25.2.13	Pet 28.6.13	42	IZ
49	Izdelava okoljskega elaborata (varstveni vidik)	90 dnevi	Pon 25.2.13	Pet 28.6.13	42	IZ
50	Izdelava ocene sprejemljivosti v lokalnem okolju	90 dnevi	Pon 25.2.13	Pet 28.6.13	42	IZ
51	Izdelava okoljskega poročila (OP)	90 dnevi	Pon 25.2.13	Pet 28.6.13	42	IZ
52	Pregled ŠV/PIZ	14	Pet 28.6.13	Pet 12.7.13	45	K
53	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	10	Pet 12.7.13	Pon 22.7.13	52	IZ
54	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**401 dnevi**	**Tor 23.7.13**	**Tor 3.2.15**		

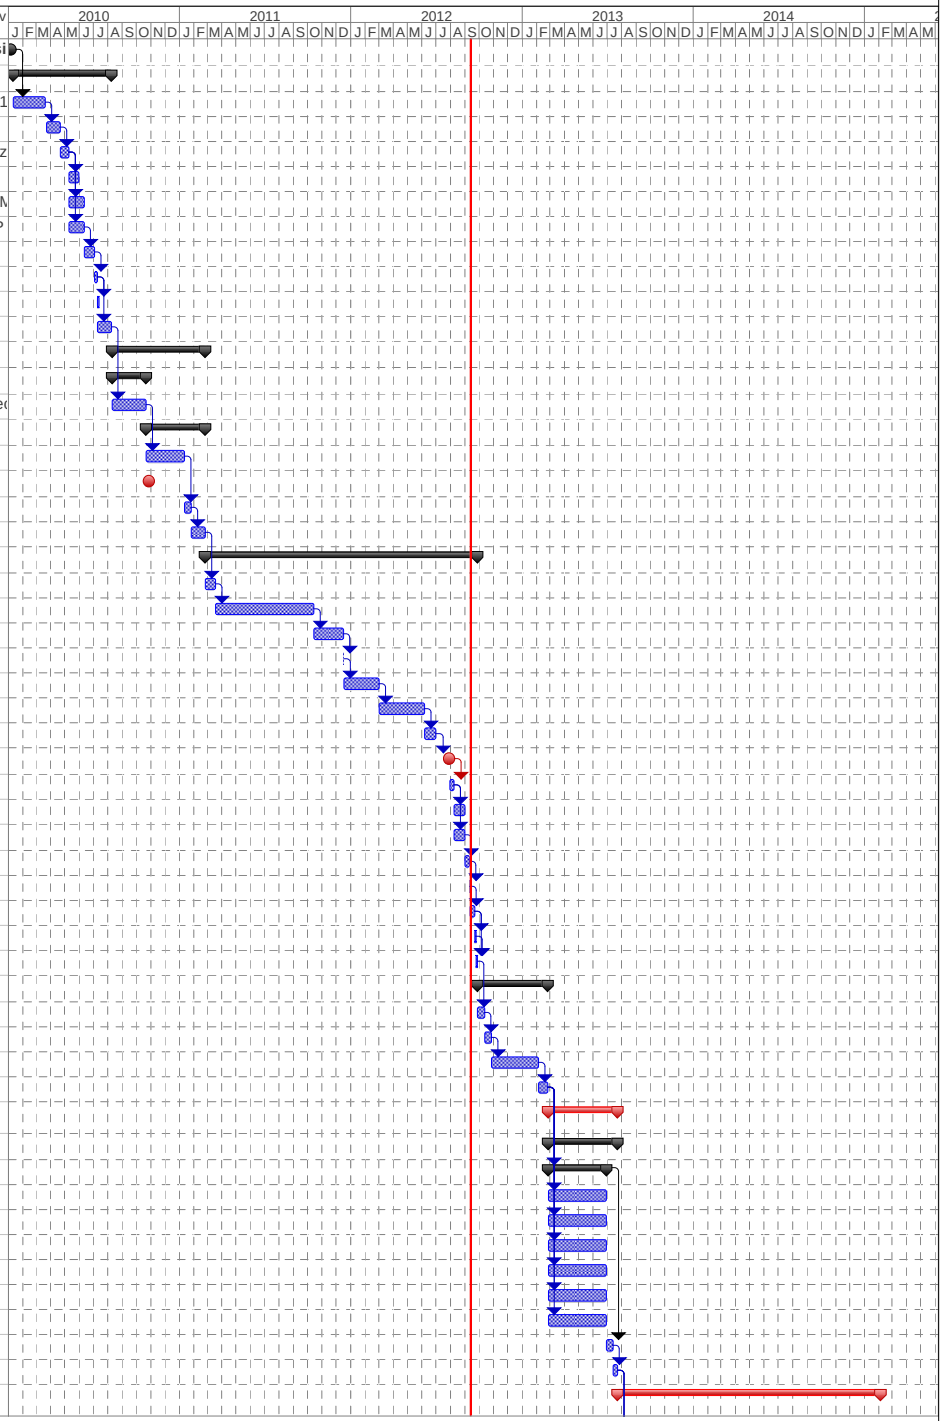
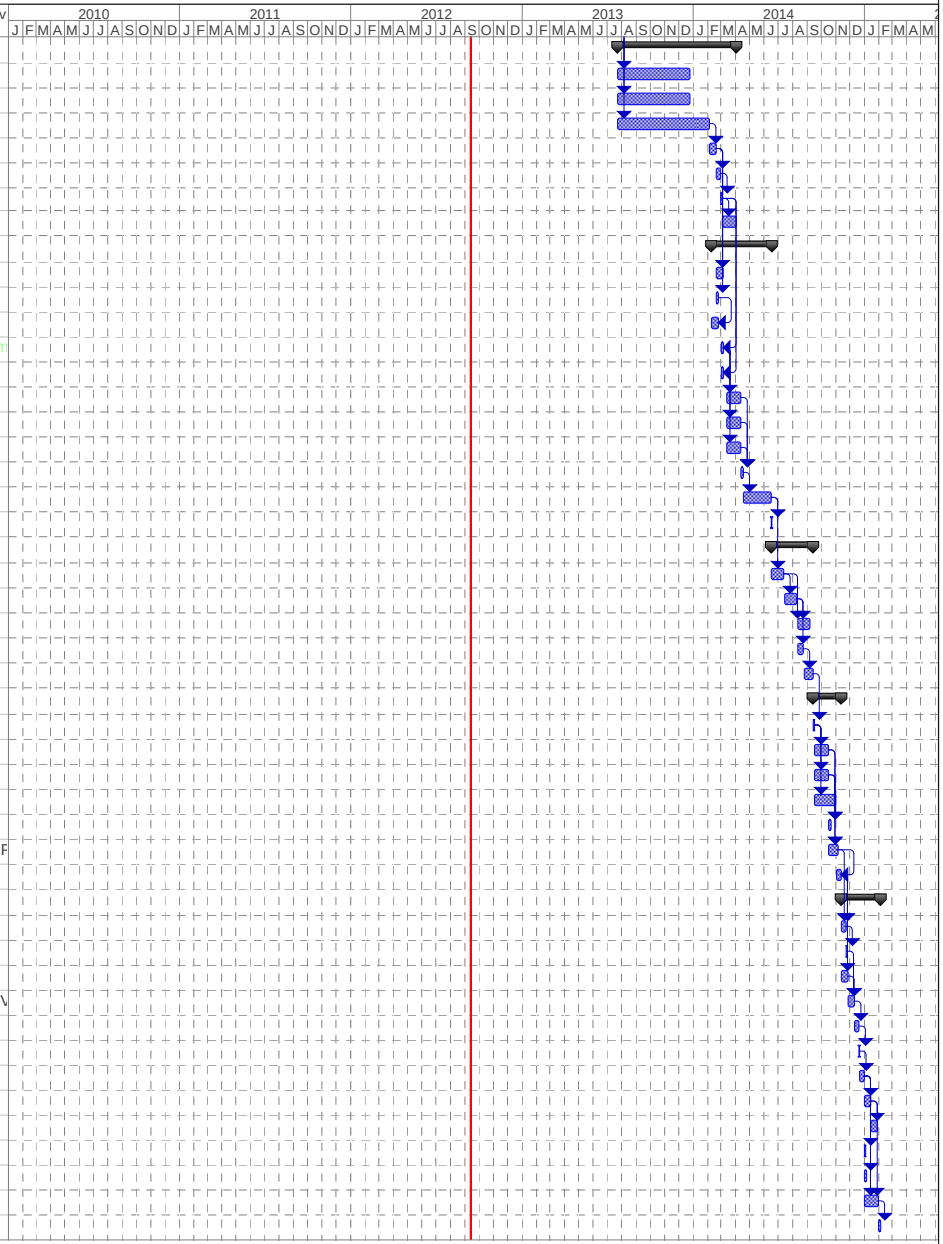
ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
55	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**	**181 dnevi**	**Tor 23.7.13**	**Tor 1.4.14**		
56	Izdelava strokovnih podlag	110 dnevi	Tor 23.7.13	Pon 23.12.13	53	IZ
57	Dopolnitev OP	110 dnevi	Tor 23.7.13	Pon 23.12.13	53	IZ
58	Izdelava osnutka DPN	140 dnevi	Tor 23.7.13	Pon 3.2.14	53	IZ
59	Pregled osnutka DPN	14	Pon 3.2.14	Pon 17.2.14	58	K
60	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Pon 17.2.14	Čet 27.2.14	59	IZ
61	Vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti OP	3	Čet 27.2.14	Ned 2.3.14	60	
62	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Ned 2.3.14	Tor 1.4.14	61	SCPVO
63	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + 2. MNENJE OBČIN**	**91 dnevi**	**Pet 7.2.14**	**Pon 16.6.14**		
64	Organizacija JR in JO	15	Pon 17.2.14	Tor 4.3.14	59	K;občine
65	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Pon 17.2.14	Sob 22.2.14	59	K;IN
66	Izdelava povzetka za javnost	15	Pet 7.2.14	Sob 22.2.14	65ZZ	IZ
67	Objava javnega naznanila	5	Pet 28.2.14	Sre 5.3.14	61ZZ+3	K;izbran m
68	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	5	Pet 28.2.14	Sre 5.3.14	61ZZ+3	K
69	JR in JO	30	Sre 12.3.14	Pet 11.4.14	67KZ+7	K
70	Pripombe in predlogi javnosti	30	Sre 12.3.14	Pet 11.4.14	67KZ+7	javnost
71	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Sre 12.3.14	Pet 11.4.14	67KZ+7	LNUP
72	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, invsetitorju in izdel	5	Pet 11.4.14	Sre 16.4.14	71;69;7	K
73	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Sre 16.4.14	Ned 15.6.14	72	K;IZ;IN;P
74	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Ned 15.6.14	Pon 16.6.14	73	K
75	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**65 dnevi**	**Pon 16.6.14**	**Pet 12.9.14**		
76	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	20 dnevi	Pon 16.6.14	Pet 11.7.14	73	IZ
77	Izdelava predloga DPN	20 dnevi	Pon 14.7.14	Pet 8.8.14	76	IZ
78	Preveritev/dopolnitev OP	20 dnevi	Pon 11.8.14	Pet 5.9.14	77;76	SPVO
79	Pregled predloga DPN	10 dnevi	Pon 11.8.14	Pet 22.8.14	77	K
80	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	15 dnevi	Pon 25.8.14	Pet 12.9.14	79	IZ
81	**PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI**	**42 dnevi**	**Pet 12.9.14**	**Tor 11.11.14**		
82	Posredovanje vseh vlog	3	Pet 12.9.14	Pon 15.9.14	80	K
83	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pon 15.9.14	Sre 15.10.14	82	DNUP
84	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pon 15.9.14	Sre 15.10.14	82	DNUP
85	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	45	Pon 15.9.14	Čet 30.10.14	82	SCPVO
86	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Sre 15.10.14	Pon 20.10.14	83;84	K
87	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	20	Sre 15.10.14	Tor 4.11.14	83;84	K;IZ;DNUP
88	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Sob 1.11.14	Tor 11.11.14	87ZZ+5	IZ;K
89	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**60 dnevi**	**Tor 11.11.14**	**Tor 3.2.15**		
90	Priprava gradiva za vlado	10	Tor 11.11.14	Pet 21.11.14	88;87	K
91	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pet 21.11.14	Pon 24.11.14	90	K;IN
92	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Tor 11.11.14	Tor 25.11.14	88	lektorji
93	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Tor 25.11.14	Tor 9.12.14	91;92	P;K;MF;SV
94	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Tor 9.12.14	Pet 19.12.14	93	K
95	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Pet 19.12.14	Sob 20.12.14	94	vlada
96	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Sob 20.12.14	Tor 30.12.14	95	vlada
97	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Tor 30.12.14	Tor 13.1.15	96	vlada
98	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Tor 13.1.15	Tor 27.1.15	97	
99	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3	Tor 30.12.14	Pet 2.1.15	96	vlada;K
100	Izdelava povzetka za javnost	5	Tor 30.12.14	Ned 4.1.15	96	IZ
101	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Tor 30.12.14	Čet 29.1.15	97KZ-1	IZ
102	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5	Čet 29.1.15	Tor 3.2.15	101	K
